



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
06-05-2022	SEGUIMIENTO PROYECTO INFRAESTRUCTURA CAPS BRAVO PAEZ	8:00 A.M.	11:00 AM

Proceso, área que lidera la reunión	Nombre de quien elabora el acta
Secretaria Distrital de Salud	Profesional de participación comunitaria Blanca T. Henao

**1. Objetivo de la reunión:**

Seguimiento proyecto de infraestructura CAPS Bravo Páez

**2. Temas a tratar u Orden del día:**

- Bienvenida e Instalación de la reunión
- Acuerdos de oro para realizar reunión efectiva
- Presentación de los asistentes
- Intervención del Secretario Distrital de Salud
- Seguimiento avance a la ejecución de la obra CAPS Bravo Páez
- Intervención de la comunidad
- Respuesta Institucional
- Compromisos
- Cierre

**3. Desarrollo:**

Se da inicio a la reunión de seguimiento proyecto infraestructura CAPS Bravo Páez siendo las 8:00 a.m. en el auditorio del Salón Comunal barrio Bravo Páez por la señora Nancy Acuña vocera de la veeduría del proyecto de infraestructura quien realiza apertura a la mesa de trabajo, informa las barreras de acceso enfrentando la población adulta mayor con el cierre del centro de salud Bravo Páez.





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
06-05-2022	SEGUIMIENTO PROYECTO INFRAESTRUCTURA CAPS BRAVO PAEZ	8:00 A.M.	11:00 AM

**Bienvenida e Instalación de la reunión:** El señor Jorge Romero Veedor ciudadano y moderador de la mesa, da la bienvenida a cada uno de los asistentes y da la metodología a seguir, haciendo énfasis en los siguientes aspectos:

- El ejercicio que se viene desarrollando en articulación con la Secretaría Distrital de Salud y el seguimiento a las obras de infraestructura en la ciudad de Bogotá en el marco de los ejercicios de Control Social.
- Se realizara la presentación por parte de la institución para posteriormente dar la palabra a la vocera de la Veeduría, intervención de la comunidad, respuesta institucional, compromisos y finalizar con recorrido a la obra.

**Presentación de los asistentes:** El moderador de la mesa, señor Jorge Romero realiza la presentación del equipo institucional de la Subred integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, Ediles, Personería y Veeduría Distrital, evidenciando en el registro de asistencia las siguientes situaciones:

- Asistencia del secretario de Salud
- Asistencia de 3 funcionarios de la Secretaria Distrital de salud
- Asistencia de 33 líderes sociales.
- Asistencia de 2 entes de control
- Asistencia de 4 ediles de la Localidad Rafael Uribe Uribe
- Asistencia de 8 profesionales de la Subred Centro Oriente

Continúa con la presentación de acuerdos de oro y medidas de bioseguridad para realizar reunión efectiva y da la palabra al Secretario Distrital de Salud.



El Secretario de Salud, doctor Alejandro Gómez agradece la invitación y suministra la siguiente información:

- Estado, avance y entrega de algunas obras de infraestructura en salud que se vienen adelantando en la ciudad de Bogotá,
- Entrega de 2 obras de infraestructura en salud en la Sub Red Centro



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
06-05-2022	SEGUIMIENTO PROYECTO INFRAESTRUCTURA CAPS BRAVO PAEZ	8:00 A.M.	11:00 AM

Oriente : Centro de Salud Libertadores y Centro de Salud Antonio Nariño

- Y, realice presentación de la gerente encargada para la Subred, Dra. Yiyola Yasmín Pérez Ríos, nombrada desde el 29 de abril de 2022 y quien refiere estar realizando revisión del estado general de la Subred.



**Seguimiento avance a la ejecución de la obra CAPS Bravo Páez:** La doctora Marcia Guacaneme Jefe de la oficina asesora de desarrollo institucional de la Subred Centro Oriente hace énfasis en los siguientes aspectos del Convenio Nro.: 2011787-2020

- Objeto: Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto “Construcción y Dotación CAPS Bravo Páez”



- **Valor del Convenio inicial: \$17.278.404.899**

Valor: \$ 16.977.638.136  
Fuente: FFDS  
Registro Presupuestal: 4657

Valor: \$ 300.766.763  
Fuente: ESE  
Registro Presupuestal: N/A

**Adición No. 1: \$1.993.609.461**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
06-05-2022	SEGUIMIENTO PROYECTO INFRAESTRUCTURA CAPS BRAVO PAEZ	8:00 A.M.	11:00 AM

Fuente: FFDS

Registro Presupuestal: 5408

Valor actual del convenio: \$19.272.014.360

Fecha Suscripción: 20/11/2020

Fecha de inicio: 27/11/2020 Plazo de ejecución Inicial: 27 meses

Fecha de terminación inicial: 26/02/2023 Prórrogas acumuladas: N/A

Fecha de terminación actual: 26/02/2023

Resumen de Recursos del Convenio

Fechas del Proceso de Adjudicación de los Contratos

Publicación de Pliego de Condiciones definitivo para la Licitación Pública No. 2 de 2020: 31/12/2020

Publicación de Pliego de Condiciones definitivo para el Concurso de Méritos No. 1 de 2021: 19/03/2021

Adjudicación de la Licitación Pública No. 02 de 2020: 17/03/2021

Adjudicación del Concurso de Méritos No. 01 de 2021: 26/05/2021

Suscripción de Acta de Inicio de Obra Civil: 18/08/2021

Valor Contratos de Infraestructura

Valor inicial Contrato de Obra: \$14.751.182.301

Adición No. 1 - Contrato de Obra: \$122.683.705

Valor inicial Contrato Interventoría: \$1.543.420.480

TOTAL: \$16.417.286.486

Valor Contratos de Equipos de Mobiliario y Biomédico

Valor Dotación equipos de Mobiliario: \$ 261.439.093

Valor Dotación equipos Biomédicos: \$ 1.475.416.333

Valor TIC's (hace parte de proceso en conjunto con SDS): N.A.

TOTAL: \$ 1.736.855.426

➤ Seguimiento al avance de dotación CAPS BRAVO PAEZ

Convenios Interadministrativos suscritos

Contrato Interadministrativo No. 02-BS-0248-2021 EGAT dotación Bravo Páez.

Valor: \$ 1.736.855.426

➤ Portafolio de servicios

Sala Espera



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
06-05-2022	SEGUIMIENTO PROYECTO INFRAESTRUCTURA CAPS BRAVO PAEZ	8:00 A.M.	11:00 AM

U. San Público M.  
U. San Publico H.  
Oficina Coordinación  
Sala De Lactancia  
Modular Gestores  
Puesto Promoción Detección  
Archivo Documental  
Sala Capacitaciones  
Almacén Intermedio  
Residuos Solidos  
Consultorios (14)  
Unidad Odontológica General  
Unidad Odontológica De Historias Clínicas  
Unidad P Y P Salud Oral  
Esterilización  
Rayos X Odontología  
Cuarto Procedimientos  
Consultorio + Gimnasio  
Terapia Ocupacional  
Consultorio Terapias  
Consultorio Fonología Con Cabina  
Consultorio Terapia Respiratoria  
Cuarto Caliente  
Cuarto Frio  
Ultra Sonido  
Sala De Rayos X  
Cubículos Toma De Muestras De Flebotomía  
Toma De Muestras Especiales



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
06-05-2022	SEGUIMIENTO PROYECTO INFRAESTRUCTURA CAPS BRAVO PAEZ	8:00 A.M.	11:00 AM

Total de área + circulaciones(M2)= 2687,94

Continúa con la presentación el arquitecto Wilmer quien presenta registro fotográfico de las acciones y avances en la obra

**Intervención de la vocera de la Veeduría:** La señora Nancy Acuña refiere del proyecto las siguientes situaciones:

- La obra tenía una durabilidad de 14 meses,
- Disposición de un orientador para la comunidad
- Ubicación permanente de la Ruta de la Salud para la movilización de la población que acude a los servicios de salud de este sector
- Se tendría en cuenta en los procesos de contratación, la mano de obra del sector para la construcción del centro de salud, se enviaron hojas de vida de la comunidad del sector interesada por correo electrónico y a la fecha no han llamada a nadie.
- Reclamos por consultas médicas de difícil consecución en la Subred.

**Intervención de la comunidad:**



Señor Heber Guerrero indaga sobre los siguientes aspectos:

- El equipamiento del centro de salud Bravo Páez preguntando: ¿quedará adecuada para la atención de enfermedades respiratorias?
- No se evidencia un plan de contingencia de la obra, no se vincula a la comunidad en los procesos de formulación del proyecto de obra.
- Menciona que se tiene zozobra entre la comunidad usuaria de la Subred en razón de los rumores de la crisis financiera y las investigaciones adelantadas a la gerencia de la Subred.
- Realiza la recomendación del fortalecimiento de las capacidades y habilidades de los Veedores y procesos contractuales.

Señora María Helena Becerra manifiesta respecto a los registros fotográficos presentados



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
06-05-2022	SEGUIMIENTO PROYECTO INFRAESTRUCTURA CAPS BRAVO PAEZ	8:00 A.M.	11:00 AM

por el arquitecto, que no se logra evidenciar mayor avance de la obra, además que la información presentada es demasiado técnica para la comunidad, y las orientaciones para la consulta en SECOP son poco comprensivas.

Señora Dora Inés Torres solicita el respeto por los compromisos acordados en las mesas de trabajo con la comunidad, relacionados al punto de información en el salón comunal, la disposición de la UBA MÓVIL.

Señor Anyelo Calderón manifiesta los siguientes aspectos:

- El envío de las actas de la mesa de trabajo a todos los asistentes con sus presentaciones
- Revisión de la contratación de la mano de obra de la zona aledaña al proyecto
- Verificar las barreras que se está presentando para el proceso de asignación de citas médicas y oportunidad de las mismas

Edil Andrés Yate de Rafael Uribe, manifiesta que se evidencia un avance en la información presentada por la Subred

### Respuesta institucional

Doctor Alejandro Gómez hace énfasis en los siguientes temas:

- Informa que el Centro de Atención Bravo Páez contará con excelente atención de manera resolutive
- Da disculpas por la demora en la construcción de la obra que tenía una durabilidad de 14 meses, a su vez, manifiesta que se trabajará en el cumplimiento del cronograma de la obra, propone el desarrollo de visitas mensuales con la comunidad veedora del proyecto infraestructura y realizar mesas técnicas pertinentes para la presentación de los avances de la misma.
- Solicita a la Subred Centro Oriente, realizar seguimiento frente a los siguientes aspectos, los cuales debe garantizar, ellos son:
  - Revisar la ubicación del orientador para la comunidad que permita disminuir los problemas de atención de la comunidad de Bravo Páez.
  - Definir acciones pertinentes para el cumplimiento de los traslados de la Ruta de la Salud para la movilización de la población que acude a los servicios de salud de este sector
  - Revisar los procesos de contratación de la mano de obra y se le dé



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2020-02-10

## FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
06-05-2022	SEGUIMIENTO PROYECTO INFRAESTRUCTURA CAPS BRAVO PAEZ	8:00 A.M.	11:00 AM

respuesta a la comunidad.

- Prestar los servicios de salud a la comunidad de Bravo Páez en el Centro de Salud Antonio Nariño

Finaliza esta intervención informando sobre el tema de la gerencia que desde la Secretaría Distrital de Salud y la Alcaldía Mayor de Bogotá manifestaron a la Gerente Dra. Claudia Ardila, que no contaba con la confianza de la administración y están a la espera de un acto voluntario de retiro del cargo.

### Acuerdos y Compromisos

Compromisos de la Subred Centro Oriente E.S.E.

- Entregar acta a los participantes del presente encuentro
- Concertar fechas y líderes a ingresar a la obra con acompañamiento del interventor, cada mes
- Realizar mesas técnicas pertinentes para la presentación de los avances de la misma.
- Realizar seguimiento frente a los siguientes aspectos, los cuales debe garantizar, ellos son:
- Revisar la ubicación del orientador para la comunidad que permita disminuir los problemas de atención de la comunidad de Bravo Páez.
- Definir acciones pertinentes para el cumplimiento de los traslados de la Ruta de la Salud para la movilización de la población que acude a los servicios de salud de este sector
- Se revisará con el contratista, los perfiles que requieren de Recurso Humano en la ejecución de la obra y solicitar que dé respuesta a las personas que han enviado hojas de vida al correo electrónico
- Prestar los servicios de salud a la comunidad de Bravo Páez en el Centro de Salud Antonio Nariño

Compromisos Veedores Ciudadanos

- Socializar la información suministrada en este seguimiento a la ciudadanía en general.

### Recorrido a la obra

El Secretario de Salud ingresa a la obra con Gerencia de la Subred Centro Oriente y



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2020-02-10

### FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
06-05-2022	SEGUIMIENTO PROYECTO INFRAESTRUCTURA CAPS BRAVO PAEZ	8:00 A.M.	11:00 AM

veedores ciudadanos y el arquitecto hace énfasis en los siguientes aspectos:

- Proyecto consta de 3 torres
- Se está en el proceso de excavación de las 3 torres, cimentación de los pisos, procesamiento de las aguas
- Se está fundiendo vigas y colocando acero para subir muros.
- Los muros se comenzarán a levantar



Siendo las 12:00 pm se da por terminada la reunión a satisfacción de los que en ella intervinieron.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
06-05-2022	SEGUIMIENTO PROYECTO INFRAESTRUCTURA CAPS BRAVO PAEZ	8:00 A.M.	11:00 AM

. Compromisos Establecidos y Responsables

Qué  Tarea o Actividad	Quién  Responsable	Cuándo  Fecha límite	Observaciones	
			Si	No
Entregar acta a los participantes del presente encuentro	Oficina de participación comunitaria			
Concertar fechas y líderes a ingresar a la obra con acompañamiento del interventor, cada mes	Oficina de participación comunitaria y Desarrollo Institucional			
Realizar mesas técnicas pertinentes para la presentación de los avances de la misma.	Oficina de participación comunitaria y Desarrollo Institucional			
Revisar la ubicación del orientador para la comunidad que permita disminuir los problemas de atención de la comunidad de Bravo Páez.	Oficina de participación comunitaria			
Definir acciones pertinentes para el cumplimiento de los traslados de la Ruta de la Salud para la movilización de la población que acude a los servicios de salud de este sector	Oficina de participación comunitaria			



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
06-05-2022	SEGUIMIENTO PROYECTO INFRAESTRUCTURA CAPS BRAVO PAEZ	8:00 A.M.	11:00 AM

Se revisará con el contratista, los perfiles que requieren de Recurso Humano en la ejecución de la obra y solicitar que dé respuesta a las personas que han enviado hojas de vida al correo electrónico	Oficina de Desarrollo Institucional				
Prestar los servicios de salud a la comunidad de Bravo Páez en el Centro de Salud Antonio Nariño	Subgerencia de servicios de salud				



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
06-05-2022	SEGUIMIENTO PROYECTO INFRAESTRUCTURA CAPS BRAVO PAEZ	8:00 A.M.	11:00 AM

Nombres y Apellidos		Firma
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		

INFORMACIÓN GENERAL

PROCESO Y/O DEPENDENCIA:	Uudenio Caps. Barrio Paer	FECHA:	6-05/2022
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD:		HORA DE INICIO:	8:00 am
TEMA:	Seguimiento obra,	HORA DE FINALIZACIÓN:	11:00 am
RESPONSABLE:	Prof. poe. Josef.	FIRMA:	

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	EPS	TELÉFONO DE CONTACTO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Jorge Baron	79220930	Nueva	313 2472311	dirador18@gmail.com	
2	Celesto Echilmeza	39647356	Salud Total	302 4013007	cleasportiz@yahoo.com	
3	Ing. Aníbal Cobaron	79349233	Sanitas	3106382875	anora.angel@missana.edu.co	
4	Jose David Mendoza	75369813	Capital Salud	3214576062	jose.dave.037@gmail.com	
5	Alexander Gomez					
6	Milena Lander Jimen	51665222	Fansur	3103406113	mlanderjim@gmail.com	
7	Alyde Barber	41308106	Compuceja	3133603723	alcapr2607@yahoo.com	
8	Maria Ylene Becerra	41698762	Nueva EPS	3074674046	andc.395@gmail.com	
9	Yolima Castro Peilla	51997503	Sisben	3007483816	YolimaCastro63@gmail.com	
10	Alfredo Ruiz	41462444	Compuceja	312490052	Paul12BoH@gmail.com	
11	Muyriam Rodriguez	29.220.508	Compuceja	3166915500	mayriamr28@hotmail.com	
12	Andrés Ospina	19.133.804	Compuceja	3114772299		

INFORMACIÓN GENERAL

PROCESO V/O DEPENDENCIA:	Vecelito CAPS Isaac Paez	FECHA:	6-05/2022
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD:		HORA DE INICIO:	8:00 am
TEMA:	Reconocimiento a Klaus Barco Paez	HORA DE FINALIZACIÓN:	11:00 am
RESPONSABLE:	Prof. Isaac Paez	FIRMA:	

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	EPS	TÉLEFONO DE CONTACTO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Yecelín Estephan Súa	1031143820	Compensar	3202254630	Yestupinan@saludcentral.gov.co	
2	Robinson Franco	15876644	Compensar	3112618193	Franmar0524@hotmail.com	
3	Victor Suarez	79298841	Famisar	3214503838	VRALVScavare221@gmail.com	
4	Albolf Guenero L.	14.218.705	Compensar	3118414661	nglabarbr@gmail.com	
5	FEDLO P. SIANEZ	17123287		3204839804	Pesca1234@gmail.com	
6	DOGA TORRES	52098743	SORA	3168239712	doctorres10@gmail.com	
7	MILBA PÉREZ DURBE	79431470	MEUD.	3144272548	wprnorganizad929@gmail.com	
8	Sony Lorena Salgado	53037907	ALIANSAUD	3227868694	lps270609@gmail.com	
9	Wilwian Calderon	79402499	Sanihon.	3212105688	wcalderon@psquirre.com	
10	Hector Bets	80123406	Compuval	3219987008	hbetso@elval.com	
11	Sta. Stella Bello	41395.511	compuval	3123581865	stellabelle19@gmail.com	
12	Maria Santos Herrera	103161931	Santitas	321903507	ccordador5@elval.com	

INFORMACIÓN GENERAL

PROCESO V/O DEPENDENCIA:	Veceluto APS Travesa	FECHA:	6/05/2022
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD:		HORA DE INICIO:	8:00 am
TEMA:	Seguimiento obra	HORA DE FINALIZACIÓN:	11:00 am
RESPONSABLE:	Prof. Juan Sebastian	FIRMA:	[Firma]

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	EPS	TELÉFONO DE CONTACTO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Blanca Mdo. Steff	90.261.818	Sanitar	41567220		
2	And. Deba Bay	93.628317	Capital & Salud	32126992	FD	
3	Glados Soto	4759326	Somito	4657652		Glados Soto
4	Marcos Ueber	47271453	Somito	47777453		Marcos Ueber
5	Miguel de Jesús Flores	33251709	Salud Total	2032371		Miguel de Jesús Flores
6	José Williams Cordero	39630104	Salud Total	30078816		José Williams Cordero
7	Brylín Alberterras	3078449	Polivita	3142997932		Brylín Alberterras
8	Delisa Alarcón	41697212	Marengo	320		Delisa Alarcón
9	Emice Corderos	51838914	Capital Salud	2909005		Emice Corderos
10	Blanca Quiroga	51575910	Capital Salud	31243726		Blanca Quiroga
11	María Roldán	51560744	Companca	375374316		María Roldán
12	Glady's Cordero	51712628	Capital Salud	3005186836		Glady's Cordero


INFORMACIÓN GENERAL

PROCESO VIO DEPENDENCIA:	Veduta CPS Salud Pac.	FECHA:	6/05/2022
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD:		HORA DE INICIO:	8:00 am.
TEMA:	Seguimiento obra.	HORA DE FINALIZACIÓN:	11:00 am.
RESPONSABLE:	Prof. Paola Saiz Pal	FIRMA:	

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	EPS	TELÉFONO DE CONTACTO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Jorge Ramero	79454960	Capital Salud	314 3073351	CoSpeed-11@hotmail.com	
2	Adriano Cabbales	43730798	SURA	3004667999	angelcabbales@gmail.com	
3	Manoel Oliveira Nogueira	52150028	Emprendor	3002664929	deconvalde@unhuaral.edu.ve jayrooliveira@unhuaral.edu.ve abogadoluis2@unhuaral.edu.ve	
4	Luis Enrique Chaparro Lopez	80896118	Famivaner	3185149738	carhoo@unhuaral.edu.ve	
5	MILDA MONTES MARTINEZ	1014238431	SUNA	3202059922	08108440462@sunar.com.ve CENTROORIENTE.GOV.CO	
6	Jairo Hernandez E	19202843	Alianza de Q	301.6148802	19jherandez@saludcapital.com.ve	
7	YIPAM HERRERA	51944938	COMPENSA	312934660	1101010259@sbped.com.ve	
8	Edinson Herrera	51741057	Compensa	300568988	ParqueGarcia@sbped.com.ve	
9	Mallu Yolanda Aguado	51639753	Compensa	3124475304	parquegarcia@saludcapital.com.ve	
10	Mara Eleanora	71604899	SURA	3002605194	agorranillo@saludcapital.com.ve	
11	Cristina Ayala	1030603006	Compensa	3123529916	cgayala@saludcapital.com.ve	
12	Liliana Sanchez	51.885.867	SURA	310 8841739	lsanchez@ogsonmuros.com	

INFORMACIÓN GENERAL

PROCESO Y/O DEPENDENCIA:	Verdejo CAPS Base Base	FECHA:	6/05/2022
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD:		HORA DE INICIO:	8:00 am
TEMA:	Seguimiento obso	HORA DE FINALIZACIÓN:	1:00 pm
RESPONSABLE:	Prof. Paola Sotol	FIRMA:	

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	EPS	TELÉFONO DE CONTACTO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Adelicia Gordillo	41716159	La Nueva	3214538460		
2	Josca A Henquida	2869139	Algarrobo	3573671890		
3	Alejandro Alfaro	52236026	Capital Salud	3104264133		
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						



# Seguimiento Proyecto de infraestructura CAPS BRAVO PAEZ

OFICINA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA  
Y SERVICIO AL CIUDADANO

6/05/2022

# AGENDA PROPUESTA

1. *Bienvenida e Instalación de la reunión*
2. *Acuerdos de oro para realizar reunión efectiva*
3. *Presentación de los asistentes*
4. *Seguimiento avance a la ejecución de la obra  
CAPS Bravo Páez*
5. *Intervención de la vocera de la Veeduría*
6. *Intervención de la comunidad*
7. *Respuesta institucional*
8. *Compromisos*
9. *Recorrido a la obra*
10. *Cierre*



# PROTOCOS DE BIOSEGURIDAD

## MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE COVID-19

USO PERMANENTE DE LA MASCARILLA



DISTANCIAMIENTO FÍSICO



DESINFECCIÓN DE MANOS



Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
Centro Oriente E.S.E.

#SubredCOMásCercaDeTi



SECRETARÍA DE  
SALUD

BOGOTÁ

# REGLAS DE ORO

1. Mantener el diálogo con intervenciones propositivas, respetuosas y creativas.
- 2. Escuchar activamente cada intervención**
3. Cumplir el tiempo de las intervenciones. Intervenciones máximo de 2 minutos por persona sobre el tema
- 4, No retirarse el tabocas durante toda la jornada, en especial al momento de realizar intervenciones**





## *Presentación de los asistentes*



Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
Centro Oriente E.S.E.

#SubredCOMásCercaDeTi



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE  
SALUD



# *Seguimiento avance a la ejecución de la obra CAPS Bravo Páez*



Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
Centro Oriente E.S.E.

#SubredCOMásCercaDeTi



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE  
SALUD



- ❖ *Intervención de la comunidad*
- ❖ *Respuesta institucional*
- ❖ *Compromisos*
- ❖ *Recorrido a la obra*
- ❖ *Cierre*



 **Subredco**  
Cerca de ti

# GRACIAS

*Síguenos en nuestros canales digitales*



Twitter  
@SubRedCentroOri



Instagram  
subred\_centrooriente



Facebook  
subredcentrooriente



YouTube  
Subred Centro Oriente



Telegram  
Subred CO Más Cerca de ti



LinkedIn  
Subred Centro Oriente



Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
Centro Oriente E.S.E.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE  
SALUD



# PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA


## Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

Mayo - 2022

# CAPS BRAVO PAEZ

CONVENIO 2011787-2020

Subred Integrada de Servicios de Salud  
Centro Oriente E.S.E

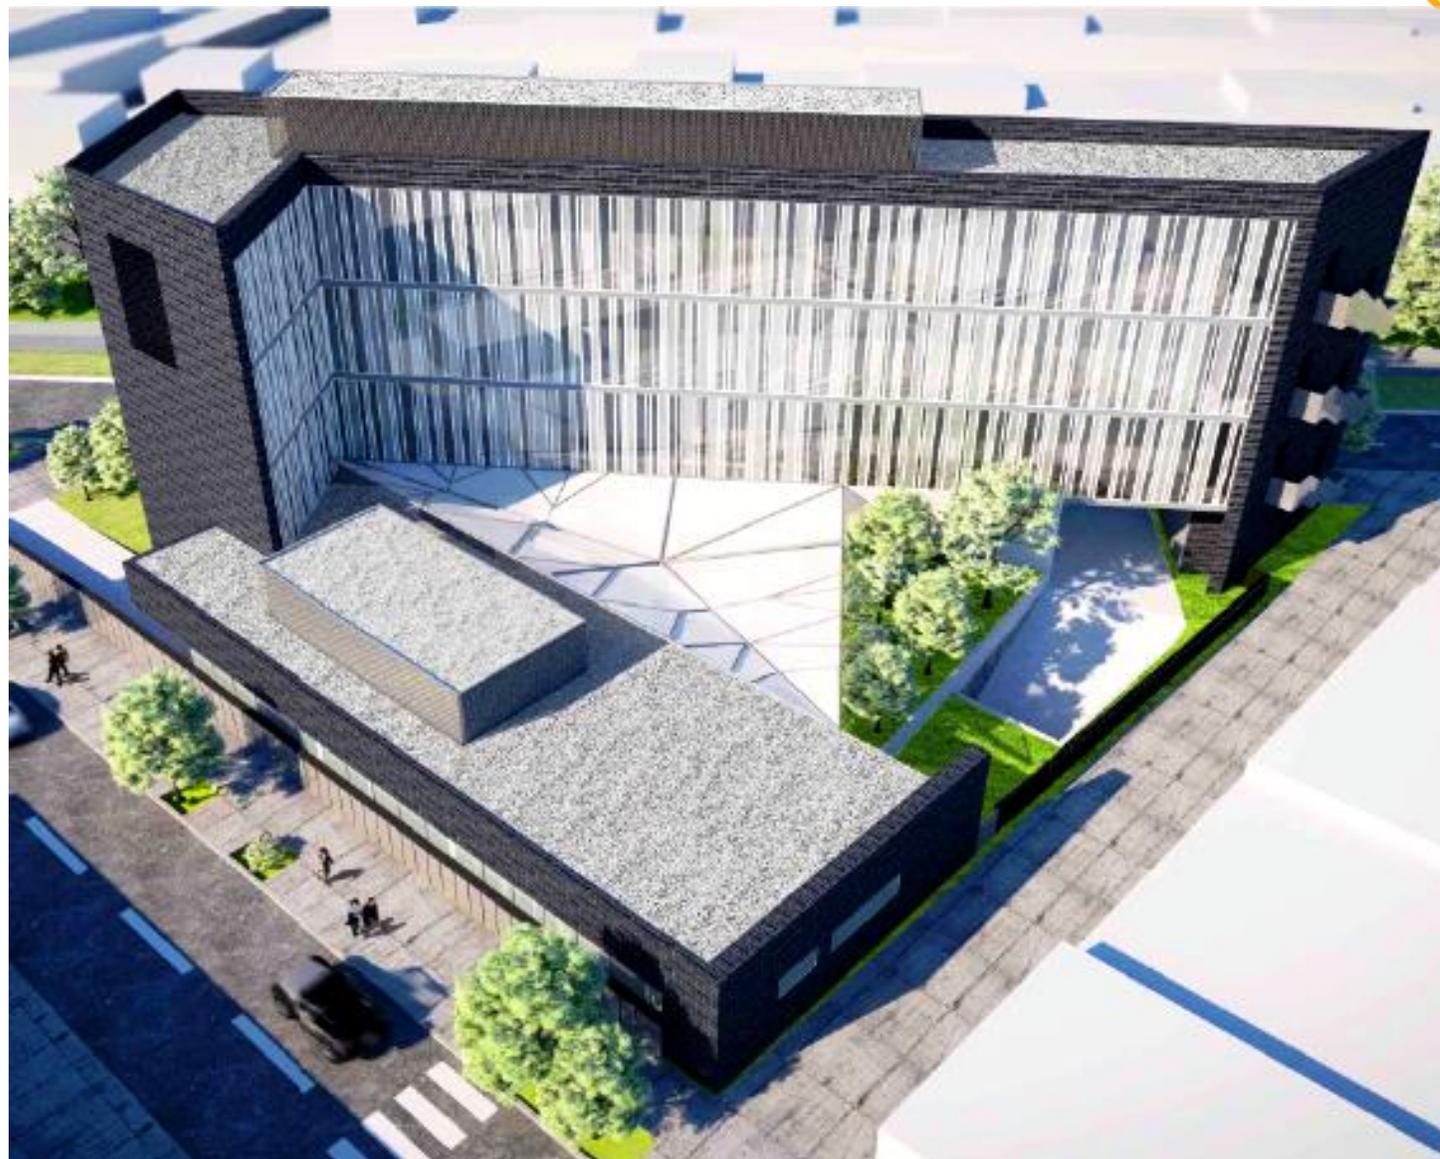

Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
Centro Oriente E.S.E.

#SubredCOMásCercaDeTi



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE  
SALUD



# CONVENIO CAPS BRAVO PAEZ

<b>Convenio Nro.:</b>	<b>2011787-2020</b>		
<b>Objeto:</b>	Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto “Construcción y Dotación CAPS Bravo Páez”		
<b>Valor del Convenio inicial:</b>	\$ 17.278.404.899	Valor	Registro Presupuestal
		\$ 16.977.638.136	FFDS 4657
		\$ 300.766.763	ESE N/A
<b>Adición No. 1</b>	\$1.993.609.461	FFDS	5408
<b>Valor actual del convenio:</b>	<b>\$19.272.014.360</b>		
<b>Fecha Suscripción:</b>	20/11/2020		
<b>Fecha de inicio:</b>	27/11/2020	Plazo de ejecución Inicial:	27 meses
<b>Fecha de terminación inicial:</b>	26/02/2023	Prórrogas acumuladas:	N/A
<b>Prorrogas</b>	N/A	N/A	N/A
<b>Fecha de terminación actual:</b>	<b>26/02/2023</b>		

# CONVENIO CAPS BRAVO PAEZ

## Resumen de Recursos del Convenio

Fechas del Proceso de Adjudicación de los Contratos	
Publicación de Pliego de Condiciones definitivo para la Licitación Pública No. 2 de 2020	31/12/2020
Publicación de Pliego de Condiciones definitivo para el Concurso de Méritos No. 1 de 2021	19/03/2021
Adjudicación de la Licitación Pública No. 02 de 2020	17/03/2021
Adjudicación del Concurso de Méritos No. 01 de 2021	26/05/2021
Suscripción de Acta de Inicio de Obra Civil	18/08/2021

Valor Contratos de Infraestructura	
Valor inicial Contrato de Obra	\$14.751.182.301
Adición No. 1 - Contrato de Obra	\$122.683.705
Valor inicial Contrato Interventoría	\$1.543.420.480
<b>TOTAL</b>	<b>\$16.417.286.486</b>

Valor Contratos de Equipos de Mobiliario y Biomédico	
Valor Dotación equipos de Mobiliario	\$ 261.439.093
Valor Dotación equipos Biomédicos	\$ 1.475.416.333
Valor TIC's (hace parte de proceso en conjunto con SDS)	N.A.
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.736.855.426</b>

# SEGUIMIENTO AL AVANCE DE DOTACIÓN CAPS BRAVO PAEZ

## CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS

- Contrato Interadministrativo No. 02-BS-0248-2021 EGAT DOTACIÓN BRAVO PAEZ. **VALOR: \$ 1.736.855.426**

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Publicación aviso de control social por parte de la Subred	08/04/2022	SUBRED
Publicación de documentos previos y proyecto de reglas de participación pública	08/04/2022	SECOPII
Visitas de preinstalación CAPS ALTA MIRA, BRAVO PÁEZ Y DIANA TURBAY	12/04/2022	INSTALACIONES CAPS ALTAMIRA, BRAVO PÁEZ Y DIANA TURBAY
Plazo para recibir observaciones a las reglas de participación pública	13/04/2022	SECOPII
Publicación de respuestas a las observaciones Reglas de Participación Pública	25/04/2022	SECOPII
Publicación de respuestas a las observaciones a las Reglas de Participación Pública Definitiva	04/05/2022	SECOPII
Plazo máximo para expedir adendas	06/05/2022	SECOPII
Cierre del proceso de selección y plazo máximo para presentación de ofertas.	11/05/2022 Hora 10:00 AM	SECOPII
Verificación de requisitos habilitantes y calificación de las ofertas	HASTA EL 20/05/2022	SECOPII
Publicación Informe de Evaluación de las ofertas	20/05/2022	SECOPII
Traslado para observaciones al informe de evaluación	25/05/2022	SECOPII
Respuesta a observaciones al informe de evaluación	02/06/2022	SECOPII
Publicación listada de proponentes habilitados	02/06/2022	SECOPII
Apertura del sobre económico	03/06/2022 08:00 a.m	SECOPII
Subasta Inversa Electrónica	03/06/2022 14:00 p.m al 08/06/2022 5:00 p.m	SECOPII
Subsanación Precios artificialmente bajos	09/06/2022 hasta 17:00	SECOPII
Recomendación de adjudicación	10/06/2022 17:00 p.m.	SECOPII
Publicación de la adjudicación o de declaratoria de desierta.	13/06/2022	SECOPII

**Nota:** La recomendación de adjudicación de la dotación de Equipos Biomédico y de Mobiliario, Se hace en el marco del proceso ISI 004 de 2022 adelantado por la EGAT.

**#SubredCOMásCercaDeTi**

# CONVENIO CAPS BRAVO PAEZ

## RESUMEN PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO - PMA

AMBIENTE POR SERVICIOS	
SALA ESPERA	ESTERILIZACION
U.SAN PUBLICO M.	RAYOS X ODONTOLOGIA
U.SAN PUBLICO H.	CUARTO PROCEDIMIENTOS
OFICINA COORDINACION	CONSULTORIO + GIMNASIO
U.SAN	TERAPIA OCUPACIONAL
SALA DE LACTANCIA	CONSULTORIO TERAPIAS
MODULAR GESTORES	CONSULTORIO FONOLOGIA CON CABINA
PUESTO PROMOCION DETECCION	CONSULTORIO TERAPIA RESPIRATORIA
ARCHIVO DOCUMENTAL	CUARTO CALIENTE
SALA CAPACITACIONES	CUARTO FRIO
ALMACEN INTERMEDIO RESIDUOS SOLIDOS	ULTRA SONIDO
CONSULTORIOS (14)	SALA DE RAYOS X
UNIDAD ODONTOLOGICA GENERAL	CUBICULOS TOMA DE MUESTRAS DE FLEBOTOMÍA
UNIDAD ODONTOLOGICA DE HISTORIAS CLINICAS	TOMA DE MUESTRAS ESPECIALES
UNIDAD P Y P SALUD ORAL	
<b>TOTAL DE AREA + CIRCULACIONES(M2)= 2687,94</b>	



# CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA CAPS BRAVO PAEZ

## CONTRATO DE OBRA

**Contrato No.** 02-BS-0041-2021

**Contratista:** MIROAL INGENIERIA SAS

**Fecha de firma acta de inicio:** 18/08/2021

**Valor inicial:** \$ 14.751.182.301

**Adición No. 1:** \$ 122.683.705, correspondió a pilotes

**Valor Actual:** \$ 14.873.866.006

**Fecha finalización:** Agosto 17 2022

## CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**Contrato No.** 02-BS-0096-2021

**Contratista:** CONSORCIO AGS-MYV 2021

**Fecha de firma acta de inicio:** 18/08/2021

**Valor inicial:** \$ 1.543.420.480

**Valor Actual:** \$ 1.543.420.480

**Fecha finalización:** Septiembre 17/ 2022



Estado general del avance en obra



Avance actividades excavación manual para vigas de cimentación.



Pruebas de Integridad de Pilotes en obra.



Vista general de fundida vigas y dados Torre 2



Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
Centro Oriente E.S.E.

#SubredCOMásCercaDeTi



SECRETARÍA DE  
SALUD



# CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA CAPS BRAVO PAEZ

- El 01 de abril de 2022 se radica ante la Secretaria Distrital de Salud Orfeo No. 20221000051741 una solicitud de **Autorización para la utilización de excedentes** de recursos del Convenio por valor de **\$559.447.956**, los cuales se aprueban el 06 de abril de 2022, por parte del Comité Operativo del convenio.

Contratos	Valor adición
Obra No. 02-BS-0041-2021	Adición \$169.002.000 Inclusión NP-06
Interventoría No. 02-BS-0096-2021	Adición \$390.445.956

- En fecha **28 de abril de 2022**, a las 3:37 pm, se cargó en el Sistema Electrónica de Contratación Pública SECOP II, el **Otrosí No. 002** de Modificación, Prórroga y Adición **al Contrato de Obra No. 02-BS-0041-2021**, sin que a la fecha el contratista de obra MIROAL INGENIERIA S.A.S., haya aprobado y enviado a la entidad a través del SECOP II dicho Otrosí; argumentando:

*Así las cosas, solicitamos sea modificado el documento del asunto, con el fin de que se omitan las cláusulas y condiciones que limiten la posibilidad de reclamar*

# SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA CAPS BRAVO PAEZ

## ACTIVIDADES FINALIZADAS EN EL PROYECTO

- Se finalizo la excavación y fundición de los Pilotes de Cimentación del CAPS Bravo Páez.
- Se finalizo actividades de excavación sobre la Torre 1 y Torre 2
- Se finalizo las actividades de pañete sobre Taludes para estabilizarlos.
- Se finalizo actividades de descabece de pilotes con demoledor de bajo impacto.

## ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

- Se continúan actividades de excavaciones manuales para vigas y zapatas de cimentación.
- Se realizan las Pruebas de Integridad de los Pilotes de Cimentación Profunda.
- Se inicia armado de aceros de las Vigas y Zapatas de Cimentación.
- Se inicia de armado de aceros zarpas para muros de contención internos de Torre 1 y Torre 2.
- Se inicia fundición de Vigas y Zapatas de Cimentación, así como las Zarpas de los muros de contención.
- Se inicia la fundición del ajuste constructivo a los Pilotes de Cimentación Profunda.



# SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA CAPS BRAVO PÁEZ

## ANTECEDENTES

Modificación a la Licencia de Construcción debidamente ejecutoriada, de fecha 10 de noviembre de 2021.

<b>Arq. ANA MARÍA CADENA TOBÓN</b>		No DE RADICACIÓN	PÁGINA	
<b>Curadora Urbana 3</b>		<b>11001-3-21-0823</b>	<b>1</b>	
Modificación de Licencia Vigente No.		FECHA DE RADICACIÓN		
<b>11001-3-21-1614</b>		<b>01-Jul-2021</b>		
Modifica Licencia No. 11001-3-20-0011 Expedida: 08-Ene-20 Ejecutoriada 04-Feb-20 Vigencia 04-Nov-22		CATEGORÍA: III		
FECHA DE EXPEDICIÓN: <b>20 OCT 2021</b>	FECHA DE EJECUTORIA: <b>10 NOV 2021</b>			
Dirección: CL 35B S 25A 37(ACTUAL)				

La Curadora Urbana 3 de Bogotá D.C., ANA MARÍA CADENA TOBÓN en ejercicio de las facultades legales que le confieren las Leyes 388 de 1997, 810 de 2003, sus decretos reglamentarios y el decreto distrital 670 del 5 de diciembre de 2017, y en consideración del alcance y características de la solicitud radicada

**RESUELVE**

Otorgar MODIFICACIÓN LICENCIA DE CONSTRUCCION (VIGENTE) QUE CONSISTE EN CAMBIOS INTERNO EN SEMISOTANO Y PRIMER PISO Y ADICIONAR UNA RAMPA DE COMUNICACION ENTRE DICHOS PISOS, MANTENIENDO LAS CONDICIONES VOLUMETRICAS APROBADAS QUE CORRESPONDEN A UNA EDIFICACIÓN DE CUATRO (4) PISOS CON SEMISOTANO DESTINADA A UNA (1) UNIDAD DOTACIONAL DE SALUD DE ESCALA VECINAL. para el predio urbano localizado en la(s) dirección(es) CL 35B S 25A 37 con Chip(s) AAA0013WNMR y matrícula(s) inmobiliaria(s) 50S40418009 en el lote UNICO, manzana UNICA de la urbanización LA FRAGUA (Localidad RAFAEL URIBE URIBE). Titular(es): SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. (CC/NIT 900959051-7) Rep. Legal ARDILA TORRES CLAUDIA LUCIA (CC/NIT 39681610). Constructor Responsable: MARTINEZ ESPERANZA MARTINEZ cc. 41704937 Mat. 2570035999CND

1. MARCO NORMATIVO			
POT (DECR. 190/2004)	UPZ No:39 (QUIROGA)	SEC. NORM: 14-USOS: I EDIFIC: A	
e. AREA ACTIVIDAD:	RESIDENCIAL.	i. ZONA:	RESIDENCIAL CON COMERCIO Y SERVICIOS EN LA VIVIENDA
g. TRATAMIENTO:	CONSOLIDACIÓN	h. MODALIDAD:	DENSIFICACIÓN MODERADA
1.2 ZN RIESGO:	a. Remoción en Masa: NO	b. Inundación: NO	1.3 MICRO-ZONIFICACIÓN: ALUVIAL 100 /
1.2 ANTECEDENTES			
No. Licencia Anterior 11001-3-20-0011		Fecha Expedición: 2020-01-08	Referencia Radicación: 11001-3-19-0956



Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
Centro Oriente E.S.E.

#SubredCOMásCercaDeTi



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE  
SALUD



# SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA CAPS BRAVO PÁEZ

## Registro Fotográfico



Registro fotográfico estado inicial del inmueble



Recibo de Predio y toma de registro fotográfico



Estado del inmueble antes de la demolición



Entrega de los puntos de levantamiento topográfico al personal de obra e interventoría.



Desmante de tejas y de estructura en el segundo piso.



Desmante de tejas y de estructura en el segundo piso.



Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
Centro Oriente E.S.E.

#SubredCOMásCercaDeTi



SECRETARÍA DE  
SALUD



# SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA CAPS BRAVO PÁEZ

## Registro Fotográfico



Actividades de desmonte de carpintería e inicio de demolición del edificio



Actividades de desmonte de cubierta e inicio de demolición del edificio



Demolición con máquina



Avance de la demolición del edificio.



Retiro de escombros



Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
Centro Oriente E.S.E.

#SubredCOMásCercaDeTi



SECRETARÍA DE  
SALUD



# SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA CAPS BRAVO PÁEZ

## Registro Fotográfico



Despeje del lote



Excavación manual prehuecos para localización de pilotes



Demolición de cimentación encontrada en excavación para prehuecos, la cual interfería con la máquina piloteadora.



Inicio de pilotaje



Actividades de perforación y fundida de pilotes.




# SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA CAPS BRAVO PÁEZ

## Registro Fotográfico



Actividades de pilotaje

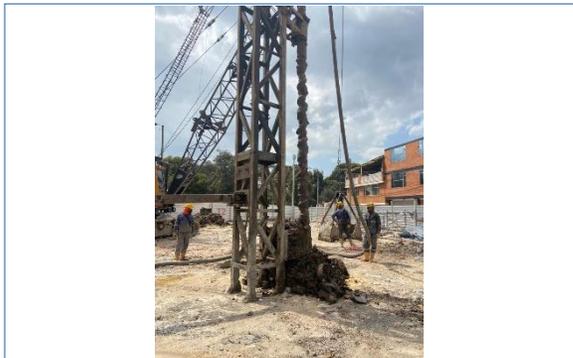

Proceso de pilotaje



Retiro de material sobrante del pilotaje



Inicio de demolición placa de contrapiso



Demolición placa de contrapiso



Retiro de la placa y despeje del lote.



# SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA CAPS BRAVO PÁEZ

## Registro Fotográfico



En las actividades de excavación se encuentra cimentación existente.



Actividades de excavación y demolición de vigas de cimentación.



Destape de Vigas de cimentación encontradas para su demolición



Zapatas encontradas de cimentación antigua edificación



Inicio actividades de excavación.



Proceso de excavación Torre 1 y retiro de material



# SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA CAPS BRAVO PÁEZ

## Registro Fotográfico



Pañete de taludes



Perfilado de fondo de excavación



Avance excavación y pañete de taludes



Proceso de excavación Torre 1 y 2, pañete de taludes



Descabece de pilotes.



Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
Centro Oriente E.S.E.

#SubredCOMásCercaDeTi



SECRETARÍA DE  
SALUD



# SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA CAPS BRAVO PÁEZ

## Registro Fotográfico



Actividades de excavación manual vigas de cimentación.



Avance actividades excavación manual para vigas de cimentación.



Inspección excavaciones



Lluvias afectando fondo de excavación



Carcavamiento por lluvias



Localización y trazado de vigas de cimentación para iniciar actividades de excavación manual Torre 2.



# SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA CAPS BRAVO PÁEZ

## Registro Fotográfico



Continuación de excavaciones vigas de cimentación Torre 1.



Continuación de actividades de excavación manual vigas de cimentación Torre 2 y descabece de pilotes



Llegada de acero para cimentación de Torre 2



Construcción de red principal de filtro bajo Torre 1 y Torre 2.



Construcción cajas de inspección de 70x70 mts para inspección de filtros



Pruebas de Integridad de Pilotes en obra.



# SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA CAPS BRAVO PÁEZ

## Registro Fotográfico



Armado de vigas de cimentación y zarpas para muros de contención Torre 1 y Torre 2



Alistamiento para reforzamiento de los pilotes que presentaron el acero sobresaliente.



Descabece de pilotes



Estado general del avance en obra



Armado de vigas de cimentación en sentido perpendicular al talud.



Excavaciones para ramales de filtros.



# SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA CAPS BRAVO PÁEZ

## Registro Fotográfico



Toma de Pruebas de Integridad



Estado del fondo de excavación después de fuertes lluvias.



Deslizamiento talud costado carrera 26 debido a las fuertes lluvias.



Reforzamiento de pilotes para cortante después de evaluación Estructural por parte del Especialistas.



Toma Slump concreto para fundir vigas y dados de cimentación Torre 2.



Vista general de fundida vigas y dados Torre 2



Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
Centro Oriente E.S.E.

#SubredCOMásCercaDeTi



SECRETARÍA DE  
SALUD



# SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA CAPS BRAVO PÁEZ

## Registro Fotográfico



Proceso de fundida vigas de cimentación Torre 2



Proceso de fundida vigas de cimentación Torre 2



Proceso de fundida vigas de cimentación Torre 1



Desmonte de poste de teléfono, cableado sin uso.



Armado de hierros para columnas y muros de contención.



Armado de hierros para columnas y muros de contención.





**Subred**co  
Cerca de ti

**GRACIAS**

*Síguenos en nuestros canales digitales*



Twitter  
@SubRedCentroOri



Instagram  
subred\_centrooriente



Facebook  
subredcentrooriente



YouTube  
Subred Centro Oriente



Telegram  
Subred CO Más Cerca de ti



LinkedIn  
Subred Centro Oriente



Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
Centro Oriente E.S.E.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE  
SALUD



BOGOTÁ
