



**NOMBRE DE LA REUNIÓN:** Reunión Veedores – Seguimiento al Convenio 1223 de 2017 CAPS Tunal y al Convenio 2806257 de 2021 Urgencias- Reordenamiento USS Tunal– SDS Subred Sur

**RESPONSABLE:** María Elena Restrepo García      **SECRETARIO:** Notas x: Ana Milena Bayona Gómez

**REUNIÓN N°:** 08 – 2022

**FECHA:** 24 octubre 2022

**HORA INICIO:** 1:00 pm

**LUGAR:** Hospital El Tunal – Área de Obra Centro de Salud y Urgencias

**HORA FINAL:** 3:00 pm

### 1. OBJETIVO:

Realizar asistencia técnica de recorrido a las obras en el marco de la veeduría al Convenio 2806257 de 2021 de Adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal y Convenio 1223 de adecuación y dotación CAPS El Tunal – Fondo Financiero Distrital y Subred Sur. Se siguen las directrices nacionales y distritales derivadas por el regreso a la normalidad luego de culminar la emergencia por COVID – 19

**2. PARTICIPANTES:** Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de “Listado de asistencia DI-DE-FT-07

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	Nelly Saldarriaga	Veedora	<a href="mailto:asodeuhvh3@gmail.com">asodeuhvh3@gmail.com</a>	Veeduría obras El Tunal	Presencial
2	Rosalba Gutiérrez	Veedora	<a href="mailto:asodeuhvh3@gmail.com">asodeuhvh3@gmail.com</a>	Veeduría obras El Tunal	Presencial
3	María Ninfa Rodríguez	Veedora	<a href="mailto:ma.ninfarodriguez@gmail.com">ma.ninfarodriguez@gmail.com</a>	Veeduría obras El Tunal	Presencial
4	Edgar Loaiza	Veedor	<a href="mailto:libraescorpion1941@gmail.com">libraescorpion1941@gmail.com</a>	Veeduría obras El Tunal	Presencial
5	Mariela Ardila	Veedora	<a href="mailto:asouhtunal@hotmail.com">asouhtunal@hotmail.com</a>	Veeduría obras El Tunal	Presencial
6	María Concepción del Prado Espinel	Veedora	<a href="mailto:asouhtunal@hotmail.com">asouhtunal@hotmail.com</a>	Veeduría obras El Tunal	Presencial
7	Julia Cárdenas	Veedora	<a href="mailto:asouhtunal@hotmail.com">asouhtunal@hotmail.com</a>	Veeduría obras El Tunal	Presencial
8	María Elena Restrepo	Medico Especializada	<a href="mailto:mariaelena2219@hotmail.com">mariaelena2219@hotmail.com</a>	Gestión Proyectos – Subred Sur	Presencial
9	Jonathan Rojas	Ingeniero	<a href="mailto:jonatanrojasing@gmail.com">jonatanrojasing@gmail.com</a>	UT MO 2021	Presencial
10	Alejandra Zambrano	Ingeniera	interventoriacapstunal@gmail.com	Logia 3 interventoría	Presencial
11	Julio Martínez	Ingeniero	<a href="mailto:sstainterventoria@gmail.com">sstainterventoria@gmail.com</a>	Logia 3 interventoría	Presencial
12	Alisson Alvarado	Ingeniera	<a href="mailto:interventoriatunal@gmail.com">interventoriatunal@gmail.com</a>	Tash interventoría	Presencial



13	Farid Moyano	Ingeniero	<a href="mailto:femovega@yahoo.es">femovega@yahoo.es</a>	Consortio Tunal 2022	Presencial
14	Johann Sebastián González	Profesional Especializado	JSGonzalez@saludcapital.gov.co	Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía – Control Social Secretaria Distrital de Salud	Presencial
15	Ana Milena Bayona Gómez	Profesional Universitario	participacion.tunjuelito@subredsur.gov.co	Of. Participación Comunitaria	Presencial

### 3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)

1. Bienvenida y registro de asistencia
2. Seguimiento compromisos
3. Presentación avances convenios El Tunal – recorrido a la obra
4. Acuerdos y compromisos
5. Cierre de la reunión

### 4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

Se verifica asistencia de ciudadanía, ingenieros de contratista e interventoría, profesional especializado control social de SDS, médico especialista Gestión de Proyectos y Profesional de Participación de la Subred Sur.

### 5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

1. Envío acta y presentación de la reunión
2. Seguimiento a las solicitudes
3. Seguimientos veedores
4. Convocatoria reunión seguimiento de veedores

### 6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

#### 1. Bienvenida y registro de asistencia

Se realiza reunión presencial en la Unidad de Servicios El Tunal, siguiendo las indicaciones de uso de tapabocas y desinfección de manos. La Oficina de Participación de la Subred Sur gestionó el vehículo institucional para el traslado de los veedores.

Se da inicio a la reunión para el seguimiento de avances de los Convenios 2806257 de 2020 y 1223 de 2017 SDS – Subred Sur, siendo la 1:10 pm iniciando la reunión con 07 veedores.

La bienvenida y apertura de la reunión la realiza la profesional de participación para Tunjuelito Ana Milena Bayona Gómez, dando contexto de las obras de Tunal y explicando el objetivo de la reunión.

#### 3. **Presentación avances convenios de obras El Tunal**

Se recuerda a los asistentes que se tienen dos proyectos de obra en desarrollo en la USS El Tunal: y se iniciara en el Centro de Salud y luego al área de urgencias.



## AVANCE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN USS EL TUNAL

1

Proyecto:  
Adecuación y Dotación Centro de Salud Tunal

2

Proyecto:  
Adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal



### Recorrido a la obra de Centro Salud Tunal


1

Proyecto:  
Adecuación y Dotación Centro de Salud El Tunal



1

Proyecto:  
Adecuación y Dotación Centro de Salud El Tunal

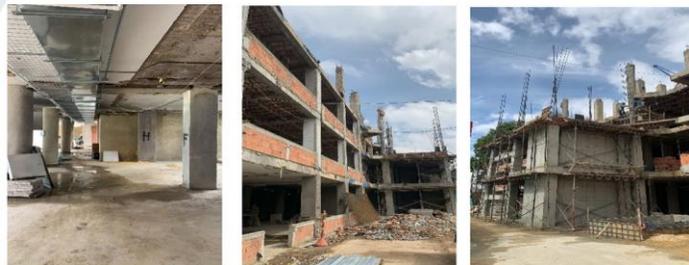

Construcción punto fijo y muros perimetrales. Centro de Salud Tunal.





Los ingenieros de interventoría de Logia 3 y UT MO 2021, saludan a los asistentes y agradece a los veedores el compromiso a participar en el recorrido por la obra del Centro de Salud El Tunal, informa que por motivos de seguridad los asistentes podrán hacer observación de la obra en el perímetro y no está permitido el ingreso al edificio, recordando que se hace seguimiento al convenio 1223 Adecuación y Dotación CAPS El Tunal en primer momento, recordando de manera general:



## Adecuación y dotación Centro de Salud Tunal

Actividades ejecutadas en OBRA durante el periodo evaluado (septiembre 2022):

- ❖ Se realizó la identificación y creación de ítems no previstos, con respecto al presupuesto inicial que no es acorde a las necesidades actuales del proyecto, debido a la revisión de diseños iniciales y a los ajustes aprobados por SDS, (de acuerdo a la realidad del proyecto, con las modificaciones requeridas por la Subred en el proceso de reorganización de servicios-Abraham Lincon).
- ❖ El contratista de obra radicó solicitud de prorroga y de adición presupuestal ante la Subred e interventoría: necesidad de prorrogar el contrato de acuerdo al tiempo que el contratista utilizó ajustando los diseños iniciales en todos sus componentes (entre otros:- Componente eléctrico. - Componente arquitectónico - Componente bioclimático - Componente hidrosanitario y RCI - Carpintería metálica y en madera - Fachada y ventanería - Ventilación mecánica, gases medicinales - Cubierta en teja. – Equipos)



- El 15 de diciembre se firma de acta de inicio al contrato de interventoría y al contrato de obra, los cuales se encuentran en el momento en ejecución.
- Se entregó el predio a contratista de obra UT MO 2021, iniciando enero de 2022.
- Porcentaje de cumplimiento de cronograma de la obra está en 40.2% a la fecha del recorrido.



## Adecuación y dotación Centro de Salud Tunal

Seguimiento ejecución del Convenio-Actividades administrativas:

- El 13 de septiembre de 2022, mediante el radicado No. 202203000199691, la Subred Sur solicita a la EGAT, inicio del proceso precontractual de selección abreviada mediante subasta inversa electrónica para la Dotación Integral del Proyecto CAPS Tunal de la Subred Sur E.S.E.
- Una vez se emitió el concepto técnico por parte de la SDS, que dio viabilidad para poder ejecutar los recursos girados a la ESE en la vigencia anterior, con cargo al Convenio No 1223 de 2017(rubro de inversión-Dotación), el 28/09/2022 el proyecto quedó registrado en el Banco de programas y proyectos de la SDS, con el código No. 2022 20 02 42, por valor de \$1.873.054.835 para la vigencia 2022. No queda incluida la Etapa IV que corresponde a TIC, la cual queda pendiente por \$578.914.198.



- Se tiene plan de ingreso y salida de vehículos pesados para ingreso de material y salida de escombros, se tienen certificados de la salida de los escombros para hacerle el respectivo seguimiento y hasta la fecha no se ha generado dificultades de movilidad.
- Está en proceso de fundición de placa de cuarto piso y finalizo de construcción de paredes en el perímetro del edificio hasta el tercer piso, las paredes externas se realizan con bloque y ladrillos y las paredes internas del edificio serán con estructura liviana.
- Se observa en el recorrido que se cuenta con los ductos de ascensores hasta el tercer piso y estructura de escalera junto a los ascensores.
- Se está terminando la ampliación de los aleros del perímetro del edificio, estando completo el tercer piso, parcial en el cuarto piso, dado que se viene esperando que fijen y compacten de manera segura.
- Está en proceso en secretaría para aprobación de prórroga por cinco meses y están iniciando proceso para estudio de adición.
- Se tiene proyectado que terminen etapa estructural en diciembre.
- Se iniciaron trabajos de mampostería, pañetes y alistamiento de muros, redes hidráulicas y eléctricas y enchape de baños.

Los vedores hacen diferentes preguntas e intervenciones con respecto a: calidad de materiales, salida de escombros, proceso de prórroga y adición. Además de solicitar que especifiquen los tiempos de terminacion de la obra, la proyeccion de los servicios que se ubicaran en el edificio, teniendo en cuenta las modificaciones del diseño inicial.



2

**Proyecto:**  
Adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal



Se realiza traslado de los veedores al área de la obra de reorganización en la que se ubicaba urgencias y consulta externa, siendo recibidos por ingeniero de consorcio Tunal 2022 y la interventoria de dicha obra:

PROYECTO ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL



**Población a Beneficiar**  
459.554 Personas

% Avance obra con corte 30 de septiembre 2022

- EJECUTADO: 6.5%
- PROGRAMADO: 6.1%

**Adecuaciones:**

- 88 Camillas De Observación Urgencias
- 2 Consultorios Triage
- 7 Consultorios de Valoración Urgencias
- 9 salas de cirugía
- UCI Intensivo
- UCI Intermedio
- Hospitalización



**LINEA DE TIEMPO**



Los ingenieros de interventoria y consorcio informa que se tiene un avance de demolición del 70%.



**Adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la USS El Tunal**

Actividades ejecutadas en OBRA durante el periodo evaluado (septiembre 2022):

- A la fecha se han adelantado la ejecución de la demolición del antiguo edificio de consulta externa, esta se encuentra en un avance de ejecución del 33%, adicionalmente se adelantaron trabajos de entrega de espacios pendientes al contratista, tales como el antiguo edificio de urgencias, con el fin de iniciar demolición del mismo
- Se cuenta ya con disposición en la obra de máquinas demoledoras y retroexcavadoras
- Luego de revisar la implantación del proyecto, debió modificarse la huella del edificio para cumplir con la normatividad urbanística y con el PMA



Los veedores hacen diferentes preguntas e intervenciones con respecto a: calidad de materiales, salida de escombros, avance en el proceso de demolición y tiempos para inicio de excavación, preguntan además como se va a hacer el manejo de los árboles que están en el área de la obra, lo mismo que una vecina del hospital solicita información sobre las posibles afectaciones de los servicios públicos en los conjuntos.

El ingeniero responde las inquietudes de los ciudadanos y se hace cierre de la actividad.

**Acuerdos y compromisos**

- Enviar acta del recorrido para soportar la mesa de dialogo.
- Proyectar capacitación en infraestructura
- Se proyecta próxima mesa de dialogo el 17 de noviembre, para el seguimiento a la gestión a las 10 am, ofreciéndose opción de virtual por aplicación meet y presencial en oficina de participación El Carmen.
- Los veedores enviaran copia de los seguimientos.

**4. Cierre reunión**

Cierra la reunión siendo las 4:00 pm, realizando traslado de los veedores en vehículo institucional a los puntos iniciales. Se proyecta próxima reunión el 17 noviembre a las 10 am.  
Se adjuntan lista de asistencia y registro fotográfico.



**7. COMPROMISOS:**

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha limite dd-mm-aa)	QUIEN (Responsable)
Socialización información tramite prorrogación y adición en obra Centro de Salud Tunal	Envío por correo electrónico	Reunión noviembre	Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
Envío acta reunión	Envío por correo electrónico	31 octubre 2022	Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
Seguimientos veedores	Envío por correo electrónico o aplicación Whatsapp	31 octubre 2022	Veedores
Recorrido obras Tunal	Gestión de vehículo institucional Convocatoria a recorrido realizará recordatorio telefónicamente y por aplicación Whatsapp Subred Sur	Diciembre 2022	Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano Subred Sur Veedores
Convocatoria reunión seguimiento de veedores	Socialización de avances del desarrollo de los convenios. Se realizará recordatorio telefónicamente y por aplicación Whatsapp Subred Sur	15 de noviembre 2022	Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano Subred Sur Veedores

**EN CONSTANCIA SE FIRMA:**

**RESPONSABLE DE LA REUNIÓN**

MARIA ELENA RESTREPO

**SECRETARIO REUNIÓN**

ANA MILENA BAYONA

GÓMEZ



LISTA ASISTENCIA REUNIÓN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD -  
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO

GSA-ATU-FR-05 V1

No	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	TELÉFONO FIJO O CELULAR	TEMA PRINCIPAL	CORREO	FIRMA
	FECHA	14-10-2022	HORA DE INICIO	01:00 PM	HORA TERMINACIÓN	03:30 PM		
1	Ara Melend	Bayona Gómez	52200275	Subred Sur Of PC Y SC	Tunjelito	311 8193509	participacion@salud tunjelito@gmail.com	
2	Edgmar Alvarado	Valencia	13058239	Medicina	Tunjelito	313 8078 184	linamarcos2194@gmail.com	
3	Mariana del Prado	Prado	93942490	Redurica	Sibatob	322 26 51521		
4	Julia Cordero	Cordero	41738238	Redurica	C. Bolívar	312 8884346		
5	María Mercedes Delgado	Delgado	22111111	Redurica	6º	390 361 498796		
6	Mariela Ardiel	Ardiel	41685628	Asamblea	19	3143946183		
7	Rosalba Gaiter	Gaiter	80563213	Victoria	19 C.B	3125802058		
8	Milly Saldaña	Saldaña	21551479	Redurica	19 C.B	321797 92 45	valyad@redurica.es	



LISTA ASISTENCIA REUNIÓN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD -  
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO

GSA-ATU-FR-05 V1

No	FECHA	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	HORA DE INICIO	HORA TERMINACIÓN	TELÉFONO Fijo O CELULAR	TEMA PRINCIPAL	CORREO	FIRMA
								Mesa de diálogo, reunión obras Tunal Recorrido seguimiento avance obras		
1	27-10-2022	Johann Hernández	1030355748	Secretaría Salud	01:00 PM	03:30 PM	3112611838	73@gmail.com	73@gmail.com	[Signature]
2		Alejandra Lombono	527023440	Logia 3 Interventoría				interventoriacps@ gmail.com	interventoriacps@ gmail.com	[Signature]
3		Jonathan Rojas	1121810224	UT AND 2011				jonathanrojas@ gmail.com	jonathanrojas@ gmail.com	[Signature]
4		Julio MARTINEZ	112183538	Logia 3 INTERVENT				55MINISTERIO@ gmail.com	55MINISTERIO@ gmail.com	[Signature]
5		Alicson S. Alvarado C.	1136887810	Interventoría				interventoriacahualta@ gmail.com	interventoriacahualta@ gmail.com	[Signature]
6		Farid HOPAY	80247864	Constructor				Penney@ gmail.com	Penney@ gmail.com	[Signature]
7		Yovani Juan Restrepo	130409910	Dirección de Gestión Programática Subred Sur				yovani.juan.2014@ gmail.com	yovani.juan.2014@ gmail.com	[Signature]
8										



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, GESTIÓN TERRITORIAL Y TRANSECTORIALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL CONTROL SOCIAL EN SALUD Código SDS-GSS-LN-013 V.3	Elaborado por: Ana María Cárdenas Revisado por: Sandra Caycedo Aprobado por: María Fernanda Torres P.	
---	---	--	--

Anexo N° 2. MODELO PARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS  
DE CONTROL SOCIAL EN SALUD

Nombre Veedor(a): Yo del Prado y Yo Nudo  
 Objeto de Control Social: Seguimiento, Obra Salud  
 Fecha: 24 Oct / 2019

Marque con una "X" según corresponda	
Espacio de Diálogo	
Seguimiento a compromisos	<input checked="" type="checkbox"/> <u>Recorrido a la obra</u>
Evaluación a seguimientos	
Hallazgos: <u>Obra centro de salud avance del 40:39, empezaron obra 'compuesto', hidráulico, eléctrico</u>	
Recomendaciones: <u>Ascensor, el pozo ya está el Ascensor no ha llegado x q es transportado</u>	
Compromisos: <u>Hallazgo negacion el avance de demolición esto en el 73%</u>	
¿Usted se encuentra muy satisfecho, satisfecho o insatisfecho con la respuesta emitida por la entidad? <u>Centro de salud información proyecto y adición. Arguciar proteger los deberes</u>	

Nombre del funcionario: Yo Nudo C.C. 41439616  
 Firma y número de cédula del Veedor(a): Yo del Prado C.C. 3942400

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Sur E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

MI-SIG-SIG-FT-01 V4

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, GESTIÓN TERRITORIAL Y TRANSECTORIALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL CONTROL SOCIAL EN SALUD Código: SDS-GSS-LN-013 V.3	Elaborado por: Ana María Cárdenas Revisado por: Sandra Caycedo Aprobado por: María Fernanda Torres P.	
---	--	--	--

Anexo N° 2: MODELO PARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CONTROL SOCIAL EN SALUD

Nombre Veedor(a): Nelly Saldarriaga  
 Objeto de Control Social: Obras Tunal  
 Fecha: 24-10-2022

Marque con una "X" según corresponda	
Espacio de Diálogo	
Seguimiento a compromisos	X Seguimiento de obras
Evaluación a seguimientos	
<b>Hallazgos:</b> (En este espacio se reporta lo encontrado, ya sea positivo o negativo de acuerdo con su observación) <u>Obras Centro de Salud. Avances del 40,3% en trabajos de mampostería, escape, redes eléctricas hidráulicas y espacio para el ascensor.</u> <b>Hallazgos:</b> <u>Organizar el 75% de Avances en el proceso de demolición.</u>	
<b>Recomendaciones:</b> (Realizar de manera propositiva observaciones, recomendaciones o sugerencias también en cuanto a esta entidad, del objeto de control social) <u>Centro de Salud Tunal y adición, información sobre próxima reunión.</u> <u>Urgencias se recomienda consultar la posibilidad de reemplazar los árboles grandes. se solicita capacitación en infraestructura y materiales su calidad.</u>	
<b>Compromisos:</b> (De conformidad con las recomendaciones realizar compromisos de seguimiento) <u>Capacitación en infraestructura y en calidad de materiales</u>	
¿Usted se encuentra muy satisfecho, satisfecho o insatisfecho con la respuesta emitida por la entidad? <u>Satisfecha</u>	

Nombre del funcionario: Sonathan Rojas Parid Hoyano.  
 Firma y número de cédula del Veedor(a): Nelly Saldarriaga  
21551478

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Sur E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

MI-SIG-SIG-FT-01 V4

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, GESTIÓN TERRITORIAL Y TRANSECTORIALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL CONTROL SOCIAL EN SALUD Código: SDS-GSS-LN-013 V.3	Elaborado por Ana María Cárdenas Revisado por Sandra Caycedo Aprobado por María Fernanda Torres P	
---	--	--	--

Anexo N° 2: MODELO PARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CONTROL SOCIAL EN SALUD

Nombre Veedor(a): Julia Cardenas  
 Objeto de Control Social: Obras Tunal  
 Fecha: 24 Oct 2022

Marque con una "X" según corresponda	
Espacio de Diálogo	
Seguimiento a compromisos	<input checked="" type="checkbox"/>
Evaluación a seguimientos	
Hallazgos: (En este espacio se reporta la encontrada ya sea positiva o negativa de acuerdo con su observación)	
<p>centro de salud. avances 47/100            Se iniciaron trabajos de mampostería            y enchapados</p>	
Recomendaciones: (Realizar de manera propositiva observaciones cuando la respuesta de la entidad no cubra la calidad del servicio)	
<p>en el centro de salud la adición            del aensor galla un piso porqu            los materiales vienen del extranjero</p>	
Compromisos: (De conformidad con las recomendaciones realizar compromisos de seguimiento)	
<p>las capacitaciones para conocer            la calidad de los materiales            y infraestructura</p>	
¿Usted se encuentra muy satisfecho, satisfecho o insatisfecho con la respuesta emitida por la entidad?	
<p>nos encontramos satisfecha            con la obra hasta el momento.</p>	

Nombre del funcionario: Yomaton Rojas y Farid Mayano  
 Firma y número de cédula del Veedor(a): Julia Cardenas  
49738238 20563713

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Sur E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

MI-SIG-SIG-FT-01 V4

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, GESTIÓN TERRITORIAL Y TRANSECTORIALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL CONTROL SOCIAL EN SALUD Código: SDS-GSS-LN-013 V 3	Elaborado por Ana María Cárdenas Revisado por Sandra Caycedo Aprobado por María Fernanda Torres P	
---	--	--	--

Anexo N° 2: MODELO PARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CONTROL SOCIAL EN SALUD

Nombre Veedor(a): Rosalba Gutierrez Julia Cardenas  
 Objeto de Control Social: Seguimiento obra de fusteria  
 Fecha: 24-10-2023

Marque con una "X" según corresponda	
Espacio de Diálogo	
Seguimiento a compromisos	X <u>Responde a la obra</u>
Evaluación a seguimientos	
Hallazgos: (En este espacio se reporta lo encontrado ya sea positivo o negativo, y se recomienda el espacio para el seguimiento)	
<p>Control de salud hay abarce de 41% paciente          se inicio trabajo de mamposteria y mela podo          del aserson. Falto el ultimo piso por que es impoible          47 quicias de molidora 73% paciente</p>	
Recomendaciones: (Realizar de manera propositiva observaciones, recomendar planes o sugerir a las entidades en cuenta lo establecido dentro del objeto de control social)	
<p>centro de salud la infraestructura de la Probeta y Adición y          Recomendaciones de medidas para el fusteria y mamposteria          pbrados</p>	
Compromisos: (De conformidad con las recomendaciones realizar compromisos de seguimiento)	
<p>carga citacion frente a la calidad de los materiales          y un imperal estructura</p>	
¿Usted se encuentra muy satisfecho, satisfecho o insatisfecho con la respuesta emitida por la entidad?	
<p><u>Satisfecho</u></p>	

Nombre del funcionario: Yonatan Rojas y Farid Moyano  
 Firma y número de cédula del Veedor(a): Julia Cardenas  
 CP. 41738238 20567211

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Sur E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

MI-SIG-SIG-FT-01 V4

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL GESTIÓN TERRITORIAL Y TRANSECTORIALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL CONTROL SOCIAL EN SALUD Código: SDS-GSS-LN-013 V.3	Elaborado por Ana María Cárdenas Revisado por Sandra Caycedo Aprobado por María Fernanda Torres P	
---	---	--	--

Anexo N° 2: MODELO PARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CONTROL SOCIAL EN SALUD

Nombre Veedor(a): Mariela Ardila  
 Objeto de Control Social: Obras Tumul  
 Fecha: 24-10-2022

Marque con una "X" según corresponda	
Espacio de Diálogo	
Seguimiento a compromisos	<input checked="" type="checkbox"/> Recorrido de Obras
Evaluación a seguimientos	
Hallazgos: (En este espacio se reporta lo encontrado, ya sea positivo o negativo, reportado en su observación)	
<p>Obras Centro de Salud: avance del 40.3%,          Trabajos de mampostería, Hidráulicos, Electricos          Escape, Pozo para ascensor          Hallazgos; Urgencias: avance demolición de 73%</p>	
Recomendaciones: (Realizar de manera propositiva las observaciones, recomendaciones o sugerencias teniendo en cuenta la capacidad de gestión de la entidad)	
<p>Obras Centro de Salud: Promover y adicionar          información para próximo reunión          Urgencias: Cuidado de los árboles. Capacitación en el tema de infraestructura y materiales</p>	
Compromisos: (De conformidad con las recomendaciones realizar compromisos de seguimiento)	
<p>capacitación en tema de infraestructura y conocimiento en materiales</p>	
¿Usted se encuentra muy satisfecho, satisfecho o insatisfecho con la respuesta emitida por la entidad?	
<p>satisfecho</p>	

Nombre del funcionario: Jonathan Rojas  
 Firma y número de cédula del Veedor(a): Mariela Ardila  
 cc: 41685678 Data

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.



Registro fotográfico recorrido área obra Centro de Salud Tunal





Registro fotográfico recorrido área obra Reorganización (antigua urgencias y consulta externa)

