



NOMBRE DE LA REUNIÓN: Reunión Veedores – Seguimiento al Convenio 1223 de 2017 CAPS Tunal y al Convenio 2806257 de 2021 Urgencias- Reordenamiento USS Tunal– SDS Subred Sur

RESPONSABLE: Jorge Mario González y María Elena Restrepo García

SECRETARIO: Notas x: Ana Milena Bayona Gómez

REUNIÓN N°: 06 – 2022

FECHA: 22 agosto 2022

HORA INICIO: 2:00 pm

LUGAR: Hospital El Tunal – Área de Obra Centro de Salud y Urgencias

HORA FINAL: 4:00 pm

1. OBJETIVO:

Realizar asistencia técnica en reunión de seguimiento de veeduría al Convenio 2806257 de 2021 de Adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal y Convenio 1223 de adecuación y dotación CAPS El Tunal – Fondo Financiero Distrital y Subred Sur. Se siguen las directrices nacionales y distritales derivadas por el regreso a la normalidad luego de culminar la emergencia por COVID – 19

2. PARTICIPANTES:

Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de "Listado de asistencia DI-DE-FT-07"

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	María del Carmen Peña	Veedora	asodeuhvh3@gmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial
2	Rosalba Gutiérrez	Veedora	asodeuhvh3@gmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial
3	María Ninfa Rodríguez	Veedora	ma.ninfarodriguez@gmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial
4	Edgar Loaiza	Veedor	libraescorpion1941@gmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial
5	Jorge Mario González	Arquitecto	jorgegonzalezsubredsur@gmail.com	Gestión Proyectos – Subred Sur	Presencial
6	Ana Milena Bayona Gómez	Profesional Universitario	participacion.tunjuelito@subredsur.gov.co	Of. Participación Comunitaria	Presencial

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)

1. Bienvenida y registro de asistencia
2. Seguimiento compromisos
3. Presentación avances convenios El Tunal – recorrido a la obra
4. Acuerdos y compromisos
5. Cierre de la reunión

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

Se verifica asistencia de ciudadanía, Arquitecto de Gestión de Proyectos y Profesional de Participación de la Subred Sur.



5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

1. Próxima reunión recorrido a la obra y articulación con arquitecto Subred, se aplazó de julio a agosto, por imprevistos con el transporte para veedores
2. Seguimiento a respuesta de oratorio
3. Envío de presentación y acta de la mesa de dialogo, se envió por correo electrónico.
4. Seguimientos veedores
5. Convocatoria recorrido de obras Centro de Salud y Urgencias El Tunal con veedores, la profesional de participación realiza gestión para garantizar vehículo y les solicita a los veedores confirmación de asistencia para el recorrido.

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

1. Bienvenida y registro de asistencia

Se realiza reunión presencial en la Unidad de Servicios El Tunal, teniendo en cuenta las directivas del gobierno nacional y distrital por el retorno a la normalidad luego de superar la emergencia por COVID – 19, siguiendo las indicaciones de uso de tapabocas y desinfección de manos. La Oficina de Participación de la Subred Sur gestionó el vehículo institucional para el traslado de los veedores. Se da inicio a la reunión para el seguimiento de avances de los Convenios 2806257 de 2020 y 1223 de 2017 SDS – Subred Sur, siendo las 2:10 pm iniciando la reunión con 04 veedores.

La bienvenida y apertura de la reunión la realiza la profesional de participación para Tunjuelito Ana Milena Bayona Gómez, dando contexto de las obras de Tunal y explicando el objetivo de la reunión.

3. **Presentación avances convenios de obras El Tunal**

Se recuerda a los asistentes que se tienen dos proyectos de obra en desarrollo en la USS El Tunal:


TUNJUELITO

CONTENIDO

- 1 Proyecto:
Adecuación y Dotación Centro de Salud El Tunal
- 2 Proyecto:
Adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal



Recorrido a la obra de Centro Salud Tunal



PROYECTO ADECUACIÓN Y DOTACIÓN CENTRO DE SALUD EL TUNAL

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

- Se continua con el reforzamiento estructural del proyecto.
- Se realizaron los ajustes arquitectónicos del proyecto.
- Iniciar de actividades de mampostería


El Arquitecto de Gestión de Proyectos Jorge Mario González, saluda a los asistentes y agradece el compromiso a participar en el recorrido, iniciando por el Centro de Salud El Tunal, informa que por motivos de seguridad los asistentes podrán hacer observación de la obra en el perímetro y no está permitido el ingreso al edificio, recordando que se hace seguimiento al convenio 1223 Adecuación y Dotación CAPS El Tunal en primer momento, recordando de manera general:

- El 15 de diciembre se firma de acta de inicio al contrato de interventoría y al contrato de obra, los cuales se encuentran en el momento en ejecución.
- Se entregó el predio a contratista de obra UT MO 2021, iniciando enero de 2022.
- Se hizo cerramiento con polisombras y señalización de inicio de obra por parte del contratista de obra aproximadamente en los primeros días de enero.
- Se realizó estudio del estado de la estructura del edificio, para determinar plan de demolición de fachadas, encontrando numerosas deficiencias en la estructura, por lo cual se usó tiempo de obra para reforzar.
- Se hace demolición de fachadas del edificio entre enero y junio, realizando además reforzamientos de zapatas al perímetro para la ampliación de los aleros, lo cual para el primer piso culmina en julio.
- Se tiene plan de ingreso y salida de vehículos pesados para ingreso de material y salida de escombros, se tienen certificados de la salida de los escombros para hacerle el respectivo seguimiento y hasta la fecha no se ha generado dificultades de movilidad.
- Concluyo la fundición de placa de primer piso, inicio de construcción de paredes para evitar las filtraciones en el perímetro del edificio.
- Se confirma por parte del arquitecto que las paredes externas se realizan con bloque y ladrillos y las paredes internas del edificio serán con estructura liviana.
- Se observa en el recorrido que se cuenta con los ductos de ascensores, estructura de escalera junto a los ascensores, lo cual es externo al edificio, explicando el arquitecto que se usaran vidrios en la escalera para permitir la iluminación de los pasillos.
- Se viene ampliando los aleros del perímetro del edificio, estando completo el segundo piso,



parcial en el tercer piso y no se tienen aún avances de alerones en el cuarto piso, dado que se viene esperando que fijen y compacten de manera segura.

- Se planea que por los reforzamientos de la estructura del edificio pueden llegarse a dar algunos retrasos, podría darse la opción de presentación de prórroga, pues quedan cuatro meses.

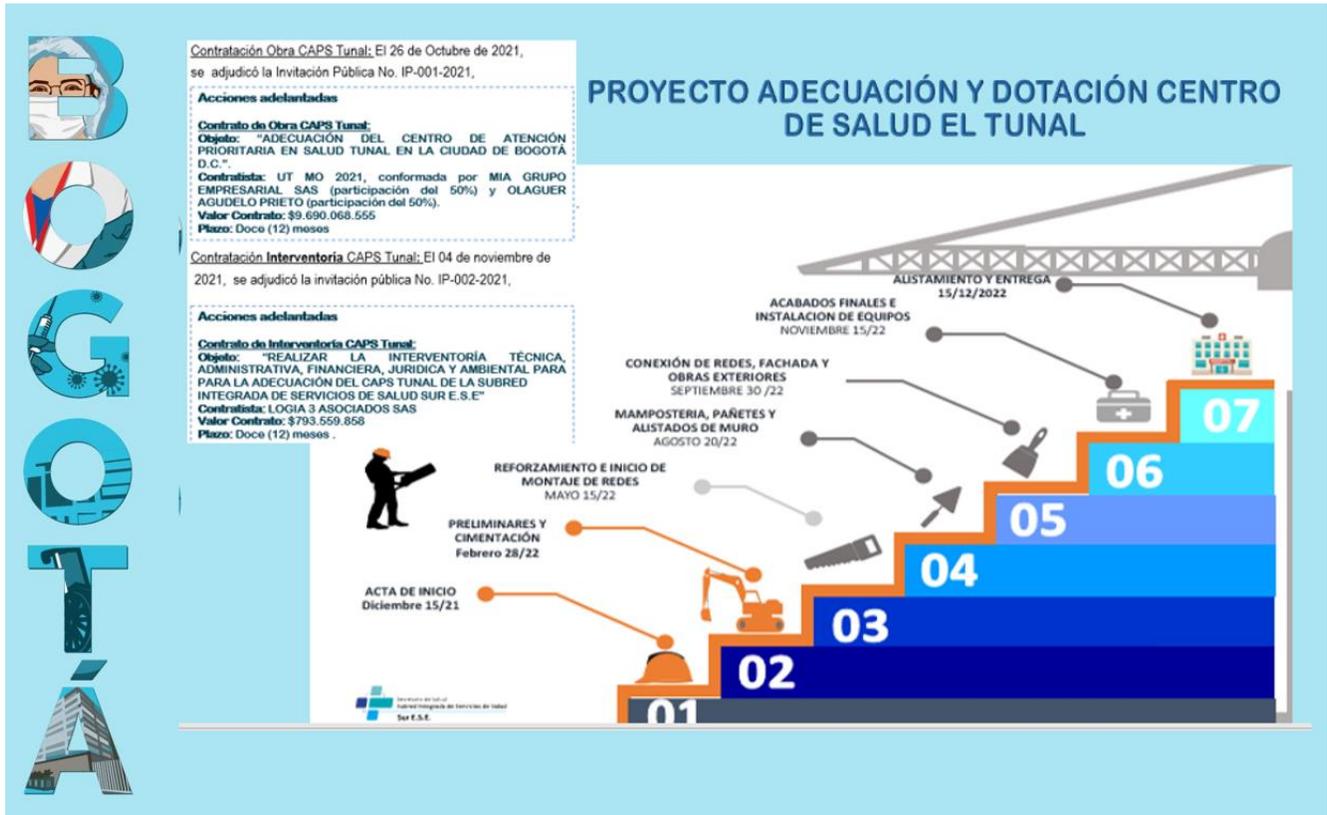

Los veedores hacen diferentes preguntas e intervenciones con respecto a: materiales, salida de escombros, posibilidades frente a que el edificio sea amigable con el medio ambiente con aprovechamiento de luz natural, posibilidad de instalación de paneles solares, uso de tanques para aprovechamiento de aguas lluvias, entre otros. Se hace la proyección de las puertas del centro de salud.





Centro de Salud Tunal

Adecuación y Dotación



REGISTRO FOTOGRAFICO



Centro de Salud Tunal

Adecuación y Dotación



REGISTRO FOTOGRAFICO



PROYECTO ADECUACIÓN Y DOTACIÓN CAPS TUNAL

CONTRATACIÓN COMPONENTE OBRA E INTERVENTORÍA DE OBRA

Contratación **Obra CAPS Tunal**: El 26 de Octubre de 2021, se adjudica la Invitación Pública No. IP-001-2021, al proponente **UT MO 2021**.

Acciones adelantadas

Contrato de Obra CAPS Tunal:

Objeto: "ADECUACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SALUD TUNAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

Contratista: UT MO 2021, conformada por MIA GRUPO EMPRESARIAL SAS (participación del 50%) y OLAGUER AGUDELO PRIETO (participación del 50%).

Valor Contrato: \$9.690.068.555

Plazo: Doce (12) meses

Contratación **Interventoría CAPS Tunal**: El 04 de noviembre de 2021, se adjudica la invitación pública No. IP-002-2021, al proponente **LOGIA 3 ASOCIADOS SAS**, por un plazo inicial de doce (12) meses.

Acciones adelantadas

Contrato de Interventoría CAPS Tunal:

Objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN DEL CAPS TUNAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E"

Contratista: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS

Valor Contrato: \$793.559.858

Plazo: Doce (12) meses .





Recorrido a la obra de urgencias El Tunal

Se trasladan los veedores, el arquitecto y la profesional de participación al área de la obra de urgencias, observando avances:

BOGOTÁ

PROYECTO ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL




Convenio: 2806257 -2021
Estado: Estudios y diseños-Obra
Entrega proyectada: Octubre 2023.
Contrato: Llave en Mano
 Firma del Contrato obra No. 5008 de 2022 y Contrato Interventoría No. 5009 de 2022 el 21/04/2022.
 Firma de Acta de inicio del Contrato obra No. 5008 de 2022 y Contrato Interventoría No. 5009 de 2022 el 20/05/2022.

VALOR PROYECTO

- Estudios y diseños faltantes: \$ 1.460.730.000
- Interventoría de estudios - diseños y obra: \$ 7.324.123.000
- Obra (edificio A): \$ 71.780.500.000
- Dotación Fase I: \$ 18.536.587.000
- TOTAL FASE I: \$ 99.101.940.000**

El Arquitecto de Gestión de Proyectos Jorge Mario González, explicando que el edificio de lo que se conocía como consulta externa, urgencias pediatría y urgencias adultos, lo cual está incluido en el Convenio 2806257 de 2021 de Adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal, recordando:

- El 20 de mayo se firmó acta de inicio al contrato de interventoría, al contrato de obra y acta de entrega del predio, los cuales inician ejecución con la fase de estudio del área, entrega de inventario, estudio para cerramiento del área y plan de contingencia de obra.
- Se adelantó el traslado transitorio y gradual de los servicios de consulta externa a las sedes de El Carmen, Abraham Lincoln, San Benito, Tunjuelito – Medicina Interna, Manuela Beltrán.
- Se realizó el cerramiento, señalización y estudio del estado de la estructura del edificio, para adelantar el plan de demolición, el cual ha culminado en el área de lo que se conocía como consulta externa.
- Se encuentra que inicia la demolición de lo que se conocía como urgencias de pediatría o respiratorias, además de establecer que no se ha entregado el área que se conoce de urgencias adultos.
- Se está terminando la adecuación de la estructura liviana a la entrada del edificio asistencial de la USS El Tunal para consultorios para atender la contingencia de urgencias, se realizó adecuación en el primer piso hospitalario para observación y hospitalización de urgencias.



PROYECTO ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL



RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN N° 385

Del 6 de abril de 2022, por medio de la cual se adjudica el proceso de selección por Convocatoria Abierta N° CA-001-2021, con objeto: "Elaboración, actualización y ajuste a los estudios y diseños y adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento, dotación y alistamiento de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de salud El Tunal".

- Adjudicado a: Consorcio Tunal 2022
- Integrantes: C&C ARQUITECTURA E INGENIERIA SA EN REORGANIZACIÓN (50%), ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS SAS (45%) y YELSIN EMILSON REINOSO PEREZ (5%)
- Representante Legal: Carlos Andres Naranjo Duarte
- Valor Adjudicado: \$89.323.181.304
- Plazo: 20 Meses



RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN N° 386

Del 6 de abril de 2022, por medio de la cual se adjudica el proceso de selección por Convocatoria Meritoria N° CM-004-2021, con objeto: "Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental para la Elaboración, actualización y ajuste a los estudios y diseños y adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento, dotación y alistamiento de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de salud El Tunal"

- Adjudicado a: Consorcio Tunal Salud Futura
- Integrantes: PLANHO CONSULTORES SLP CIF SAS (30%) y Taller de Arquitectura Sanchez Horneros SLP sucursal Colombia(70%)
- Representante Legal: Luis Sanchez Horneros Viver-Sanchez
- Valor Adjudicado: \$7.214.261.155
- Plazo: 20 Meses



PLAN DE CONTINGENCIA





ACTIVIDADES	2021			2022										2023										
	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	
ETAPA PRE-CONTRACTUAL (Llave en mano e interventoría)																								
CONTRATACION (Llave en mano e interventoría)					★																			
DEMOLICIÓN URGENCIAS Y C.E						★																		
DISEÑOS PISOS 3,4,5																								
CONSTRUCCIÓN SOTANO, PISO 1 Y 2																								
LICENCIA CONSTRUCCIÓN MODIFICADA																								
CONSTRUCCIÓN PISO 3, 4 y 5																								

- ★ Se inicia la demolición del área donde actualmente se presta el servicio de consulta externa.
- La demolición y construcción del sótano, 1° y 2° piso se inicia con la licencia de construcción que se encuentra vigente




LOCALIZACIÓN DE LAS ADECUACIONES

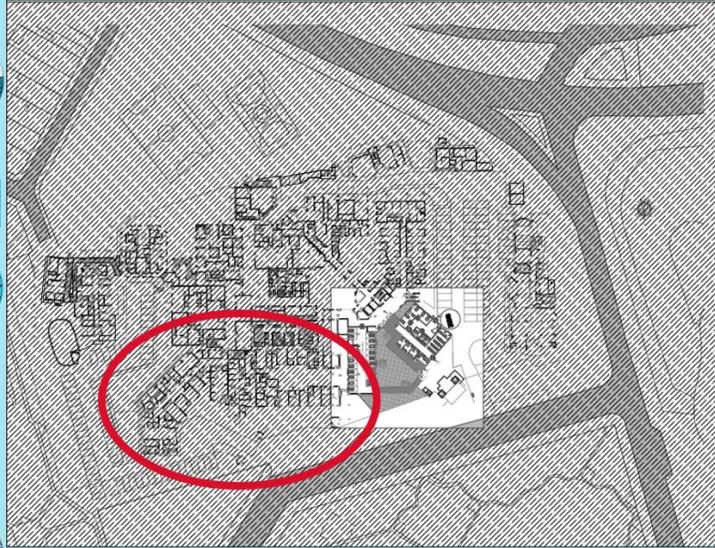

 Construcción Torre
Urgencias-Reordenamiento

 Plan de contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA





- 
- PLAN DE CONTINGENCIA URGENCIAS**
- Reubicación transitoria del servicio de Urgencias en 3 espacios diferentes lo cual dará respuesta a la demanda, según histórico en el año 2021, sin presentarse traumatismos en el mismo.
 - Se contará con un flujograma de atención diferencial al paciente que ingrese al servicio de urgencias, dado que permitirá disminuir los riesgos de complicación de los pacientes clasificados como Triage 1 o 2, puesto que, se contarán con espacios especiales para la ubicación y monitorización de los mismos de manera inmediata.
 - Se contará con una zona para paciente respiratorio, lo cual no permitirá el cruce de infecciones y/o virus entre los pacientes no respiratorios.
 - Se mantendrá la capacidad instalada de 3 consultorios durante el plan de contingencia, lo cual permitirá dar respuesta a la demanda, sin presentarse retrasos en la atención inicial.
 - En relación a la atención del paciente clasificado como Triage 3, se contará con un área de tránsito rápido.

Se da espacio para la intervención de los veedores, destacandose de manera general los temas:

- Aclaración de cronograma de entrega de obras, preguntan si hay retrasos en el mismo
- Explicación de distribución del área de urgencias en el edificio hospitalario
- Estado de la obra y contratiempos que han presentado
- Solicitan información sobre plan de escavación y salida de escombros.
- Planeación para que la construcción no afecte la prestación de los servicios en urgencias.
- Manejo de ruido y polvo en el Tunal y área circunvecina .

El arquitecto responde las inquietudes de los ciudadanos y se hace cierre de la actividad.



Acuerdos y compromisos

- Enviar acta del recorrido para soportar la mesa de dialogo.
- Se proyecta próxima reunión de seguimiento a la gestión para el 21 de septiembre a las 10 am, ofreciéndose opción de virtual por aplicación meet y presencial en oficina de participación El Carmen.
- Los veedores enviaran copia de los seguimientos.

4. Cierre reunión

Cierra la reunión siendo las 4:00 pm, realizando traslado del ciudadano en vehículo institucional a los puntos iniciales. Se proyecta próxima reunión el 21 de septiembre a las 10 am.

Para la reunión se seguirán las indicaciones y directrices del gobierno nacional y distrital derivadas del plan de retorno a la normalidad.

Se adjuntan lista de asistencia y registro fotográfico.



7. COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha limite dd-mm-- aa)	QUIEN (Responsable)
Envío acta reunión	Envío por correo electrónico	31 agosto 2022	Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
Seguimientos veedores	Envío por correo electrónico o aplicación Whatsapp	31 agosto 2022	Veedores
Convocatoria reunión seguimiento de veedores	Socialización de avances del desarrollo de los convenios. Se realizará recordatorio telefónicamente y por aplicación whatsapp Subred Sur	19 de septiembre 2022	Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano Subred Sur Veedores

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

MARIA ELENA RESTREPO Y JORGE MARIO GONZALEZ

SECRETARIO REUNIÓN

ANA MILENA BAYONA GÓMEZ



LISTA ASISTENCIA REUNIÓN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD -
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO

GSA-ATU-FR-05 V1

No	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	TELÉFONO FIJO O CELULAR	CORREO	FECHA	HORA DE INICIO	HORA TERMINACIÓN	TEMA PRINCIPAL	FIRMA
							22-08-2022	02:00 pm	04:00 pm	Recorrido de obras Cercho Salud y Urgencias Tunal.	
1	Jorge Mena	1018163051	Subredsur	—	3157722378	jorge.mena@subredsur.gov.co					
2	Edgar J. Jarama	171052759	Medicina Comunitaria	Seis	3138078182	edgar.jarama@gmail.com					
3	María Mercedes Rodríguez	111159616	Medicina Comunitaria	6	320368796	maria.mercedes.rodriguez@gmail.com					
4	Carmen Peres	4158324581	Uredaria obras Tunal	6	3123127753						
5	Ana Milena Gómez	52a00295	Subred Sur Of. PC y SC	Sexto	3118193509	participacion.tungalita@subredsur.gov.co					
6	Rosario Gutiérrez	309863719	Medicina Comunitaria	18 C.B.	312582258						
7											
8											



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

MI-SIG-SIG-FT-01 V4

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL GESTIÓN TERRITORIAL Y TRANSECTORIALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL CONTROL SOCIAL EN SALUD Código SDS-GSS-LN-013 V.3	Elaborado por: Ana María Cárdenas Revisado por: Sandra Caycedo Aprobado por: María Fernanda Torres P.	
---	--	--	--


Anexo N° 2: MODELO PARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CONTROL SOCIAL EN SALUD

Nombre Veedor(a): Rosalia Gutierrez
 Objeto de Control Social: Verificación Obra Funeraria
 Fecha: 22-08-2022

Marque con una "X" según corresponda	
Espacio de Diálogo	
Seguimiento a compromisos	<input checked="" type="checkbox"/> <u>Recorrido a la obra</u>
Evaluación a seguimientos	
Hallazgos: (En este espacio se reporta lo encontrado ya sea positivo o negativo de acuerdo a lo observado)	
<u>Centro de salud Abasco con 26 personas y la cuenta ya está por entregar para finalizar la de acciones de medicina preventiva</u>	
Recomendaciones: (Realizar de manera propositiva observaciones, recomendaciones o sugerencias teniendo en cuenta lo establecido dentro del objeto de control social)	
<u>si se opusiera la pregunta se recomienda una tiempo no tan largo</u>	
Compromisos: (De conformidad con las recomendaciones realizar compromisos de seguimiento)	
<u>seguimiento a lo posible prologa de los avances de la obra</u>	
¿Usted se encuentra muy satisfecho, satisfecho o insatisfecho con la respuesta emitida por la entidad?	
<u>si estoy satisfecho del avance de la obra</u>	

Nombre del funcionario: José Mario Rodríguez
 Firma y número de cédula del Veedor(a): [Firma] 20.563.70

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.



Anexo N° 2 MODELO PARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CONTROL SOCIAL EN SALUD

Nombre Veedor(a): Carmen Peña
Objeto de Control Social: Acción de obras final
Fecha: 22 08 2022

Marque con una "X" según corresponda

Espacio de Diálogo	
Seguimiento a compromisos	X <u>se realizó obra</u>
Evaluación a seguimientos	
Hallazgos:	<u>El centro de salud está avanzada la obra 27% ya mejoraron las obras de saneamiento. Se evidencian 30% de urgencias ya este avance con el traslado de demarcación</u>
Recomendaciones:	<u>Finalizar de manera oportuna la obra de saneamiento y urgencias. Se debe de establecer dentro del objeto de control social la posibilidad de que haya una promoción si la obra es factible la obra se le va a unir con la estructura y vigas, urgencias y obra de saneamiento. Se debe de tener en cuenta el espacio de oficina no debe ser concesionado</u>
Compromisos:	<u>Para la próxima reunión y hacer seguimiento de la posible ejecución de los avances de la obra.</u>
¿Usted se encuentra muy satisfecho, satisfecho o insatisfecho con la respuesta emitida por la entidad?	
<u>quede contenta y satisfecha de la obra y se está avanzando y bien explicado.</u>	

Nombre del funcionario: Arquitecto Jorge María Rodríguez
Firma y número de cédula del Veedor(a): Carman Peña
CI. 415.5324 C.E.

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta correspondencia a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, GESTIÓN TERRITORIAL Y TRANSECTORIALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL CONTROL SOCIAL EN SALUD Código: SDS-GSS-LN-013 V.3	Elaborado por Ana María Cárdenas Revisado por Sandra Caycedo Aprobado por María Fernanda Torres P.	
--	---	--	--

Anexo N° 2: MODELO PARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CONTROL SOCIAL EN SALUD

Nombre Veedor(a): Edgar Iván Arate
 Objeto de Control Social: Veeduría sobre Fumal
 Fecha: Agosto 22 - 2022

Marque con una "X" según corresponda	
Espacio de Diálogo	
Seguimiento a compromisos	X Seguimiento a la obra.
Evaluación a seguimientos	
Hallazgos:	Encuentro cumplimiento de plan de entrega, según contrato, con un 27% cumplido según lo pactado. Obras proyectadas con déficit según construcciones y realizaciones.
Recomendaciones:	Ante presentación de imprevistos, lo cual es normal en obras de esta emergencia, recomendar prosiga en tiempo ante la imposibilidad de la entrega dentro de los plazos y fechas estipuladas.
Compromisos:	De conformidad con las recomendaciones, para los veedores hacer el seguimiento de rigor a todas las obras en construcción.
¿Usted se encuentra muy satisfecho, satisfecho o insatisfecho con la respuesta emitida por la entidad?	
Satisfecho.	

Nombre del funcionario: Arquitecto Jorge Mario Rodríguez
 Firma y número de cédula del Veedor(a): [Firma]
0419052750

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA, no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, GESTIÓN TERRITORIAL Y TRANSECTORIALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL CONTROL SOCIAL EN SALUD Código: SDS-GSS-LN-013 V.3	Elaborado por Ana Maria Cárdenas Revisado por Sandra Caycedo Aprobado por María Fernanda Torres P	
---	--	--	--

Anexo N° 2: MODELO PARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CONTROL SOCIAL EN SALUD

Nombre Veedor(a): Yan Nairo Rodríguez
 Objeto de Control Social: Veeduría Obra Pausa
 Fecha: 22 de Julio 2022

Marque con una "X" según corresponda	
Espacio de Diálogo	<input checked="" type="checkbox"/>
Seguimiento a compromisos	<input checked="" type="checkbox"/>
Evaluación a seguimientos	<input checked="" type="checkbox"/>
Hallazgos:	la obra se ve en fase de construcción. Asumiendo la obra va en un 77% total.
Recomendaciones:	que haya posibilidad de proeza y que se presenten sorpresa en las columnas.
Compromisos:	Demolicion B de edificio urgente en un 30%, la preocupación la congestión para el ingreso de ambulancias.
¿Usted se encuentra muy satisfecho, satisfecho o insatisfecho con la respuesta emitida por la entidad?	
El Arquitecto fue claro en su explicación de la obra prestando atención a resolver las inquietudes.	

Nombre del funcionario: Dr. Jorge Mario R.
 Firma y número de cédula del Veedor(a): Yan Nairo Rodríguez
CC 41439616

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.



Recorrido a obra Centro de Salud Tunal



Recorrido obra urgencias Tunal
