CONTRATO IDU 1650 - 2019

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y CICLORRUTAS EN EL CORREDOR AMBIENTAL LOCALIZADO EN EL CANAL CÓRDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 170 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

13vo. COMITÉ IDU

ORDEN DEL DÍA

- 1 Recomendaciones
- 2 Verificación de compromisos 12vo. Comité IDU
- Objetivos de la Reunión
- Trazabilidad Contractual
 - Personal Contractual
 - Avance cronograma general de obra
 - Presupuesto general
 - Detalle de presupuesto total
- 5 Avance de obra
 - Técnico
 - Ambiental
 - SST
 - Social
- Inquietudes y aportes de la comunidad finalizando cada área.



1 RECOMENDACIONES



Mantener el silencio, respetando el orden de la reunión y la palabra de quien este socializando.



Diligenciar el formato de asistencia que se pasará en físico por parte del equipo social.



Permitir grabar la reunión como soporte de la actividad; puede solicitarla al finalizar la reunión o a través de los canales de atención a la ciudadanía del contrato.



Las inquietudes, preguntas y aportes de la comunidad serán ordenadas y enumeradas para ser respondidas al final de la reunión.



Las intervenciones de los participantes deben ser concisas para cumplir con la duración de la reunión (2 horas).

Dar cumplimiento a las recomendaciones anteriores permitirán un diálogo ciudadano constante entre el Proyecto, el Comité IDU y la Veeduría Ciudadana Canal Córdoba.



Nota: Es fundamental para el desarrollo de la reunión hacer las intervenciones en el marco del respeto, si se evidencian faltas en este sentido, se podría dar por terminada la sesión.

COMPROMISOS 12vo COMITÉ IDU

No.	COMPROMISO	GESTIÓN	ESTADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	Remitir acta del 12vo comité IDU avalada por las partes, a los asistentes que proporcionaron sus datos.	Pendiente remisión, puesto que se encuentra en revisión del IDU	Pendiente	Noviembre de 2023
2	Verificación acciones de mejora de PM7 y auxiliar de tráfico en la calle 134 (cambio de polisombra)	Se realizó adecuación, retirando la polisombra e instalando cinta de peligro con colombinas de señalización mejorando la visibilidad. Además, se realizó retroalimentación con controladora vial.	Cerrado	30/10/2023
3	Desde el área forestal se deberá socializar la nueva compensación solicitada a la SDA para los individuos arbóreos conceptuados para traslado, que no sobrevivieron, (solicitud de la veeduría y la comunidad), frente a que sean compensados por árboles y no por valor económico.	Se realizarán las gestiones pertinentes al terminar los traslados, para saber con certeza la cantidad de individuos arbóreos que no sobrevivieron a esta actividad. Teniendo en cuenta que la compensación es de 5 a 8 por cada árbol.	Pendiente	Por determinar



COMPROMISOS 12vo COMITÉ IDU

No	COMPROMISO	GESTIÓN	ESTADO	FECHA DE CUMPLIMIENT O
4.	La veeduría, solicita al área forestal contemplar para la solicitud de nueva compensación de los individuos arbóreos conceptuados para traslado (que no sobrevivieron), la zona verde ubicada desde la calle 138 y 137 (Jarillón) y desde la 135 y 134 (donde se construyó el muro de contención).	Están en proceso de verificación los puntos a lo largo del corredor donde se podrían ubicar los individuos arbóreos para la nueva compensación. Con el fin de priorizar la compensación con árboles sobre la compensación monetaria.	En proceso	Por determinar
5.	Una vez el IDU remita los diseños de sector 1, entre la calle 129B y 131, los cuales deben contar con las aprobaciones de terceras entidades, estén apropiados por el contratista y cuenten con aval de interventoría, iniciar gestiones con la veeduría y comunidad del sector 1 para la realización de una reunión extraordinaria (coordinación entre las partes IDU-Interventoría y Contratista).	Pendiente remisión de diseños del sector 1. para programar la reunión extraordinaria con el fin de socializarlos con la comunidad	Pendiente	Por determinar

3 OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

- Promover espacios de participación para la comunidad y líderes sociales, mediante este Comité IDU
- Dar a conocer a la comunidad los avances de la etapa de obra para la infraestructura peatonal y ciclorrutas en el corredor ambiental localizado en el Canal Córdoba.
- Atender inquietudes de los asistentes.



4 TRAZABILIDAD CONTRACTUAL

PERSONAL CONTRACTUAL

Equipo Coordinador del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

CARGO	ETAPA DE OBRA	
CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	
Apoyo a la Supervisión de la Subdirección técnica de ejecución del subsistema vial DTC	Ing. Yajaira Judith Combariza (Etapa Constructiva)	
Profesionales de Apoyo a la supervisión Ambiental y SST	Ing. Ambiental César Cárdenas Ing. Forestal Alexander Castilla. Ing. Angélica Viviana Celis Rodríguez (SST)	
Profesional de Apoyo a la supervisión Fauna	Bióloga Adriana Patiño Núñez	
Profesional de Apoyo a la supervisión Social	ADE. Tatiana Castaño	

4 TRAZABILIDAD CONTRACTUAL

PERSONAL CONTRACTUAL

Identificación de Interventoría del proyecto

CONTRATO IDU-1652 DE 2019 CONSORCIO SAN RAFAEL	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y CICLORRUTAS EN EL CORREDOR AMBIENTAL LOCALIZADO EN EL CANAL CÓRDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 170 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C
	ETAPA DE OBRA
CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
Director de la interventoría	Arq. Wilson Andrade Rojas
Coordinadora de la interventoría	Ing. María Andrea Reyes
Especialista en Presupuestos de la interventoría	Ing. Juan Camilo Varela
Residente Ambiental de la interventoría	Ing. Mauricio Turriago Hoyos
Profesional Forestal	Ing. Leidy Acosta
Biólogo	Ing. Gina Alejandra Romero
Residente SST de la interventoría	Ing. Mariutcy Ramírez Ramírez
Residente Social de la interventoría	T.S. Jenny Andrea Verano Sepúlveda



4 TRAZABILIDAD CONTRACTUAL

PERSONAL CONTRACTUAL

Identificación de Contratista del proyecto

CONTRATO IDU-1650 DE 2019 CONSORCIO CANAL CÓRDOBA	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y CICLORRUTAS EN EL CORREDOR AMBIENTAL LOCALIZADO EN EL CANAL CÓRDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 170 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. ETAPA DE OBRA
CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
Director del contratista	Ing. Flavio Alejandro Araujo
Coordinadora del contratista	Arq. Lina Plazas
Especialista en Presupuestos	Arq. Liliana Leal
Residentes de Obra	Ing. Julio César Bogotá Ing. William Gerardo Barahona Ing. Leonardo Galarcio
Residente Ambiental del contratista	Ing. Néstor Yesid Hernández Piraquive
Profesional Forestal	Ing. Oscar David Ruenes Sánchez
Biólogo	Ing. Angie Paola Gallo Mahecha
Residente SST del contratista	Ing. Angie Katherine Fonseca
Residente Social del contratista	T.S. Luz Adriana Morales



AVANCE CRONOGRAMA GENERALPORCENTAJE EJECUTADO – PROGRAMADO



- La demora en la aprobación de los Diseños de Redes Hidrosanitarios genero retrasos en la ejecución de la obra.
- El sector suspendido entre la calle 129b a la calle 131b presenta atrasos, sobre los cuales el contratista no puede intervenir.
- En este momento nos encontramos en la solicitud de una prórroga para extender la duración del contrato

Datos al 13 de

Noviembre 2023

PRESUPUESTO GENERAL

CONTRATO IDU-1650-2019

VALOR OBRAS INCLUYE A.I.U.	\$ 98,716,605,904.00
Costos Actividades Ambientales	\$ 2,661,580,054.00
Costo diálogo ciudadano y comunicación estratégica	\$ 1,298,224,455.00
Costo Plan de Manejo de Tráfico	\$ 772,991,508.00
Ajuste por cambio de vigencia	\$ 10,220,757,237.00
SUBTOTAL OBRAS	\$ 113,670,159,158.00
Valor a monto agotable para ensayos de laboratorio	\$ 21,196,649.00
Costos de compensaciones, evaluación y seguimiento SDA	\$ 491,794,219.00
Apéndice de Bioseguridad	\$ 31,377,002.00
Amigable Componedor	\$ 150,000,000.00
VALOR TOTAL OBRAS	\$ 114,364,527,028.00
VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 3,777,200,197.00
VALOR TOTAL PROYECTO	\$ 118,141,727,225.00

DETALLE DE PRESUPUESTO TOTAL PAGADO AVANCE DE OBRA

SECTOR	COSTO TOTAL OBRA	VALOR FACTURADO A OCTUBRE 2023	% DE AVANCE
SECTOR 1 OCCIDENTAL (Calle 129 - Calle 134)	\$ 8,736,738,423	\$ 2,907,797,807.00	33.28%
SECTOR 1 ORIENTAL (Calle 129 - Calle 134)	\$ 205,094,029	\$ 11,373,959.00	5.55%
SECTOR 2 OCCIDENTAL (Calle 134 - Calle 138)	\$ 7,056,295,126	\$ 1,168,742,646.00	16.56%
SECTOR 2 ORIENTAL (Calle 134 - Calle 138)	\$ 525,476,832	\$ 4,407,830.00	0.84%
SECTOR 3 OCCIDENTAL (Calle 138 - Calle 145A)	\$ 11,046,681,326	\$ 4,450,491,879.00	40.29%
SECTOR 3 ORIENTAL (Calle 138 - Calle 145A)	\$ 287,482,024	\$ 29,593,915.00	10.29%
SECTOR 4 OCCIDENTAL (Calle 145A - Calle 149)	\$ 4,759,071,193	\$ 1,684,547,731.00	35.40%
SECTOR 4 ORIENTAL (Calle 145A - Calle 149)	\$ 6,296,478,921	\$ 18,287,391.00	0.29%



(*) Datos según última acta cobrada Octubre 31 2023

DETALLE DE PRESUPUESTO TOTAL PAGADO AVANCE DE OBRA

SECTOR	COSTO TOTAL OBRA	VALOR FACTURADO A OCTUBRE 2023	% DE AVANCE
SECTOR 5 OCCIDENTAL (Calle 149- Calle 152)	\$ 6,945,044,126	\$ 4,444,871,070.00	64.00%
SECTOR 5 ORIENTAL (Calle 149 - Calle 152)	\$ 7,201,893,976	\$ 185,625,726.00	2.58%
SECTOR 6 OCCIDENTAL (Calle 152 - Calle 153)	\$ 4,034,113,904	\$ 877,404,397.00	21.75%
SECTOR 6 ORIENTAL (Calle 152 - Calle 153)	\$ 5,228,374,903	\$ 658,765,964.00	12.60%
SECTOR 7 OCCIDENTAL (Calle 153 - Calle 163B)	\$ 19,462,700,407	\$ 9,427,982,567.00	48.44%
SECTOR 8 OCCIDENTAL (Calle 165B- Calle 163B)	\$ 8,079,218,310	\$ 3,733,575,172.00	46.21%
SECTOR 8 ORIENTAL (Calle 163B - Calle 168A)	\$ 5,099,223,784	\$ 3,300,000.00	0.06%
SECTOR 9 OCCIDENTAL (Calle 168A - Calle 170)	\$ 2,746,544,229	\$ 1,641,958,328.81	59.78%
SECTOR 9 ORIENTAL (Calle 167 - Calle 168A)	\$ 1,006,174,387		0.00%
VALOR TOTAL DE OBRAS (COSTO DIRECTO)	\$ 76,052,855,017	\$ 32,513,910,908.00	42.75%

(*) Datos según última acta cobrada Octubre 31 2023



AVANCE DE OBRA COMPONENTE TÉCNICO



SECTOR 1.

Entre calles 129 y 134



ESPACIO PÚBLICO

Se realizaron actividades para la construcción del espacio público sobre la calle 129 entre carreras 54 y costado norte.



REDES

Pilotaje para dado cimiento occidental de la cercha de la calle 134.



ESTRUCTURAS

Izaje del puente bicipeatonal de la calle 130.



REDES

Construcción sumideros de la red pluvial sobre la carrera 54 entre las calles 131 B y 134 costado occidental.

SECTOR 2.

Entre calles 134 y 138



ESTRUCTURAS

Construcción de dado de concreto para cercha de la red de la ESP Enel Codensa en la calle 137 con carrera 54 costado occidental.



ESPACIO PÚBLICO

Construcción del espacio público estructura de andén en la calle 135 B con carrera 54 costado Sur-occidental.



CALZADA

Conformación y mejoramiento de la calzada.




REDES

Se realizó excavación manual y mecánica, construcción de la infraestructura de redes.

SECTOR 3.

Entre calles 138 y 145A

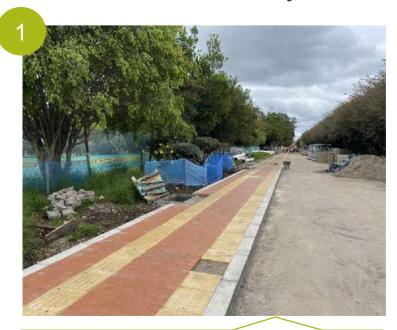

ESPACIO PÚBLICO

Instalación de adoquín de arcilla y tabletas alerta sobre espacio público estructura de andén entre las calles 143A y 138 con carrera 54.



REDES

Construcción sumidero en vía de la red pluvial.



ESPACIO PÚBLICO

Modulación con bordillo A80 sobre la estructura de espacio público entre las calles 145A y 145C con carrera 54 costado occidental.

SECTOR 4.

Entre calles 145A y 149



REDES

Instalación de redes de alcantarillado sanitario y acueducto en el sector occidental.



MUROS DE CONTENCIÓN

Micropilotaje para estructura de soporte del puente peatonal calle 146A.



MUROS DE CONTENCIÓN Construcción de filtros de drenaje, para muro de

contención.



ESPACIO PÚBLICO
Construcción de red de
Codensa para alumbrado
público y construcción de filtro
de drenaje.

SECTOR 5.

Entre calles 149 y 152



ESPACIO PÚBLICOConformación de andenes.



ESPACIO PÚBLICO

Conformación de senderos peatonales.



REDES

Construcción de pozos para alcantarillado pluvial.



CALZADA

Conformación de vía,
instalación de capas asfálticas
entre calles 149 y 150 costado
oriental.

SECTOR 6.

Entre calles 152 y 153



REDES

Renivelación de pozos de alcantarillado pluvial entre calles 152A y 153 costado occidental.



REDES

Construcción de sumideros entre calles 152 y 153 costado occidental.



ESPACIO PÚBLICO

Construcción de anden costado oriental entre calles 152 y 153.



ESPACIO PÚBLICO

Construcción de anden costado oriental entre calles 152 y 153.

SECTOR 7.

Entre calles 153 y 163B



ESPACIO PÚBLICO

Construcción de andenes – remates generales y accesos vehiculares entre calle 153 y 161



REDES

Nivelación de cámaras ETB entre calles 159 y 161



MUROS DE CONTENCIÓN

Descargue de láminas de acero, Alistado de pista y fresado de estructura, descapote para instalación de láminas en acero y Armado de grúa para la instalación de tablestacado.

SECTOR 8.

Entre calles163B y 168A



REDES

Instalación de tubería de alcantarillado (costado oriental) e instalación de red sanitaria costado occidental.



CALZADA

Fresado para alistado de pista para asfalto y sereo para estructura de vía.



PUENTES

Pilotaje costado occidental para puente bicipeatonal en la calle 167.



MUROS DE CONTENCIÓN

Construcción de muro superficial S28 + filtro + rellenos.



ESPACIO PÚBLICO Conformación

Conformación rellenos de colector pluvial.

SECTOR 9. Entre calles 168A y 170



CALZADA Instalación estructura de vía entre la calle 168A y 170



CALZADA Y REDES

Excavación para estructura de vía y red de tubería pluvial en la calle 168A



CALZADA
Instalación de estabilización con rajón en estructura de vía en la calle 168A

AVANCE COMPONENTE TÉCNICO INQUIETUDES Y PREGUNTAS DE LA COMUNIDAD



5

AVANCE DE OBRA COMPONENTE AMBIENTAL





Para el desarrollo del proyecto, se debe:

- Implementar las medidas del Manual Ambiental de Obra MAO encaminadas a evitar, prevenir, controlar, minimizar, mitigar y/o compensar los impactos hacia el ambiente.
- Garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente.

Manejo Ambiental de Obra – MAO Estructura

Cumplimiento obligaciones **Ambientales** y SST B Manejo Ambiental en la ejecución de Programa de actividades Señalización constructivas de seguridad **MAO** Manejo de Gestión en Seguridad vegetación y Salud en el Trabajo **Paisajismo**

A-CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES

PERMISOS Y/O TRÁMITES			
Permiso de Ocupación de Cauce - POC	Canal Pasadena: Permiso permanente otorgado con Resolución No. 04756 de diciembre del 2021 por un término de 24 meses (06 de diciembre 2023). Canal Córdoba: Permiso permanente y temporal otorgado con Resolución No. 00742 de Marzo del 2022 por un término de 24 meses (25 de marzo 2024).		
Permiso Tratamiento Silvicultural (tala, traslado y poda del arbolado urbano).	Permiso otorgado con Resolución No. 04186 de noviembre de 2021 por un término de 2 años (09 de noviembre 2023).		
Diseño paisajístico y zonas verdes.	Acta de aprobación WR 1163-2021 del 02 de agosto de 2021 del Jardín Botánico de Bogotá - JBB y la Secretaria Distrital de Ambiente – SDA.		
Permiso Trabajo Nocturno:	La Alcaldía Local de Suba mediante radicado 20236130264361 del 17/febrero/2023 otorga el permiso hasta el 01 de abril de 2024.		
Registro de elementos de publicidad exterior visual.	Valla de Obra Convencional con REGISTRO No. 02148 proferido el 02 de diciembre de 2021.		
Obtención PIN Ambiental.	Se estructuró Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición – PG-RCD en cumplimento de las Res 01115 de 2012 y 00932 de 2015. PIN 20881.		

COMPONENTE B1 – MANEJO AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES Y CENTROS DE ACOPIO

El proyecto cuenta con un campamento fijo principal y campamentos en obra móviles para el uso del personal.





COMPONENTE B2 – MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Consolidado de material adquirido

Etapa de Construcción (Mes)	Periodo	Cantidad m3
19	oct-23	5.088,83
	TOTAL	39.066,33



SITIO DE ADQUISICIÓN

INCOMINERIA- SAP AGREGADOS -ICEIN- AGREGADOS DE ORIENTE-ARENA Y AGREGADOS IVONESAS-HOLCIM, CEMEX, RECICLADOS **INDUSTRIALES**



COMPONENTE B2 - MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Seguimiento y Consolidado del Material Reutilizado y Reciclado

PG-RCD PIN: 20881

Resolución 1257 de 2021

Mes,	Comprado reciclado (m3)	Reutilizado proveniente de obra (m3)	Volumen (m3)
oct-23	714,76	138,64	853,40
Total	2.342,08	1.118,13	3.460,21



Demolición Sardinel



Mezcla de fresado con material

B3 – MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Tanto la oficina del Consorcio Canal Córdoba M.I. como en los frentes de obra se cuenta con puntos ecológicos para la adecuada disposición y clasificación de los residuos sólidos generados.







Puntos ecológicos de acuerdo al código de colores del MADS – Res 2184/2019

AVANCE COMPONENTE AMBIENTAL B3 – MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Consolidado de RCD generado en obra

Etapa de Construcción (Mes)	Periodo	Cantidad m3
19	oct-23	5.004,50
	TOTAL	46.029,495

TIPO DE RCD GENERADO	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL
Residuos provenientes de excavación, Fresado, lodos y residuos vegetales.	MINERSA, LAMD, R Y R, CEMEX, RECICLADOS INDUSTRIALES, EKO BOJACA SAS, UNICONIC y PATIO DEL IDU



Cargue RCD en el sector 8

B-4 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Disminuir la generación de emisiones atmosféricas (gases y material particulado), por fuentes móviles en los frentes de obra objeto del contrato, al igual que la

generación de ruido



Limpieza de llantas de volquetas a la salida del frente de obra en el sector



Limpieza de vías de acceso y salida de volquetas en el sector 7



Protección de materiales en el sector 8

B5 MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA Y SUMIDEROS

Se basa en la formulación de medidas de control para el manejo de aguas superficiales y/o redes de alcantarillado que pueden verse afectadas por la construcción de las obras, igualmente se busca disponer y controlar en forma adecuada el combustible, sustancias químicas y residuos

líquidos resultantes de las diferentes actividades de obra.







Limpieza y Mantenimiento de sumideros presentes en los sectores de obra

AVANCE COMPONENTE AMBIENTAL INQUIETUDES Y PREGUNTAS DE LA COMUNIDAD





AVANCE ACTIVIDADES SILVICULTURALES



TRATAMIENTOS SILVICULTURALES AUTORIZADOS POR LA SDA



SECRETARÍA DE **AMBIENTE**

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

Folios 385 Anexos: 0

roc.# 5252766 Radicado # 2021EE243167 Fecha: 2021-11-09
ercero: 89999081-6 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
ep.: SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FALINA SILVESTRE

Tipo Doc.: Acto administrativo

Clase Doc.: Salida

RESOLUCIÓN No. 04186

"POR LA CUAL SE AUTORIZAN TRATAMIENTOS SILVICULTURALES EN ESPACIO PÚBLICO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

LA SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA FLORA Y FAUNA SILVESTRE DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE





SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

Folios 44 Anexos: 0

Proc. # 5956636 Radicado # 2023EE240906 Fecha 2023-10-13

Tercero: 899999081-6 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - DU

Dep.: SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE

Tipo Doc.: Aclo administrativo Clase Doc.: Salida

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

Folios 24 Anexos: 0

c.# 6044501 Radicado # 2023EE252038 Fecha: 2023-10-26 cero: 899999081-6 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Dep.: SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE

Tipo Doc.: Acto administrativo Clase Doc.: Salida

RESOLUCIÓN No. 01947

"POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN No. 04186 DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES"

LA SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

"POR LA CUAL SE AUTORIZAN TRATAMIENTOS SILVICULTURALES EN ESPACIO PÚBLICO Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

LA SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA FLORA Y FAUNA SILVESTRE DE LA SECRETARÍA DISTRITAL
DE AMBIENTE

CANTIDADES DE TRATAMIENTOS SILVICULTURALES AUTORIZADOS

TRATAMIENTO	RESOLUCION 01947		
SILVICULTURAL	CANTIDAD	%	
Bloqueo y Traslado	233	12,1	
Tala	567	29,35	
Podas de Copa, Radiculares y Tratamiento Integral	1039	53,78	
Conservación	93	4,81	
TOTAL GENERAL	1932	100	

TRATAMIENTO	RESOLUCION 02197		
SILVICULTURAL	CANTIDAD	%	
Bloqueo y Traslado	2	18,18	
Tala arboles	7	63.63	
Tala setos	2	18,18	
Conservación	0	0	
TOTAL GENERAL	11	100	


Tala y recolección de residuos vegetales octubre 2023







Mantenimiento y cerramiento de individuos arbóreos de traslados

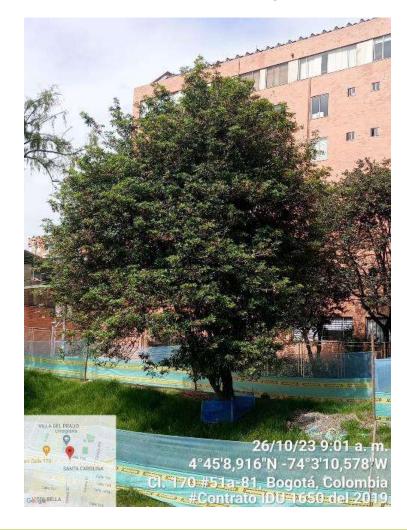





TRASLADOS DE ÁRBOLES







PODA Y MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES




ENDOTERAPIA ARBÓREA





5 RESULTADOS Y CONCLUSIONES

RELACIÓN DE TALAS Y TRASLADOS EJECUTADOS

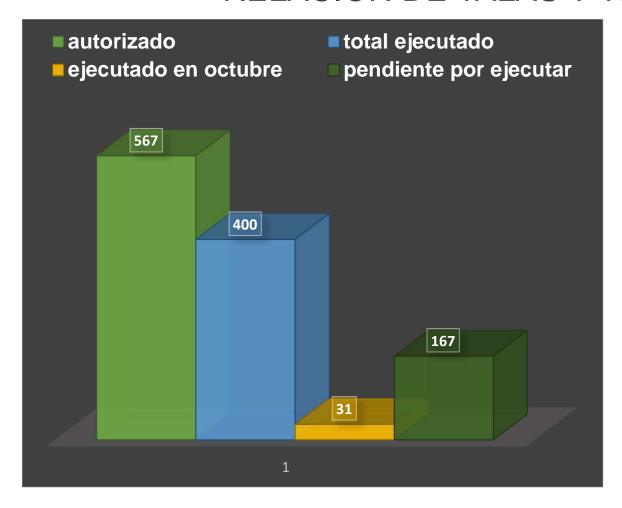



COMPENSACIÓN





ACTIVIDADES SILVICULTURALES INQUIETUDES Y PREGUNTAS DE LA COMUNIDAD



5

AVANCE MANEJO DE FAUNA SILVESTRE



Mitigar y prevenir impactos sobre la fauna



- Revisar la zona
- Identificación de posibles madrigueras, nidos, Leks, huellas, heces fecales.

Herramientas

- Rastrillo de suelo
- Emisión de sonidos
- Mecánico

Notificar y actuar

- Poner a salvo la fauna rescatada (señalizar).
- Remitir a la unidad de rehabilitación

Capacitaciones al personal de obra

3




Jornada de capacitación al personal de obra



9 jornadas de verificación de zonas verdes



3 Jornadas de ahuyentamiento

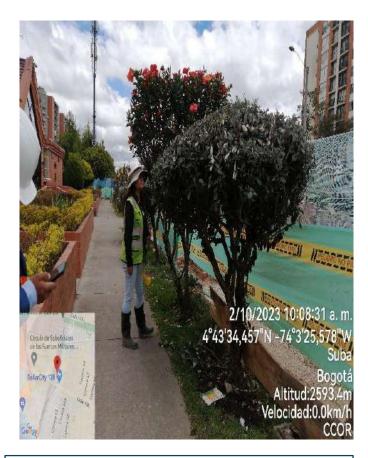





3 jornadas de censo de nidos

Rescate y entrega de fauna

ACTIVIDAD (octubre 2023)	CANTIDAD
 Liberación de árboles a intervenir 	40
 Nidos activos rescatados 	0 nidos rescatados
• Rescate de individuos	Atractus crassicaudatus : 1 Turdus fuscater: 3 prejuveniles

Proyecto de cajas nido y perchas artificiales







Ítem	Unidades	Mantenimiento	uso
Cajas nido	30	0	4
Perchas artificiales	15	0	0

AVANCE MANEJO FAUNA SILVESTRE INQUIETUDES Y PREGUNTAS DE LA COMUNIDAD





AVANCE DE OBRA COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST



5 AVANCE SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Control de ingreso de personal propio y de subcontratistas (Documentación de ingreso, Evaluaciones Médicas Ocupacionales y Cobertura al SGSST).
- 2 Inducción y capacitación al personal.
- 3 Entrega y Reposición de Dotación y EPP.
- 4 Atención de emergencias.
- Actividades SST: Pausas Activas, charlas e Inspecciones de Seguridad, Señalización de áreas de trabajo, incentivos, preoperacionales de vehículos y maquinarias, actividades con ARL (Reporte de accidentes e incidentes laborales)

5 AVANCE SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Previo a realizar actividades criticas (alto riesgo) gestión de permisos de trabajo, análisis de trabajo seguro –ATS, inspección y/o preoperacional de equipos.
- Pruebas de detección de alcohol. (166 pruebas efectivas): Todas las pruebas resultaron negativas.
- Programación del personal a cursos de espacios confinados y alturas.
- Realización de exámenes médicos ocupacionales al personal para verificar patologías que requieran ingresar a algún programa de vigilancia epidemiológica.

5 ACTIVIDADES SST













5 AVANCE SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para el mes de octubre se presentaron 3 accidentes laborales:

- Total, de días perdidos = 36 días
- Causa principal = Manejo inadecuado de cargas, uso de elementos no autorizados para el traslado del personal y no uso de elementos de protección personal.
- Se realizó divulgación de todos los accidentes a todo el personal y se implementaron planes de acción para cada uno (Capacitaciones, acompañamiento de la ARL).

TOTAL, PERSONAL			
INGRESOS	64		
RETIRO	37		
PERSONAL ANTIGUO	374		
PERSONAL DIRECTO	136		
PERSONAL SUBCONTRATISTA	238		

ACTIVIDADES SST













ACTIVIDADES SST INQUIETUDES Y PREGUNTAS DE LA COMUNIDAD



5

AVANCE DE OBRA COMPONENTE SOCIAL



COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA





ACTIVIDAD

No

Comunicado No. 53. Invitación 13° comité IDU Volantes 175 informativos

Puntos satélites de información (Actualización permanente)

16





SERVICIO A LA CIUDADANÍA

Gestión de PQRSD – S	Sistemas IDU BACHUE O Odoo			
Total, PQRSD recepcionadas	Cerradas			
157	154			
Recorridos urbanos: 79				
Vendedores informales	Vallas Móviles			
Habitantes de calle	Atención a la ciudadanía (Recepción de PQRSD)			







Correo electrónico puntoidu1650@ccor.com.co



Líneas de Atención al Ciudadano

Celular No. 3222344214 - Teléfono No. 2853165

Actualización contestador automático - horario de atención en etapa de obra.

(LEY 850 DE 2003)

Atención a veedurías ciudadanas

Veeduría Ciudadana Canal Córdoba y las que se presenten Se continúan las gestiones referidas a los compromisos establecidos en los espacios de diálogo (Etapa de Estudios y Diseños e Inicio de Obra)





PBX: 3387555

Línea 018000910312

Línea 195 - Guía de trámites y servicios



Chat IDU

Formulario Web

Sistema Distrital de Quejas y Soluciones S.D.Q.S. atnciudadano@idu.gov.co



Gestión social

Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía Dirección Técnica de Predios



Sede principal IDU: Calle 22 # 6 - 27



Hola, soy
Fulvia
¿Cómo le puedo
ayudar?

Chatbot IDU

CONFORMACIÓN DE VEEDURÍAS CIUDADANAS

La Veeduría Ciudadana es un mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública..., así como de las entidades públicas o privadas...,que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público. (Ley 850 de 2003)

Requisitos	Funciones				
Acta de constitución (Fotocopia).	 Ejercer vigilancia sobre la gestión pública respecto de la obras concebidas, dentro del acuerdo de valorización 7 				
Nombre de los integrantes					
Documento de identidad	2018.				
Objeto de la veeduría					
Nivel territorial	Transmitir, comunicar, socializar y difundir con el resto d				
Duración	comunidad interesada, para ello la Veeduría Distrital cu con las herramientas, técnicas y metodologías, que ser socializadas.				
Lugar residencia					
Radicación documentos.					
Personería de Bogotá y/o Personerías Locales	concertados con las entidades, así como sus propio		Verificar si se han dado respuestas a los compromisos	compromisos	
Cámara de comercio					
Acompañamiento de la Veeduría Distrital	ompromisos con la ciudadanía, en térm ncidencia.	inos de efectividad e			

DIÁLOGO CIUDADANO

REUNIONES PARTICIPATIVAS EN OBRA

N/A* Dichas convocatorias fueron realizadas por los solicitantes de las reuniones.

TIPO DE REUNIÓN	FECHA	LUGAR	CONVOCADOS	ASISTENTES	TEMA
12vo Comité IDU	27/10/2023	Salón Comunal San José del Prado (Spring)	170	7	Socialización de avance de obra
Reunión extraordinaria No. 17	2/11/2023	Conjunto Residencial Casas de Amsterdam	N/A	5	Resolver las inquietudes de la copropiedad frente a las actividades de obra.







ACOMPAÑAMIENTO A ACTIVIDADES TÉCNICAS

Actividad	Descripción
Actas de vecindad	Total, actas a predios: 1.858 = 99.9% Total, actas a parques y zonas verdes: 21 = 100%
Suspensión de acceso a garajes	Restricción de acceso a garaje sector 1 oriental
	Restricción de acceso a garajes sector 4 occidental
Compromisos	A la fecha existen 14 compromisos los cuales se encuentran cerrados.
Otras actividades	Acompañamiento Izaje del Puente bicipeatonal calle 130







GOBERNANZA PARA LA MOVILIDAD GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL



Monitoreo actividades económicas informales



Habitabilidad en calleSecretaría Distritalde Integración Social




GESTIÓN Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL - MONC

GENERACIÓN DE EMPLEO DEL CONTRATO	CANTIDAD			
Total, población Mano de Obra Calificada – MOC 53				
Total, Mano de Obra No Calificada – MONC	,	101		
Total, Población Vulnerable	Vulnerable 6			
% CUMPLIMIENTO				
Total, Mano de Obra No Calificada de las Localidades	33	32.7%		
Total, Población Vulnerable	6	5.9%		

Recepción permanente de hojas de vida a través de los canales de atención del Punto IDU



MEDICIÓN DE PERCEPCIÓN CIUDADANA Y MONITOREO DE IMPACTO

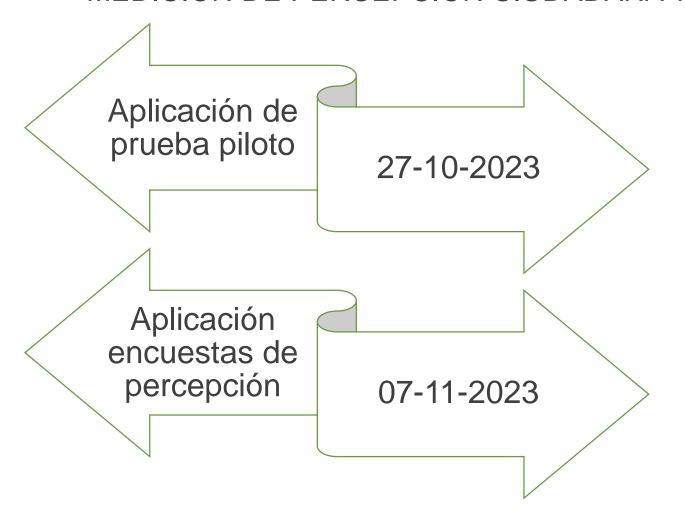

EMPRESA ENCUESTADORA: **APOYO EN MERCADEO**



Aplicación de prueba piloto – 27-10-2023

AVANCE COMPONENTE SOCIAL INQUIETUDES Y PREGUNTAS DE LA COMUNIDAD



RECOMENDACIONES GENERALES

Participar activamente de las actividades sociales que se realizarán durante la etapa constructiva del contrato.

Por seguridad, suministre información únicamente a personas identificadas con el chaleco del IDU y que porten el carné de la firma Contratista o la Interventoría usted puede verificar esta información a través de las Líneas de Atención.

Por seguridad, evite caer en engaños de entidades o personas que requieran dinero en efectivo porque en la ejecución del contrato no se requiere ningún suministro de este tipo. Hay que recordar que ningún trabajador está autorizado para realizar cobros por ninguna actividad.

Recibir información que se lleve predio a predio y solicitar información sobre el contrato únicamente a través de los canales de atención al ciudadano (Punto IDU – IDU). Propender por mantener una adecuada cultura ciudadana en la etapa de obra, prevención de accidentes viales, cumplimiento a la señalización instalada en el AID y un diálogo asertivo con el contratista.

No dar crédito al personal del contrato. La firma contratista, interventoría e IDU, no se hacen responsables por situaciones derivadas de ello.

Política Antisoborno

Adoptamos la Política Antisoborno la cual prohíbe toda práctica de ofrecer o recibir una ventaja financiera o no, como incentivo para que un colaborador del IDU haga o deje de cumplir con sus actividades, funciones u obligaciones.

Denuncia, a través del correo denuncie.soborno@idu.gov.co o en los buzones físicos antisobornos que se encuentran en las sedes de la entidad.

¡Avanzamos, para garantizar una gestión transparente y eficiente!





iGRACIAS!





SI DESEA CONOCER MÁS DE ESTE Y OTROS PROYECTOS EJECUTADOS EN BOGOTÁ

