

## ACTA

Versión:	2
Fecha de aprobación:	3-05-2018
Código:	02-01-F0-0001

Marque con una X según corresponda

Acta de Subred       Acta de Unidad Prestadora de Servicios \_\_\_\_\_      Acta de Sede de una Unidad \_\_\_\_\_

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) \_\_\_\_\_

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica) \_\_\_\_\_

Tipo de acta

COMITÉ \_\_\_ REUNIÓN x OTRO \_\_\_

NÚMERO DE ACTA: 05

FECHA: 27 de Mayo de 2022

LUGAR: T. Urgencias USS Occidente de Kennedy

HORA INICIO: 8:30 am

RESPONSABLE: Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano

HORA FINAL: 11:00 am

### OBJETIVO DE LA REUNION

Realizar reunión con el grupo veedor para la socialización de avances de la Torre de Urgencias de la USS Occidente de Kennedy

### ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR)

1.	Bienvenida a los asistentes
2.	Aprobación del acta anterior
3.	Socialización de los avances de la obra de la T. Urgencias USS Occidente de Kennedy
4.	Intervención de los Veedores
5.	Proposiciones y Varios

### REVISION DE COMPROMISOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento		
				Si	No	Observaciones
1	Envío del proceso histórico de avance de obra a la fecha.	Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano y Oficina de Desarrollo Institucional	27 mayo de 2022	X		
2						
3						
4						

<b>Total compromisos</b>	<b>Compromisos Resueltos</b>	<b>% Cumplimiento</b>
1	1	100

## DESARROLLO


Se da inicio a esta sesión siendo las 8:30 am.

- BIENVENIDA A LOS ASISTENTES:** El Referente de la oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano, Daniel Aponte, da la bienvenida a los asistentes a esta sesión de socialización de avances de la Torre Urgencias de la USS Occidente de Kennedy.

Para este encuentro, se cuenta con la presencia de 3 veedores de la obra, Margarita Arévalo, Rosalba Peña y Miguel Murcia. Roberto P. Silva, Liliana Moyano, Byron Aguirre, Juliette Castro y Francisco Barrios de la Interventoría, representando al consorcio Quirón Arq. Graciela Prieto e Ing. Jairo Varela, Flor A. Vargas e Ing. Ramiro Ortiz de la Secretaría Distrital de Salud y por parte de la Subred Suroccidente, por parte de la Oficina de Desarrollo Institucional Asesora de Gerencia y Supervisora de la obra Paola Roa, Yasser Kalil coordinador de proyectos y de la oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano el Referente Daniel Sebastián Aponte.

- APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR:** El Referente de la Oficina de Participación Comunitaria Daniel Aponte, expone que fue enviada el acta correspondiente al mes de abril y se presentaron comentarios por parte de la Subred, los cuales fueron ajustados y enviados nuevamente para su respectiva lectura y aprobación. El consorcio Quirón aún no da por aprobada el acta y queda en estado pendiente para la respectiva revisión, se expondrá este punto en la próxima reunión.
- PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES DE LA OBRA:** Toma la palabra el Ing. Roberto P. Silva de la Interventoría para presentar los avances presentados en el último mes. En donde, se presenta una ejecución del 68,33 % sobre un 58,10% programado con una diferencia de 10,23%. Recalca que más adelante la diferencia puede disminuir y avanzar según lo proyectado.

LÍNEA DE TIEMPO GENERAL DE LA OBRA:

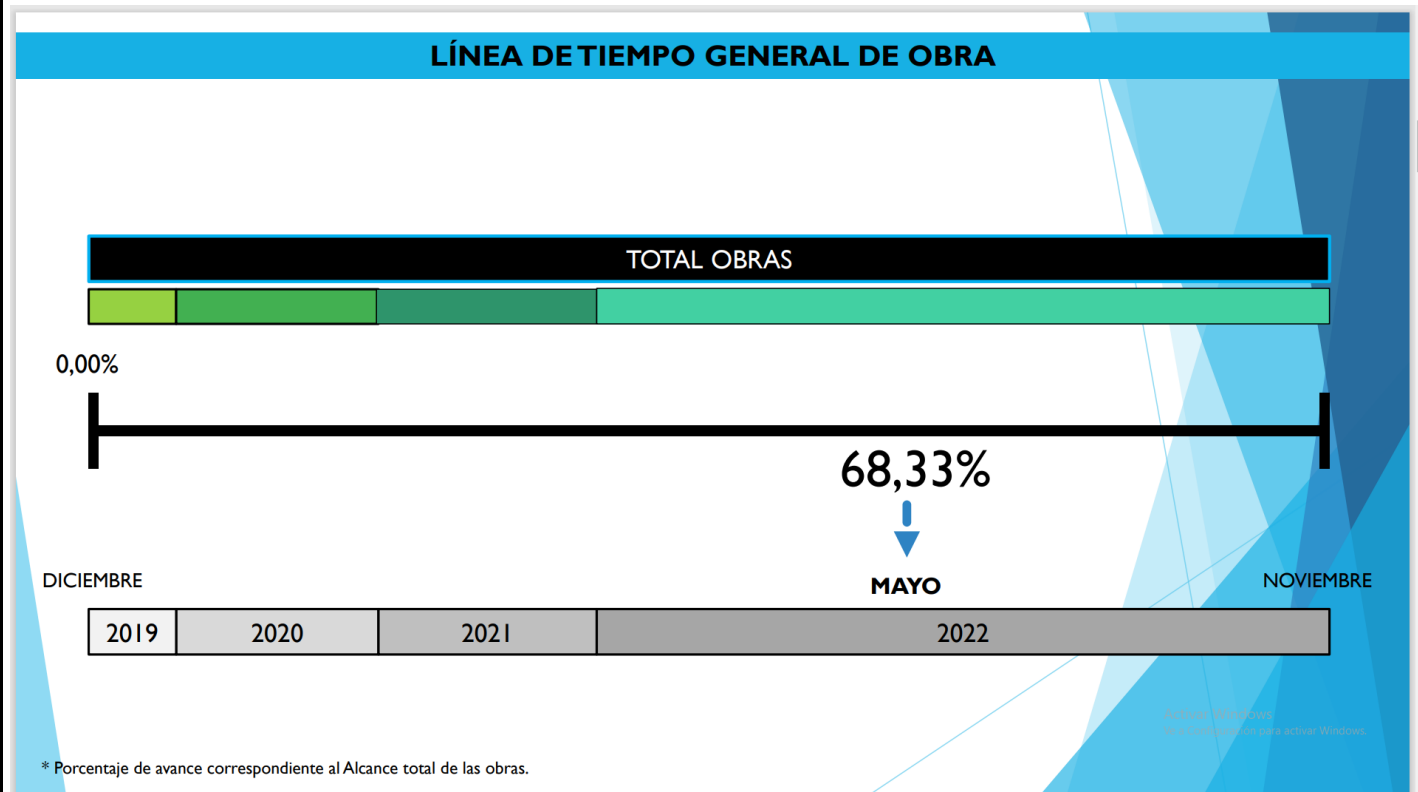

**DESARROLLO**

HISTÓRICO % DE OBRA:

**HISTÓRICO DE PORCENTAJES DE AVANCE DE OBRA**


PORCENTAJES ACUMULADOS																
2021											2022					
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
28,60%	33,33%	40,50%	47,19%	52,62%	26,41%	27,99%	28,63%	35,61%	37,03%	38,88%	39,99%	45,73%	51,59%	56,86%	61,74%	68,33%

ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 1

ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 2

LÍNEA DE TIEMPO HITOS ALCANCE 3:

**LÍNEA DE TIEMPO HITOS ALCANCE 3**

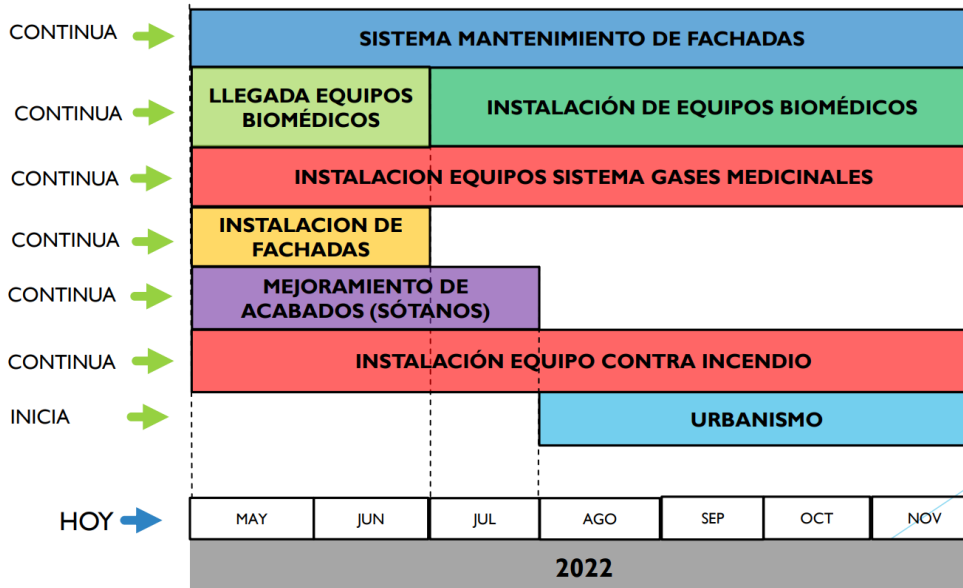

FIN

## DESARROLLO

### PANORÁMICAS DE LA OBRA:



PANORÁMICAS DE OBRA

Activar Windows  
Vea la configuración para activar Windows.

Francisco Barrios expone a los asistentes que un proceso que ha tenido avances significativos en la obra es la instalación de la fachada, con ello, el cerramiento total de la obra también presenta un porcentaje de progreso importante.



AVANCE EN ACTIVIDADES

Activar Windows  
Vea la configuración para activar Windows.

## DESARROLLO

Francisco Barrios presenta a los asistentes los frentes de trabajo que se realizan en la obra:

- Avance en actividades de mampostería.
- Instalación de subestación eléctrica.
- Instalación del equipo de aire acondicionado.
- Instalación de voz y datos en estructura.
- Instalación de redes (Exterior).
- Mantenimiento de fachada.
- Terminación de puesta a punto de ascensores para inicio de pruebas.
- Instalación de pisos.
- Avanzan actividades en cubierta en materia de impermeabilización.
- Inician actividades de enchape.
- Avanza la instalación de cielo raso.



### AVANCE EN ACTIVIDADES

Activar Windows  
Vea configuración para activar Windows.

#### 4. INTERVENCIÓN DE LOS VEEDORES:

Margarita Arévalo toma la palabra en nombre del grupo de veeduría para agradecer los avances presentados a la fecha por parte del Consorcio Quirón, Interventoría y Subred por el empeño que han dispuesto para adelantar y entregar la Torre de Urgencias a la comunidad. La Sra. Margarita hace énfasis e indica que “El grupo de veeduría no es un comité de aplausos ni de la Interventoría, ni del Consorcio, ni de la SDS, ni mucho menos de la Subred, el ideal siempre ha sido el trabajo en conjunto para alcanzar los objetivos y superar las dificultades; esto con el fin de dejar claro para evitar malos entendidos por comentarios que han surgido a raíz del ejercicio de control social”.

Por otro lado, la Sra. Margarita Arévalo solicita el envío del acta de la reunión del 10 de mayo de 2022 entre la Subred, Consorcio y grupo de veeduría. A su vez, el grupo de veeduría desea saber el resultado de esta

## DESARROLLO

reunión. A ello, Roberto P. Silva expone, gracias al esfuerzo en conjunto, el Ing. Jairo Varela y el Consorcio Quirón iban a realizar un consenso y estudio. A partir de ello, el comité de obra se reunió con el Secretario Distrital de Salud, el Consorcio Quirón no estuvo de acuerdo, pero determinó en conjunto que era lo más apropiado para el proyecto, esto en relación a la señalética de la Torre de Urgencias de Kennedy.

Toma la palabra, el Ing. Jairo Varela indica que el 13 de mayo de 2022 se reunió con el Secretario de Salud Alejandro Gómez, sesión en la cual participó la Subred Sur Occidente con la Gerente Dra. Martha Y. Ruiz, allí se explicó que la posición no está encaminada a no realizar las obra si no la precisión en el tema de los sobrecostos en el transporte de los equipos importados. El Ing. Varela recalca que la decisión se tomó de manera autónoma, tomando riesgos, en relación a la crisis de los contenedores. Por parte de la Secretaría Distrital de Salud, se propuso una solución, la cual se analizó en detalle y la administración interna de la constructora en su análisis, expuse que esta alternativa no solucionaba este inconveniente por un tema de costos; se solicitó una nueva propuesta que favoreciera a todas las partes involucradas. El Ing. Jairo Varela agrega que se sostuvo otra reunión con el Subsecretario de Planeación Juan C. Bolívar, Gerencia de la Subred y Consorcio, en donde se ratificó la ejecución de las actividades sin afectar el cronograma y al día de hoy se encuentran en ello. Aclara que la ejecución de estas actividades se realizará por ética más no por obligación.

Margarita Arévalo indica que existe la preocupación, en relación a las actividades que no se tienen contempladas, pregunta ¿cuál fue el papel de la Interventoría para prever el tema de sobrecostos? Y ¿por qué el grupo de veeduría tuvo que gestionar actividades que desde la administración del Dr. Omar Perilla se estaban validando? Recalca que sin el apoyo de los veedores no se habría avanzado en el tema; solicita que se haga una precisión de los recursos faltantes. La Dra. Paola Roa expone que se tuvo que establecer un protocolo de bioseguridad para garantizar la continuidad de la obra en el marco de la pandemia del COVID - 19, la cual fue estudiada y aprobada por la Interventoría y la Subred. En aras de la transparencia, los recursos de la obra siempre han estado en el contrato y no se pueden destinar para otras actividades.

El Ing. Jairo Varela recalca que al día de hoy se tienen inconvenientes en el tema de equipos de tecnología, cámaras, sensores, entre otros que por el tema de contenedores ha dificultado las entregas. Ante lo anterior, El Ing. Roberto P. Silva expone que el 1 de junio de 2022 se va a reunir con el Secretario de Salud para validar alternativas y aspectos jurídicos.

La Sra. Margarita Arévalo expone que el comité de veeduría esperará dicha reunión, pero solicita que se mantenga informado para apoyar posibles gestiones y así avanzar en temas críticos de la obra, hace un llamado a trabajar en conjunto para alcanzar los objetivos trazados desde un principio. A su vez, recalca que no se debe esperar hasta el último viernes del mes para socializar los temas y avances, pues debido a la urgencia de ciertas temáticas de la obra se puede citar a sesión extraordinaria. Ante lo expuesto anteriormente, la Dra. Paola Roa propone que se realice una sesión específica para este tema, en donde se puedan aclarar dudas y procedimientos.

Rosalba Peña solicita al Ing. Roberto P. Silva actualice los números de teléfono de los veedores para que los puedan mantener informados-.

La Sra. Margarita solicita una reunión con el equipo jurídico de la Subred Sur Occidente y la Secretaría Distrital de Salud para validar alternativas y aspectos pendientes.

En relación al compromiso pactado en la sesión del mes de abril, el Consorcio Quirón presenta un video en donde se evidencia el proceso histórico de la obra de la Torre de Urgencias Occidente de Kennedy. El grupo de veeduría solicita el video para ser replicado con la comunidad.

La Dra Paola Roa, en el marco del proceso de adjudicación de la dotación de la torre, socializa a los asistentes que se dio el cierre y en relación a los equipos biomédicos se adjudicaron 54 ítems y se declararon desiertos 8 ítems, por parte del tema de inmobiliarios se adjudicaron 4 ítems y se declararon desiertos 21 ítems. A partir de ello, se realizó una nueva invitación para el proceso, la cual saldrá la próxima semana, se espera adjudicar todos pendientes.

**DESARROLLO**

**5. PROPOSICIONES Y VARIOS:**

- El Ing. Ramiro Ortiz indica a los asistentes que el Plan de Regularización y Mantenimiento indica y determina los espacios para reorganizar, pero el tema son los costos para el desarrollo, el cual está especificado para 12 años. La Dra. Paola Roa aclara que en este momento al Subred Sur Occidente no tiene determinado un proyecto de inversión suscrito para la ejecución, cuando estos aspectos se planeen se pueden adelantar las gestiones respectivas. El comité de veeduría se compromete, luego de la reunión con la SDS, realizar los trámites con la Alcaldesa Mayor de Bogotá para adelantar estos aspectos pendientes.
- Daniel Aponte recuerda a los asistentes la próxima sesión de avances de veeduría para el viernes 24 de junio de 2022 a las 8:00 am.
- Flor A. Vargas socializa a los asistentes la Rendición de Cuentas que se desarrollará el próximo 01 de junio de 2022 a las 2:00 pm bajo una modalidad mixta (Virtual y Presencial) en el auditorio principal de la Secretaría de Salud y a través del Facebook Live de la SDS.
- Se realiza recorrido por la obra para validar los avances presentados a la fecha guiado por la Arq. Graciela Prieto.

Se da por terminada la reunión siendo las 10:00 am.



FECHA: 24 de mayo de 2022

TEMA: Reunión con el grupo de veedores de obra Torre Kennedy

**COMPROMISOS**

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Envío del video a los veedores del proceso histórico de avance de obra a la fecha.	Consortio Quirón	Junio/2022
Solicitar una reunión con el equipo jurídico de la Subred Sur Occidente y la Secretaría Distrital de Salud para validar alternativas y aspectos pendientes	Oficina de Participación Comunitaria y Desarrollo Institucional	Junio/2022
Envío del acta de la reunión a los veedores del 10 de mayo de 2022 entre la Subred, SDS y Consortio.	Oficina de Desarrollo Institucional	Junio/2022

Nota: Al firmar el presente documento me comprometo a cumplir con las actividades de mejoramiento propuesto, y que son de mi competencia

 <p>Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.</p>	<p><b>LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES</b></p>	Versión: 3	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>
		Fecha de aprobación: 17-11-2021	
		Código: 02-01-FO-0002	

Marque con una X según corresponda

Reunión de Subred  Reunión de Unidad Prestadora de Servicios  Reunión de Sede de una Unidad

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) \_\_\_\_\_

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica) \_\_\_\_\_

FECHA: 27/ Mayo / 2022. LUGAR: T. Virgenas Kennedy HORA INICIO: 8:30 am.

RESPONSABLE: Ofiana Antequera Comunitaria. HORA FINAL: 10:00 am

TEMA DE LA REUNION: Realizar reunión de avances de obra con veeduría.

Nota: Al firmar el presente documento me comprometo a cumplir con las actividades de mejoramiento propuesto, y que son de mi competencia.

FIRMA DE ASISTENTES						
N°	NOMBRE	N° IDENTIFICACIÓN	UNIDAD	CARGO O ACTIVIDAD	PROCESO AL QUE PERTENECE	FIRMA
1	Miriam Murcia	19.17.1639	Hospital Re. Urdarín	Urdarín	Urdarín	[Firma]
2	Rosalba Pineda	415.37745	Hospital Re. Urdarín	Urdarín	Urdarín	[Firma]
3	Ramiro Ortiz	29500535	S.D.S. D.24	T. Prof Esp	Infraestruct.	[Firma]
4	Florence Vargas	51881096	SPS	Centro Social		[Firma]
5	Jairo E. Varela F. H. O. L.	19.230.995	Quiron	EL.		[Firma]
6	Liliana Moreno	37899535	Intervención	HSEQ	Interventoría	[Firma]
7	Bryan Osorio	79138246	Intervención	INE. RESIDENTE	OBRA	[Firma]
8	Francisco Bernal	79366567	Intervención	Residente	Técnico	[Firma]
9	Guillermo Porto	52039118	Quiron	DOBRA	Técnico	[Firma]
10	Roberto Torres	13.749.727	Intervención	Director	Trayectoria	[Firma]
11	ESTRAT KALI	80172604	ACCIONES	COORD	PROYECT	[Firma]
12	Paola Poca	52357344	ACCIONES	Asesor	Infraestructura	[Firma]
13	Daniel Sebastián Arcub	103670149	SUR.	Lider.	PCSC.	[Firma]
14	María Angélica Arango	5161358506	HO Kennedy	Coordinadora	Urdarín	[Firma]
15	Juliette Castro	52039030	Intervención	Av. Ing	Interventoría	[Firma]
16						
17						
18						
19						
20						
