



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/ DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
16/06/2022	SEGUIMINETO COSNTRUCCION CAPS DIANA TURBAY	7:30 am	10:30 am

Proceso, área que lidera la reunión	Nombre de quien elabora el acta
Gerencia, Desarrollo Institucional y Participación Comunitaria - Servicio al Ciudadano	Blanca T. Henao

**1. Objetivo de la reunión:**

Asistencia técnica a la veeduría de Juntas de Acción Comunal al proyecto de infraestructura CAPS Diana Turbay de la Subred Centro Oriente

**2. Temas a tratar:**

- ✓ Bienvenida e instalación de la mesa de trabajo
- ✓ Presentación de las Reglas de Oro para el desarrollo de la Reunión
- ✓ Presentación de los asistentes
- ✓ Seguimiento a compromisos del proyecto de infraestructura construcción, ampliación, dotación y puesta en funcionamiento del CAPS Diana Turbay de la Subred Centro Oriente
- ✓ Intervención de la comunidad
- ✓ Respuesta institucional
- ✓ Compromisos
- ✓ Cierre

**3. Desarrollo:**

Se da inicio a la reunión de seguimiento proyecto infraestructura CAPS Diana Turbay siendo las 7:45 a.m. en el Salón Comunal Vencedores del barrio Diana Turbay por el señor Carlos Moya moderador de la mesa y el Sr. Hipólito Pinilla líder comunitario y coordinador de esta reunión quienes dan la bienvenida a cada uno de los asistentes, previa socialización del procedimiento de Ruta de la Salud entregando a los asistentes el volante con el número telefónico fijo y el numero telefónico de WhatsApp

El Sr. Hipólito informa la agenda a seguir:

- Informe avance a la ejecución de la obra CAPS Diana Turbay a cargo de la Subred Centro Oriente
- Intervención de la comunidad
- Respuesta institucional
- Compromisos.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/ DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
16/06/2022	SEGUIMINETO COSNTRUCCION CAPS DIANA TURBAY	7:30 am	10:30 am

➤ Cierre de la mesa

**Presentación de los asistentes:** El moderador de la mesa, señor Carlos Moya realiza la presentación de los líderes comunales integrantes de 9 juntas de acción comunal de la UPZ Diana Turbay y se evidencia en el registro de asistencia las siguientes situaciones:

- Asistencia de 21 líderes sociales.
- Asistencia de la Gerente E de la Subred Centro Oriente
- Asistencia del arquitecto de Secretaria Distrital de Salud
- Asistencia de 8 profesionales de la Subred Centro Oriente

El Sr. Hipólito Pinilla continúa con la presentación de acuerdos de oro y medidas de bioseguridad para realizar reunión efectiva haciendo énfasis en los siguientes aspectos:

1. Mantener el diálogo con intervenciones propositivas, respetuosas y creativas.
2. Escuchar activamente cada intervención
3. No retirarse el tapabocas durante toda la jornada, en especial al momento de realizar la intervención

Y culmina su intervención dando la palabra a la Gerente de la Subred Centro Oriente

La Dra. Yiyola Peña Gerente de la Subred Centro Oriente en su intervención hace énfasis en el rol de gerente encargada desde el 27 de abril de 2022, continúa presentando el equipo de funcionarios presentes y concede la palabra a la jefe de la oficina de Desarrollo Institucional.

La Dra. Marcia Guacaneme suministra la siguiente información del convenio 1018-2017:

- ✓ Objeto: Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto Construcción y Dotación CAPS Diana Turbay



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/ DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
16/06/2022	SEGUIMINETO COSNTRUCCION CAPS DIANA TURBAY	7:30 am	10:30 am



✓ Valor del Convenio inicial: \$162.687.957

ADICIONES:	
Adición 1: 23/05/2018	\$ 57.422.450
Adición 2: 28/08/2019	\$ 36.464.460
Adición 3 (obra e interv.): 06/11/2019	\$ 13.123.910.432
Adición 4 (PAPSO): 29/12/2020	\$ 284.886.873
Adición 5: 15/10/2021	\$3.071.500.763
Adición 6 (Dotación): 29/11/2021	\$2.376.426.678
Adición 7 (obra e interv.): 31/mayo/2022	\$1.085.989.407
VALOR ACTUAL DEL CONVENIO:	\$20.199.289.020
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	10/03/2023

✓ Contrato de obra

Contrato No. 02-BS-020-2020,  
Contratista: CONTEIN SAS.  
Fecha de firma acta de inicio: 18/08/2020  
Valor inicial: \$12.036.415.438  
Adición 1 PAPSO: \$ 272.724.998  
Adición No. 2: \$ 2.744.087.138  
Adición No. 3: \$ 887.400.157  
Valor Actual: \$ 15.940.627.731  
Fecha finalización : Julio 30 2022

✓ Contrato de interventoría

Contrato No. 02-BS-021-2020



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/ DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
16/06/2022	SEGUIMINETO COSNTRUCCION CAPS DIANA TURBAY	7:30 am	10:30 am

Contratista: Consorcio Salud MB  
Fecha de firma acta de inicio: 18/08/2020  
Valor inicial: \$952.476.000.  
Adición 1 PAPSO: \$ 12.161.875  
Adición No. 2: \$327.413.625  
Adición No. 3: \$ 178.589.250  
Valor Actual: \$ 1.470.640.750  
Fecha finalización : Agosto 31 2022

Nota: Es de aclarar, que la puesta en funcionamiento del Centro de salud Diana Turbay se proyecta para el 31 de agosto de 2022

- ✓ Seguimiento al avance de ejecución de la obra CAPS Diana Turbay

Avance de obra programado: 97,30%  
Avance de obra ejecutado: 93.26%  
Atraso: -4.04%

El arquitecto Inti Rojas presenta la siguiente información:



- ✓ Actividades ejecutadas en el presente periodo
  - Se finaliza la construcción de muros internos y externos
  - Se finaliza la aplicación del Pañete y Pañete impermeabilizado sobre muros en bloque.
  - Se finaliza lavado de Fachadas.
  - Se continúa la aplicación de Estuco y Pintura sobre los muros.
  - Se continua la Instalación de enchapes de pisos y muros
  - Se continua Instalación de tubería RCI, Instalación de la tubería



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/ DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
16/06/2022	SEGUIMINETO COSNTRUCCION CAPS DIANA TURBAY	7:30 am	10:30 am

hidrosanitarias,

- Instalación de ductos de ventilación mecánica, Instalaciones eléctricas e
- Instalaciones de Gases Medicinales.
- Se continúa la Instalación de estructura para el montaje del cielo raso
- Se inicia instalación de ventanería de Fachadas.
- Se inicia la instalación de placa yeso en cielo raso
- Se continúa la Demolición de roca y retiro en el área del muro de Contención.
- Se continúa Amarre de acero para trincheras del Muro de Contención, para
- continuar con la fundición en concreto.
- Se inicia Excavación y Amarre de Cuarto de Máquinas, para continuar con la
- fundición en concreto.
- Se inician actividades de Exteriores (compactación de terreno, bordillos,
- sardineles,...)
- Se inicia compactación de Contra piso de Sótano, para dar inicio de amarre
- de aceros para posterior fundición.

SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA  
CAPS DIANA TURBAY

Registro Fotográfico al 08 de mayo del 2022



Avance de acabados en pisos y cielos

Avance instalación de redes

Avance instalación de ventanería en fachada

Avance instalación enchapes

Avance instalación enchapes

Avance de construcción de tanques



#SubredCOMásCercaDeTi



SECRETARÍA DE  
SALUD



Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
Centro Oriente E.S.E.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/ DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
16/06/2022	SEGUIMINETO COSNTRUCCION CAPS DIANA TURBAY	7:30 am	10:30 am

SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA  
CAPS DIANA TURBAY

Registro Fotográfico al 15 de mayo del 2022



Avance Muro de contención.

Avance de acabado de Foso de Ascensores.

Limpieza para inicio de Exteriores

Avance de acabados en pisos y cielos

Avance de acabados en pisos y cielos

Avance instalación de redes



#SubredCOMásCercaDeTi

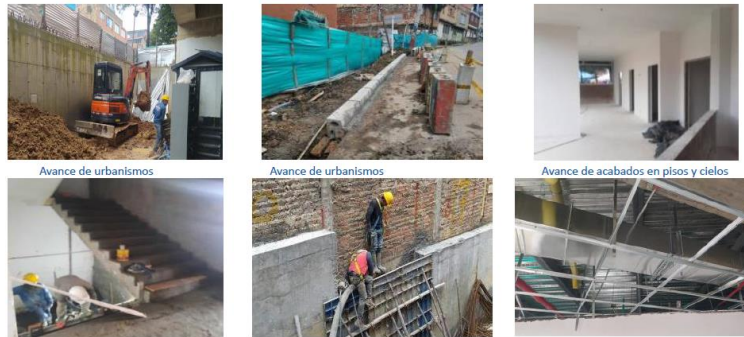


SECRETARÍA DE  
SALUD



SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA  
CAPS DIANA TURBAY

Registro Fotográfico al 22 de mayo del 2022



Avance de urbanismos

Avance de urbanismos

Avance de acabados en pisos y cielos

Avance de acabado de escalera principal

Avance de Fundición de Muro Contención.

Avance instalación de redes.



SECRETARÍA DE  
SALUD



Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
Centro Oriente E.S.E.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/ DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
16/06/2022	SEGUIMINETO COSNTRUCCION CAPS DIANA TURBAY	7:30 am	10:30 am

### SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA CAPS DIANA TURBAY

Registro Fotográfico al 29 de mayo del 2022



Excavación y Perfilado de terreno  
ULTIMA trinchera.



Compacción de Sótano  
Para armado de contrapiso



Avance de suministro e instalación de  
ductos de Aires Acondicionados



Avance en Urbanismo.



Avance de acabados en pisos y  
cielos



Avance de Cuarto de Maquinas



SECRETARÍA DE  
SALUD



### SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA CAPS DIANA TURBAY

Registro Fotográfico al 05 de junio del 2022



Lavado, sellado e Impermeabilizado de Fachada



Instalación de Puertas metálicas



Avance de ultima trinchera del  
Muro de Contención



Avance en Urbanismo.



Instalación de Red de Ventilación Mecánica



Avance de Urbanismos



SECRETARÍA DE  
SALUD



Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
Centro Oriente E.S.E.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/ DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
16/06/2022	SEGUIMINETO COSNTRUCCION CAPS DIANA TURBAY	7:30 am	10:30 am

SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA  
CAPS DIANA TURBAY

Registro Fotográfico al 12 de junio del 2022



Avance de Acabados



Avance de acabados en Pisos



Avance de lavado y sellado de Fachada



Avance de Acabados.



Avance de acabados en Pisos



Avance de Urbanismo



Seguimiento al avance de dotación CAPS Diana Turbay  
Contrato Interadministrativo No. 02-BS-0149-2021 EGAT - Dotación Diana Turbay

	ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
1	Plazo para subsanar y presentar observaciones al informe de evaluación	Hasta el 6/06/2022	SECOP II
2	Respuesta a observaciones al informe de evaluación	13/06/2022	SECOP II
3	Publicación listada de proponentes habilitados	14/06/2022	SECOP II
4	Apertura del sobre económico	15/06/2022 08:00 a.m.	SECOP II
5	Subasta Inversa Electrónica	16/06/2022 8:00 a.m. al 21/06/2022 5:00 p.m.	SECOP II
6	Subsanación Precios artificialmente bajos	22/06/2022 hasta 2:00 p.m.	SECOP II
7	Recomendación de adjudicación	28/06/2022	SECOP II
8	Publicación de la adjudicación o de declaratoria de desierta.	30/06/2022	SECOP II

Culminando este punto, la Dra. Marcia Guacaneme suministra información sobre el





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/ DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
16/06/2022	SEGUIMINETO COSNTRUCCION CAPS DIANA TURBAY	7:30 am	10:30 am

portafolio de servicios de la unidad Diana Turbay donde se tiene garantizado el recurso humano.

### SERVICIOS DE SALUD

Urgencias: 24 horas.

Consulta externa: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

#### Consulta médica general

- Medicina general

#### Medicina especializada

- Medicina interna
- Ginecología
- Pediatría

#### Servicio de promoción y detección temprana

- Alteraciones del crecimiento y desarrollo (menor a 10 años)
- Alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 años)
- Alteraciones del embarazo
- Alteraciones en el adulto (mayor a 45 años)
- Cáncer de cuello uterino
- Cáncer de seno
- Alteraciones de la agudeza visual
- Atención en planificación familiar en hombres y mujeres
- Atención preventiva en salud bucal
- Vacunación

#### Apoyo diagnóstico y terapéutico

- Tamización de cáncer de cuello uterino

#### Laboratorio clínico

- Toma de muestras

#### Intervención de la comunidad:

Sr. Carlos Moya hace énfasis en las siguientes preguntas:



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/ DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
16/06/2022	SEGUMINETO COSNTRUCCION CAPS DIANA TURBAY	7:30 am	10:30 am

- Quien es el asegurador
- Solicita ser partícipes en la inauguración
- Se cuenta con la recuperación del parque y se solicita el compromiso del sector salud a tramitar el punto wifi, compromiso adquirido desde el mes de febrero en la visita del Secretario Distrital de Salud.
- Se requiere carta de la Subred Centro Oriente donde se solicita el préstamo del salón comunal vencedores del barrio Diana Turbay como punto de vacunación humana sin remuneración.

Sr. Francisco Berrio manifiesta los siguientes aspectos:

- Solicita estudiar la posibilidad de pavimentar el andén hasta la Virgen
- Contar con capacidad de personal para la prestación del servicio
- Solicita información sobre los puntos para atención de felinos y caninos.


Líder comunitario solicita prestación de servicios de salud para personas con aseguramiento contributivo

Líder comunitario: En la placa que se coloque en el Centro de Salud Diana Turbay dando agradecimientos a líderes sociales, se solicita que figuren los líderes que realmente han trabajado por este proyecto de infraestructura.

Sr. Mauricio Guevara manifiesta los siguientes aspectos:

- Cómo va a asegurar la Subred Centro Oriente la contratación de personal y la atención con personal de planta?
- Cómo se realiza la postulación de la comunidad para trabajar en el CAPS.
- Qué se contempla hacer con los vendedores ambulantes cuando se inaugure el CPAS?
- No se cuenta con la información en el sistema Colibrí para consultar los avances de los compromisos frente a este proyecto?
- Solicita un punto de EAPB Capital Salud en CAPS Diana Turbay para agilizar los trámites de autorización.

Sra. Ana Rosa Farfán manifiesta los siguientes puntos:

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SALUD <small>Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.</small>	<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD</b> <b>CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b>	<b>CÓDIGO: ET-CO-FT-001</b> <b>VERSIÓN: 03</b> <b>FECHA: 2022-05-27</b>
	<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>	

FECHA AÑO/MES/ DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
16/06/2022	SEGUMINETO COSNTRUCCION CAPS DIANA TURBAY	7:30 am	10:30 am

- Solicita estudiar la posibilidad de entregar medicamentos en el CAPS Diana Turbay
- Garantizar la fila de atención prioritaria
- Garantizar la entrega de fichas del digiturno al interior de la Unidad.

#### Respuesta Institucional

Dra. Yiyola Peña Gerente de la Subred Centro Oriente hace hincapié en las siguientes manifestaciones de la comunidad:

- En el acto de inauguración del centro de salud Diana Turbay se tendrá en cuenta la participación de los líderes comunitarios
- Tramitará el punto wifi , con el Secretario Distrital de Salud
- La entidad tiene contemplado la capacidad de personal para la prestación del servicio de manera eficiente y eficaz
- Se está realizando acercamiento con las EAPB del régimen contributivo para concertar alianzas estratégicas y prestar los servicios a personas con aseguramiento contributivo.
- Sobre la placa dando agradecimientos a líderes sociales, se informa que no se cuenta con esta placa en ningún proyecto de infraestructura.
- La Subred Centro Oriente cerrará el punto de contingencia una vez se inaugure el centro de atención Diana Turbay y el recurso humano que allí labora se ubicará en esta unidad.
- La postulación de la comunidad para trabajar en el CAPS se realizará siguiendo el procedimiento de elección de personal establecido en la entidad.
- El tema de los vendedores ambulantes no es injerencia de la Subred Centro Oriente, este tema se deberá adelantar con la Alcaldía Local Rafael Uribe Uribe.
- Se solicitará el punto de Capital Salud en CAPS Diana Turbay para agilizar los trámites de autorización desde el área de mercadeo de la Subred centro Oriente
- Se validará espacios al interior del CAPS para entregar medicamentos, al igual que la garantía de la entrega de fichas del digiturno al interior de la Unidad.
- Se gestionará carta del préstamo del salón comunal vencedores del barrio Diana Turbay como punto de vacunación humana sin remuneración.

Arquitecto Inti Rojas responde frente a la solicitud de pavimentar el andén hasta la Virgen, que no está contemplado en este convenio por lo tanto no se puede contemplar esta posibilidad.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/ DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
16/06/2022	SEGUIMINETO COSNTRUCCION CAPS DIANA TURBAY	7:30 am	10:30 am

Dr. John Edison Cortés informa que se socializará el portafolio de servicios donde esté incluido los puntos para atención de felinos y caninos de la Subred Centro Oriente.

Dra. María Yolanda Camelo informa que desde la referente de participación comunitaria de la localidad Rafael Uribe Uribe se socializará el portafolio de servicios y desde la oficina de servicio al ciudadano se garantizará la fila de atención prioritaria demarcada.

Dra. Marcia Guacaneme informa que la plataforma Colibrí es responsabilidad de la oficina de Desarrollo Institucional y allí se encuentran las evidencias de los compromisos, en este momento está pendiente cerrar el compromiso de la ambulancia.

Compromisos

- ✓ En el acto de inauguración del centro de salud Diana Turbay se tendrá en cuenta la participación de los líderes comunitarios
- ✓ Se tramitará el punto wifi con el Secretario Distrital de Salud
- ✓ Realizar acercamiento con las EAPB del régimen contributivo para concertar alianzas estratégicas y prestar los servicios a personas con aseguramiento contributivo.
- ✓ Gestionar carta del préstamo del salón comunal vencedores del barrio Diana Turbay como punto de vacunación humana sin remuneración.
- ✓ Solicitar el punto de Capital Salud en CAPS Diana Turbay para agilizar los trámites de autorización.

Siendo las 10:30 am se da por terminada la mesa de trabajo



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO


CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/ DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
16/06/2022	SEGUIMINETO COSNTRUCCION CAPS DIANA TURBAY	7:30 am	10:30 am

4. Compromisos Establecidos y Responsables

Qué  Tarea o Actividad	Quién  Responsable	Cuándo  Fecha límite	Observaciones	
			Si	No
En el acto de inauguración del centro de salud Diana Turbay se tendrá en cuenta la participación de los líderes comunitarios	Gerencia de la subred Centro Oriente y Oficina de Participación social y servicio al ciudadano			
Se tramitará el punto wifi con el Secretario Distrital de Salud	Gerencia de la subred Centro Oriente y Secretario Distrital de Salud			
Realizar acercamiento con las EAPB del régimen contributivo para concertar alianzas estratégicas y prestar los servicios a personas con aseguramiento contributivo.	oficina de mercadeo de la Subred Centro Oriente			
Gestionar carta del préstamo del salón comunal vencedores del barrio Diana Turbay como punto de vacunación humana sin remuneración.	Oficina de Participación social y servicio al ciudadano con Plan de Inmunización ampliada			
Solicitar el punto de Capital Salud en CAPS Diana Turbay para agilizar los trámites de autorización.	Área de mercadeo de la Subred Centro Oriente			

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SALUD <small>Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.</small>	<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b>	<b>CÓDIGO: ET-CO-FT-001 VERSIÓN: 03 FECHA: 2022-05-27</b>
	<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>	

<b>FECHA AÑO/MES/ DÍA</b>	<b>NOMBRE DE LA REUNIÓN</b>	<b>HORA INICIO</b>	<b>HORA FINAL</b>
<b>16/06/2022</b>	<b>SEGUIMINETO COSNTRUCCION CAPS DIANA TURBAY</b>	<b>7:30 am</b>	<b>10:30 am</b>

<b>5. Asistencia</b>				
<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>Cargo</b>	<b>Área (unidad)</b>	<b>Correo</b>	<b>Firma</b>

INFORMACION GENERAL

PROCESO Y/O DEPENDENCIA: Proyecto Infraestructura  
 UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD: IPS Dorcas Turbay  
 TEMA: Seguimiento Vecindario  
 RESPONSABLE: Slavica T. Herrera

FECHA: 16/06/2022  
 HORA DE INICIO: 8:00 am  
 HORA DE FINALIZACION: 10:00 am  
 FIRMA: [Signature]

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	EPS	TELÉFONO DE CONTACTO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Francisco Bario	19729501	Nueva	3004018081	Padrivis753@hotmail.com	[Signature]
2	Clara Hernandez	52207216	NEPS	3207663892	llav-@1967.com	[Signature]
3	Carlos Julio Pineda	4299852	Capital Salud	3128560542	taefap@atare.com	[Signature]
4	Jairo H. Niño	4167001	Famisanar	3009807262	amendiaceout@bks.es	[Signature]
5	Harold Leon	79330789	Sanitas	3203450268	haroldleon214@gmail.com	[Signature]
6	Paulette Guavara	80'807 835	Famisanar	302 45326 10	edsscmng@gmail.com	[Signature]
7	Pedro Gazon	334962	Comparar	3118594948	petrogazon@hotmail.com	[Signature]
8	José Daniel García	86001955	Capital Salud	312544452	pd9568@hotmail.com	[Signature]
9	Mario Emilio Baig	12271069	Sanitas	321736972	marioemilio384@hotmail.com	[Signature]
10	Jose Tito Arevalo	4710604	Capital Salud	3142190444		[Signature]
11	Heriberto Riano	4426234	Sanitas	3207892310		[Signature]
12	Angelica Fandera	52205227	Famisanar	3193973492	angelica3000@gmail.com	[Signature]

INFORMACIÓN GENERAL


PROCESO Y/O DEPENDENCIA: Proyecto Infraestructura  
 UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD: CHPS Deorro Tubuy  
 TEMA: Seguimiento y evaluación  
 RESPONSABLE: Blanca J. Herrera



FECHA: 16/06/2022  
 HORA DE INICIO: 8:00 am  
 HORA DE FINALIZACIÓN: 10:00 am  
 FIRMA: [Firma]

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	EPS	TÉLEFONO DE CONTACTO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Yara Placido Hleho	41.755.570	FAMILIAR	3143923492	araylacasoo@gmail.com	[Firma]
2	Jala Sgarcel	30913619	Capital	3915151615	jalasgarcel@gmail.com	[Firma]
3	Hna Rosa Taylor	41.486935	Capital S.	3123129303	[Firma]	[Firma]
4	José Antonio Esté	3046869		3920492999	estepila@gmail.com	[Firma]
5	José D. Valencia	8304292	CAPITAL S.	3407759178	[Firma]	[Firma]
6	Thoreo Tacuo Chivito	41587573	NEU CAS	3146951869	[Firma]	[Firma]
7	Evelio Vasquez	19.255.469	sonías.	314217593	evelio1354@gmail.com	[Firma]
8	Herrera Celis	3467924	Capital S.	3124827903	celis1968@gmail.com	[Firma]
9	Hoberf Guerrero L.	14.218.705	compensarsps.	311844661	hobrabrdr@gmail.com	[Firma]
10	Yiquia Rosa Ros	5306049	SUNAS	3023348034	yurucuburorealcumban@gmail.com	[Firma]
11	Pamela Nolasco	5144938	compensa	3112934660	nolasco@gmail.com	[Firma]
12	Marcia Greivy Guacamal	5050028	compensa	3045025033	greivyg@bol.com.ve	[Firma]



INFORMACIÓN GENERAL

PROCESO Y/O DEPENDENCIA:	Proyecto Infraestructura	FECHA:	16/06/2022
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD:	CHPS Dama Turbay	HORA DE INICIO:	8:00 am
TEMA:	Seguimiento Kedslink	HORA DE FINALIZACIÓN:	10:00 am
RESPONSABLE:	Slavica J. Berroa	FIRMA:	

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	EPS	TELÉFONO DE CONTACTO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Indi Gabriel Reyes	1611751615	SUR A	33333333	Corporacion hospital @alrededordeamulegramas	
2	Mallia yobudai Du	51629753	Compuas	3124475309	Palmarqueasa y Solido	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

# PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

## Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

Junio - 2022

# CAPS DIANA TURBAY

CONVENIO 1018-2017

Subred Integrada de Servicios de Salud  
Centro Oriente E.S.E



Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
Centro Oriente E.S.E.

#SubredCOMásCercaDeTi



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE  
SALUD

BOGOTÁ

# CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1018-2017

## CAPS DIANA TURBAY

<b>OBJETO:</b>	Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto Construcción y Dotación CAPS Diana Turbay
<b>Valor del Convenio INICIAL:</b>	\$ 162.687.957
<b>ADICIONES:</b>	
<b>Adición 1: 23/05/2018</b>	\$ 57.422.450
<b>Adición 2: 28/08/2019</b>	\$ 36.464.460
<b>Adición 3 (obra e interv.): 06/11/2019</b>	\$ 13.123.910.432
<b>Adición 4 (PAPSO): 29/12/2020</b>	\$ 284.886.873
<b>Adición 5:15/10/2021</b>	\$3.071.500.763
<b>Adición 6 (Dotación): 29/11/2021</b>	\$2.376.426.678
<b>Adición 7 (obra e interv.): 31/mayo/2022</b>	\$1.085.989.407
<b>VALOR ACTUAL DEL CONVENIO:</b>	<b>\$20.199.289.020</b>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:</b>	<b>10/03/2023</b>

**Nota:** El convenio contempla los recursos para los Contratos de Estudios y diseños y el Contrato de Obra, con sus respectivos Contratos de Interventoría; así como los recursos para la Dotación de Equipos Biomédicos y de Mobiliario.

# CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA CAPS DIANA TURBAY

## CONTRATO DE OBRA

**Contrato No.** 02-BS-020-2020,

**Contratista:** CONTEIN SAS.

**Fecha de firma acta de inicio:** 18/08/2020

**Valor inicial:** \$12.036.415.438

**Adición 1 PAPSO:** \$ 272.724.998

**Adición No. 2:** \$ 2.744.087.138

**Adición No. 3:** \$ 887.400.157

**Valor Actual:** \$ 15.940.627.731

**Fecha finalización :** Julio 30 2022

## CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**Contrato No.** 02-BS-021-2020

**Contratista:** Consorcio Salud MB

**Fecha de firma acta de inicio:** 18/08/2020

**Valor inicial:** \$952.476.000.

**Adición 1 PAPSO:** \$ 12.161.875

**Adición No. 2:** \$327.413.625

**Adición No. 3:** \$ 178.589.250

**Valor Actual:** \$ 1.470.640.750

**Fecha finalización :** Agosto 31 2022

**Nota:** Es de aclarar, que la Puesta en Funcionamiento del Centro de salud Diana Turbay se proyecta para el 31 de agosto de 2022

# SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA CAPS DIANA TURBAY

AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	AVANCE DE OBRA EJECUTADO	ATRASO
97,30%	93,26%	-4,04%

## ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO

- Se finaliza la construcción de muros internos y externos
- Se finaliza la aplicación del Pañete y Pañete impermeabilizado sobre muros en bloque.
- Se finaliza lavado de Fachadas.
- Se continua la aplicación de Estuco y Pintura sobre los muros.
- Se continua la Instalación de enchapes de pisos y muros
- Se continua Instalación de tubería RCI, Instalación de la tubería hidrosanitarias, Instalación de ductos de ventilación mecánica, Instalaciones eléctricas e Instalaciones de Gases Medicinales.
- Se continua la Instalación de estructura para el montaje del cielo raso
- Se inicia instalación de ventanería de Fachadas.
- Se inicia la instalación de placa yeso en cielo raso
- Se continua la Demolición de roca y retiro en el área del muro de Contención.
- Se continua Amarre de acero para trincheras del Muro de Contención, para continuar con la fundición en concreto.
- Se inicia Excavación y Amarre de Cuarto de Maquinas, para continuar con la fundición en concreto.
- Se inician actividades de Exteriores (compactación de terreno, bordillos, sardineles,...)
- Se inicia compactación de Contrapiso de Sótano, para dar inicio de amarre de aceros para posterior fundición.

Nota: Información de avance con corte al 12 de junio de 2022

# SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA CAPS DIANA TURBAY

Registro Fotográfico al 08 de mayo del 2022



Avance de acabados en pisos y cielos



Avance instalación de redes



Avance instalación de ventaneria en fachada



Avance instalación enchapes



Avance instalación enchapes



Avance de construcción de tanques



Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
Centro Oriente E.S.E.

#SubredCOMásCercaDeTi



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE  
SALUD



# SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA CAPS DIANA TURBAY

Registro Fotográfico al 15 de mayo del 2022



Avance Muro de contención.



Avance de acabado de Foso de Ascensores.



Limpieza para inicio de Exteriores



Avance de acabados en pisos y cielos



Avance de acabados en pisos y cielos



Avance instalación de redes



Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
Centro Oriente E.S.E.

#SubredCOMásCercaDeTi



SECRETARÍA DE  
SALUD





# SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA CAPS DIANA TURBAY

Registro Fotográfico al 22 de mayo del 2022



Avance de urbanismos



Avance de urbanismos



Avance de acabados en pisos y cielos



Avance de acabado de escalera principal



Avance de Fundición de Muro Contención.



Avance instalación de redes.



Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
Centro Oriente E.S.E.

#SubredCOMásCercaDeTi



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE  
SALUD



# SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA CAPS DIANA TURBAY

Registro Fotográfico al 29 de mayo del 2022



Excavación y Perfilado de terreno  
ULTIMA trinchera.



Compactación de Sótano  
Para armado de contrapiso



Avance de suministro e instalación de  
ductos de Aires Acondicionados



Avance en Urbanismo.



Avance de acabados en pisos y  
cielos



Avance de Cuarto de Maquinas



Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
Centro Oriente E.S.E.

#SubredCOMásCercaDeTi



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE  
SALUD



# SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA CAPS DIANA TURBAY

Registro Fotográfico al 05 de junio del 2022



Lavado, sellado e Impermeabilizado de Fachada



Instalación de Puertas metálicas



Avance de ultima trinchera del  
Muro de Contención



Avance en Urbanismo.



Instalación de Red de Ventilación Mecánica



Avance de Urbanismos



Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
Centro Oriente E.S.E.

#SubredCOMásCercaDeTi



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE  
SALUD



# SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA CAPS DIANA TURBAY

Registro Fotográfico al 12 de junio del 2022



Avance de Acabados



Avance de acabados en Pisos



Avance de lavado y sellado de Fachada



Avance de Acabados.



Avance de acabados en Pisos



Avance de Urbanismo

# SEGUIMIENTO AL AVANCE DE DOTACIÓN CAPS DIANA TURBAY

- Contrato Interadministrativo No. 02-BS-0149-2021 EGAT - DOTACIÓN DIANA TURBAY . VALOR: \$ 2.376.156.491

**ADENDA No. 04**  
**(31 de mayo de 2022)**  
**INVITACIÓN A SUBASTA INVERSA No ISI-004-2022**

**OBJETO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS CAPS ALTAMIRA, BRAVO PAEZ Y DIANA TURBAY DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E"**

	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>FECHA</b>	<b>LUGAR</b>
1	Plazo para subsanar y presentar observaciones al informe de evaluación	Hasta el 6/06/2022	SECOP II
2	Respuesta a observaciones al informe de evaluación	13/06/2022	SECOP II
3	Publicación listada de proponentes habilitados	14/06/2022	SECOP II
4	Apertura del sobre económico	15/06/2022 08:00 a.m.	SECOP II
5	Subasta Inversa Electrónica	16/06/2022 8:00 a.m. al 21/06/2022 5:00 p.m.	SECOP II
6	Subsanación Precios artificialmente bajos	22/06/2022 hasta 2:00 p.m.	SECOP II
7	Recomendación de adjudicación	28/06/2022	SECOP II
8	Publicación de la adjudicación o de declaratoria de desierta.	30/06/2022	SECOP II





**Subred**co  
Cerca de ti

**GRACIAS**

*Síguenos en nuestros canales digitales*



Twitter  
@SubRedCentroOri



Instagram  
subred\_centrooriente



Facebook  
subredcentrooriente



YouTube  
Subred Centro Oriente



Telegram  
Subred CO Más Cerca de ti



LinkedIn  
Subred Centro Oriente



Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
Centro Oriente E.S.E.



SECRETARÍA DE  
SALUD

