

CÓDIGO: ET-CO-FT-001 VERSIÓN: 03 FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/ DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
21/04/2022	SEGUIMINETO COSNTRUCCION CAPS DIANA TURBAY	2:00 pm	5:00 pm

Proceso, área que lidera la reunión	Nombre de quien elabora el acta
Desarrollo Institucional y Participación Comunitaria - Servicio al Ciudadano	Blanca T. Henao

1. Objetivo de la reunión:

Acompañamiento a la veeduría especializada del CAPS Diana Turbay en el seguimiento a la construcción, ampliación, dotación y puesta en funcionamiento del CAPS Diana Turbay de la Subred Centro Oriente

2. Temas a tratar:

- ✓ Bienvenida e instalación de la mesa de trabajo
- ✓ Lectura y aprobación orden del día
- ✓ Presentación de las Reglas de Oro para el desarrollo de la Reunión
- ✓ Presentación de los asistentes11
- ✓ Seguimiento a compromisos del proyecto de infraestructura
- ✓ Intervención de la comunidad
- ✓ Intervención de entes de control
- ✓ Respuesta institucional
- √ Compromisos
- √ Varios
- ✓ Cierre

3. Desarrollo:

- Instalación de la mesa de trabajo: Siendo las 2:45 p.m., el referente de Veeduría Distrital solicita iniciar la mesa de trabajo y manifiesta a los asistentes analizar y concertar conducta a seguir frente a un posible aplazamiento de la mesa, teniendo en cuenta la hora donde han transcurrido 45 minutos de la hora programada, situación presentada por la ausencia de la Subred Centro Oriente, en este momento la referente de participación comunitaria y líder de unidad de Diana Turbay se presentan informando que se tiene presencia de la entidad desde la hora programada, sin embargo los referentes de las oficinas de Desarrollo Institucional están en camino y son los que tienen la delegación de Gerencia de suministrar la información.
- El Sr. Smith Morera saluda a las personas que están presentes en esta mesa de trabajo de manera presencial y a través de Facebook Life a la ejecución de la misma teniendo en cuenta que los referentes delegados de la Subred hacen su arribo a la reunión,
- El Sr. Mauricio Guevara líder integrante de la Veeduría especializada da inicio a la mesa de trabajo siendo las 3; 00 p.m., con la llegada de la doctora Marcia Guacaneme delegada









CÓDIGO: ET-CO-FT-001 VERSIÓN: 03 FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/ DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
21/04/2022	SEGUIMINETO COSNTRUCCION CAPS DIANA TURBAY	2:00 pm	5:00 pm

de gerencia de la Subred Centro Oriente E.S.E., y demás personal administrativo. A su vez socializa el orden del día y presenta al moderador de esta mesa Sr. Smith a quien da la palabra

El Sr. Smith Morera informa la metodología para el desarrollo de la mesa de trabajo la cual esta centrada en los compromisos adquiridos desde la Subred Centro Oriente y Secretaria Distrital de Salud, posterior a ello socializa el orden del día

Presentación de las Reglas de Oro para el desarrollo de la Reunión

El moderador de la mesa Sr. Smith Morera realiza presentación de las reglas de oro y protocolos de bioseguridad

- Presentación de los asistentes: El Sr. Smith Morera solicita a los participantes realizar su presentación evidenciando las siguientes situaciones:
 - ✓ Asistencia de 11 líderes sociales de manera presencial
 - ✓ Personero de la Localidad Rafael Uribe Uribe
 - ✓ Referente de Veeduría Distrital
 - ✓ Profesionales de la Subred Centro Oriente E.S.E.: Delegada de Gerencia: Dra. Marcia Guacaneme; Líder de la unidad Diana Turbay; Dos profesionales de la oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano y Arquitecto de la Subred Centro Oriente
 - ✓ Referente de Interventoría del proyecto de infraestructura
 - ✓ Gestor institucional de Control Social de Secretaria Distrital de Salud.



 Contextualización de las mesas de trabajo: El Señor Mauricio Guevara realiza contextualización de las Mesas de trabajo que se han desarrollado en este proyecto, al igual que los compromisos pactados sobre la construcción, ampliación, dotación y puesta en funcionamiento del CAPS Diana Turbay de la Subred Centro Oriente, haciendo énfasis en los siguientes aspectos:









CÓDIGO: ET-CO-FT-001 VERSIÓN: 03 FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/ DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
21/04/2022	SEGUIMINETO COSNTRUCCION CAPS DIANA TURBAY	2:00 pm	5:00 pm

Construcción

- Qué pasa con el tanque de agua de emergencia?
- Cuál es el tiempo del muro de contención?

Dotación

 Se solicita información sobre avances del estudio de mercado de los equipos de dotación cómo su instalación y buen funcionamiento.

Funcionamiento

- Se solicita información sobre la planta de personal a atender en el CAPS Diana Turbay.
- Cómo es el proceso de recepción y elección de Hojas de Vida
- Se solicita trabajo interinstitucional con los vendedores informales como problema de salud pública en el territorio

A nivel general

- Solicita tener actualizada la plataforma colibrí
- Solicitar y realizar visita al interior de la obra
- Intervención de la comunidad: El moderador de la mesa Sr. Smith Morera abre el espacio para la interlocución de la comunidad con dudas y preguntas en relación a los avances del proyecto de infraestructura CAPS Diana Turbay, lográndose las siguientes intervenciones:
 - Señora Lola Legarda manifiesta la importancia del cumplimiento de estos compromisos por parte de la Subred Centro Oriente E.S.E.
 - Ciudadano: No se ha presentado la maqueta del CAPS Diana Turbay y no está ubicada la ambulancia básica en este sitio.
 - Sr Smith Morera manifiesta que el compromiso de presentar la maqueta del CAPS Diana Turbay, no se ha generado.
 - Señor Mauricio Guevara solicita información sobre el servicio de Ruta de la Salud
- Intervención de entes de control
 - Referente de Veeduría Distrital hace referencia a la puntualidad en el inicio de la mesas de trabajo programadas
 - El Personero local orienta su intervención con relación a una reflexión sobre la importancia de trabar conjuntamente para tener resultados de manera eficiente tanto a nivel institucional como comunitaria.









CÓDIGO: ET-CO-FT-001 VERSIÓN: 03 FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/ DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
21/04/2022	SEGUIMINETO COSNTRUCCION CAPS DIANA TURBAY	2:00 pm	5:00 pm

• Respuesta institucional de la Subred Centro Oriente

Doctora Marcia Guacaneme informa los siguientes avances del Convenio 1018 – 2017, proyecto infraestructura CAPS Diana Turbay con el arquitecto Inti Rojas dando respuesta a las preguntas antes mencionadas:

Recomienda a la ciudadanía, consultar el contrato en el SECOP donde se encuentra la información que están solicitado

- Contrato de obra
- Contrato de interventoría
- Solicitud de Adición, Modificación y Prorroga al Convenio Interadministrativo No. 1018 de 2017, para Adición y Prórroga al Contrato de Interventoría No. 02-BS-021-2020 y al Contrato de Obra No. 02-BS-020-2020.
- Porcentaje de avance de obra: avance de obra ejecutado
- Se finaliza la construcción de muros internos y externos
- Se finaliza la aplicación del Pañete y Pañete impermeabilizado sobre muros en bloque.
- Se continúa la aplicación de Estuco y Pintura sobre los muros.
- Se continua la Instalación de enchapes de pisos y muros
- Se continua Instalación de tubería RCI, Instalación de la tubería hidrosanitarias, Instalación de ductos de ventilación mecánica, Instalaciones eléctricas e Instalaciones de Gases Medicinales.
- Se inicia la Instalación de marcos para puertas
- Se inicia lavado de Fachadas.
- Se inicia instalación de ventaneria de Fachadas.
- Se continua la Instalación de estructura para el montaje del cielo raso
- Se continúa la Demolición de roca y retiro en el área del muro de Contención.
- Se continúa Amarre de acero para el tanque de RCI, fosos eyectores, para continuar con la fundición en concreto.
- Se continúa Amarre de acero para trincheras del Muro de Contención, para continuar con la fundición en concreto.
- Se continua Amarre de acero para Tanque de RCI, para continuar con la fundición en concreto
- Registro Fotográfico; Marzo 13, 20, 28 y Abril 10 y 17 de 2022










CÓDIGO: ET-CO-FT-001 VERSIÓN: 03 FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/ DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
21/04/2022	SEGUIMINETO COSNTRUCCION CAPS DIANA TURBAY	2:00 pm	5:00 pm

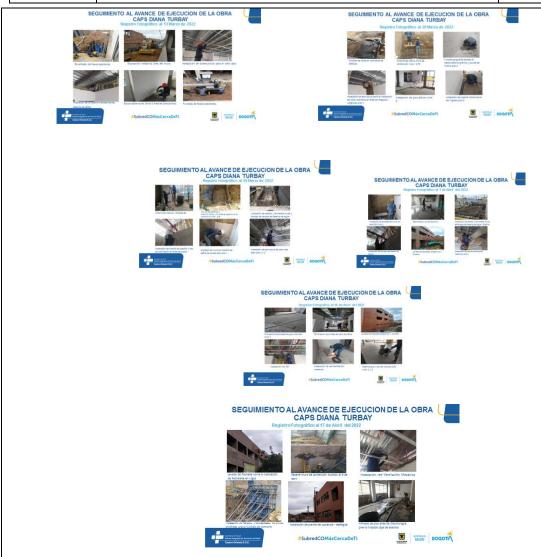

Y culminan su intervención socializando sobre la dotación equipo biomédico y mobiliario la siguiente información:

Convenios interadministrativos suscritos

- Contrato interadministrativo # 02-bs-0149-2021 EGAT dotación Diana Turbay
- Resumen valores actualizados
 - equipo biomédico: \$ 2.105.766.425
 - equipo mobiliario: \$ 270.390.066
 - totales: \$ 2.376.156.491









CÓDIGO: ET-CO-FT-001 VERSIÓN: 03 FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/ DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
21/04/2022	SEGUIMINETO COSNTRUCCION CAPS DIANA TURBAY	2:00 pm	5:00 pm

- El mes de adjudicación estimado es junio de 2022

Doctora Lilian Meneses, Líder del CAPS Diana Turbay y CAPS Chircales manifiesta que el sitio de contingencia cuenta con el servicio de ambulancia de manera permanente, no obstante al trasladarse a prestar un servicio, la comunidad la deja de visibilizar.

- Referente de Interventoría: Socializa su rol frente a la interventoría haciendo énfasis en los siguientes aspectos:
 - Cumplimiento de la planeación de la Subred Centro Oriente y contratista evidenciado en la entrega de informes puntuales en los temas de avances de la obra y acompañamiento a la ciudadana en su sensibilización propia a lo pactado en norma que rige estos proyectos de infraestructura.
 - Los requisitos para realizar visita ciudadana al interior de la obra son:
 - 6 veedores en estado de salud satisfactorio
 - Utilizar botas y casco
 - Tener ARL
 - Se puede tomar fotos y videos
 - Recorrido por los sitios culminados de la obra
- El referente de Control Social de la Secretaría Distrital de Salud Hederson Gualteros Téllez, manifiesta que consultará la viabilidad de realzar trabajo interinstitucional para el tema de los vendedores informales como problema de salud pública en el territorio

Compromisos y cierre

El Sr. Mauricio Guevara, precisa las siguientes recomendaciones a la Subred Centro Oriente:

- Informar el procedimiento del servicio de Ruta de la Salud previa ilustración de casos de la ciudadanía con dificultades frente a este servicio.
- Tener actualizada la plataforma colibrí
- Realizar visita al interior de la obra
- Informar correo electrónico para recepcionar Hojas de Vida de la ciudadanía interesada en trabajar en la obra y en la prestación del servicio previo cumplimiento de requisitos.
- Propone realizar mesa de trabajo intersectorial con comerciantes y vendedores ambulantes









CÓDIGO: ET-CO-FT-001 VERSIÓN: 03 FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/ DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
21/04/2022	SEGUIMINETO COSNTRUCCION CAPS DIANA TURBAY	2:00 pm	5:00 pm

Frente al compromiso de gestionar visita a la obra, se concertó lo siguiente: Realizar 2 visitas, en el siguiente periodo de tiempo::

- Fecha finalizando el mes de mayo o junio
- Fecha antes de entrega de obra

Tareas:

- Enviar a la Subred, Listado de líderes de la veeduría especializada con numero de cedula y carne de ARL

Siendo las 5:00 pm se da por terminada la mesa de trabajo









CÓDIGO: ET-CO-FT-001 VERSIÓN: 03 FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/ DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
21/04/2022	SEGUIMINETO COSNTRUCCION CAPS DIANA TURBAY	2:00 pm	5:00 pm

4. Compromisos Establecidos y Respon	sables				
Qué	Quién	Cuándo			Observaciones
Tarea o Actividad	Responsable	Fecha límite	Si	No	
Informar el procedimiento del	Oficina				
servicio de Ruta de la Salud	Participación				
	social y				
	servicio al				
	ciudadano				
Tener actualizada la plataforma	Oficina				
colibrí	Desarrollo				
	Institucional				
Gestionar visita al interior de la	Oficina				
obra	Participación				
	social y				
	servicio al				
	ciudadano				
Informar correo electrónico	Oficina				
para recepcionar Hojas de Vida	Participación				
de la ciudadanía interesada en	social y				
trabajar en la obra y en la	servicio al				
prestación del servicio previo	ciudadano				
cumplimiento de requisitos. Propone realizar mesa de					
· •	Secretaria				
,	Distrital de				
•	Salud				
	Veeduría				
•					
•	ospedializada				
comerciantes y vendedores ambulantes Listado de líderes de la veeduría especializada con numero de cedula y carne de ARL					









CÓDIGO: ET-CO-FT-001 VERSIÓN: 03 FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/ DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
21/04/2022	SEGUIMINETO COSNTRUCCION CAPS DIANA TURBAY	2:00 pm	5:00 pm

5. Asistencia				
Nombres y Apellidos	Cargo	Área (unidad)	Correo	Firma









No

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL

> Revisado por: Sandra P. Caycedo H. Elaborado por: Fanny Ramón



Escaneado con CamScanner

Hora Inicio: 02:00 pm Hora Fin: 05:00 pm Lugar: 1EO. Tema: Mesor de Diálogo LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES COMUNITARIAS Centro de Salud Diana Turban Código: SDS-GSS-FT-050 V.1 Colombia Aprobado por: Juan Alvarado Solano Fecha: 21-04-2022

0	NOMBRE	DOCUMENTO	LOCALIDAD TELÉFONO/CORREO FIRMA
1	Efran Assala	77707820	Ratellin Thankowith
2	barlos Astura Nemocia Rosas 19257721	19257721	Rubice Onibe Carlosnemocing annitum Godys A Mymocin P.
ω	Andelica doucles thanka 52245 227	52295227	
4	and Monades Auderstan	St755520	1
5	Gro Hord Angolu	4, 70-604	Statoal Unise
0	Ose May fely 2	801/3298	Rufal Viby manda HER gradus Por
7	and Moreva	1031156231	
00	TO [DOWN WONED SICHERS A	SIGHABA	paper unte l'ido-saissa short Angel
9	Lela Landa	20712619	preservation for by forthe Cacefreel
10	11	80072032	DPSGTYT-SOS Mobileros Dealer Sapital Taleder.
11	Slance I Henso	51741057	Paper UShe Bell School of
12	Hector Whio dara A.	3/24 62 05 10	Refore 1 U. U. hyana veeduria distrible 421
13	Santiago Vivas	1003557535	RWVI 1050 and it comes Addition Addition
14	Jain Herwandez	19.202.843	5D.5. lajhernonder@salideapitot.gov.co /key
15	VESTOR RAMOS S	79.409.457	RUU pramos @ persepersapogota gous o
16	Diana Milesa Police C	40047557	Rafter Unite directors characteristican co (ANO)
17			
O	A: Autorizo expresamente a la Secretaria Distrital de S	Salud y el Fondo Financiero Distrital	NOTA: Autorizo expresamente a la Secretaría Distrital de Salud y el Fondo Financiero Distrital de Salud, para hacer uso y tratamiento de mis datos personales de conformidad con lo previsto en

NOTA: Autorizo expresamente a la Secretaría Distrital de Salud y el Fondo Financiero Distrital de Salud, para hacer uso y tratamiento de mis datos personales de conformidad con lo previsto en el Decreto 1377 de 2013 que reglamenta la Ley 1581 de 2012 y de acuerdo con la Política de protección y tratamiento de datos personales de la Secretaría Distrital de Salud y el Fondo Financiero de Salud.



Seguimiento Proyectos de Infraestructura Centro de Salud diana Turbay

Veeduría Especializada CAMI Diana Turbay

> OFICINA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO

> > 21/04/2022

#SubredCOMásCercaDeTi








Orden del Día

- Bienvenida e instalación de la mesa de trabajo
- Lectura y aprobación orden del día
- Presentación de las Reglas de Oro para el desarrollo de la Reunión
- Presentación de los asistentes
- Contextualización de las mesas de trabajo
- Seguimiento a compromisos del proyecto de infraestructura
- Intervención de la comunidad
- Intervención de entes de control
- Respuesta institucional
- Compromisos
- Varios
- Cierre













REGLAS DE ORO

- 1. Mantener el diálogo con intervenciones propositivas, respetuosas y creativas.
 - 2. Escuchar activamente cada intervención
- 3. No retirarse el tabocas durante toda la jornada, en especial al momento de realizar intervenciones
- 4. Mantenga en silencio el micrófono y actívelo en el momento de su intervención para evitar interferencias
 - 5. Solicite la palabra por el chat virtual











Presentación de los asistentes











Seguimiento a compromisos

CONSTRUCCION	FUNCIONAMIENTO
Qué pasa con el tanque de agua de emergencia?	Se solicita la planta de personal
Cuál es el tiempo del muro de contención?	Cómo es el proceso de recepción y elección de Hojas de Vida
	Se solicita trabajo interinstitucional con los vendedores informales como problema de salud pública en el territorio










Varios y compromisos

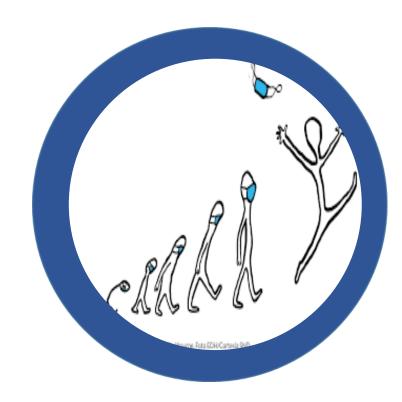

SDS: Se solicita trabajo interinstitucional con los vendedores informales como problema de salud pública en el territorio Visita a la obra:

- 6 veedores en estado de salud satisfactorio
- Botas y casco
- Listado con numero de cedula y carne de ARL
- Se puede tomar fotos y videos
- Firma acta de responsabilidad
- Se visitará recorrido completo

Visitas

Fecha finalizando el mes de mayo o junio Fecha antes de entrega de obra











Síguenos en nuestros canales digitales



Twitter @SubRedCentroOri



Facebook subredcentrooriente





Subred Centro Oriente



Telegram Subred CO Más Cerca de ti



Subred Centro Oriente











PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

Abril - 2022







CAPS DIANA TURBAY

CONVENIO 1018-2017

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E













CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA CAPS DIANA TURBAY

CONTRATO DE OBRA

Contrato No. 02-BS-020-2020

Contratista: CONTEIN SAS.

Valor inicial: \$12.036.415.438

Adición No. 1 PAPSO: \$ 272.724.998

Adición No. 2: \$ 2.744.087.138

Valor Total: \$15.053.227.574

Fecha de firma acta de inicio: 18/08/2020

Fecha finalización: Junio 30 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No. 02-BS-021-2020

Contratista: Consorcio Salud MB

Valor inicial: \$952.476.000.

Adición No. 1 PAPSO: \$ 12.161.875

Adición No. 2: \$ 327.413.625

Adición No. 3: \$ 178.589.250

Valor Total: \$ 1.470.640.750

Fecha de firma acta de inicio: 18/08/2020

Fecha finalización: Agosto 31 2022

Nota: Se encuentra en tramite Solicitud de Adición, Modificación y Prorroga al Convenio Interadministrativo No. 1018 de 2017, para Adición y Prórroga al Contrato de Interventoría No. 02-BS-021-2020 y al Contrato de Obra No. 02-BS-020-2020.











ΔVΔNC	F DF	ORRA	PROGR	AMADO
VAVIAC	JL UL	ODINA	11/001/	AIVIADO

89,13%

AVANCE DE OBRA EJECUTADO

88,26%

ATRASO	

-0,87%

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO

- Se finaliza la construcción de muros internos y externos
- Se finaliza la aplicación del Pañete y Pañete impermeabilizado sobre muros en bloque.
- Se continua la aplicación de Estuco y Pintura sobre los muros.
- Se continua la Instalación de enchapes de pisos y muros
- Se continua Instalación de tubería RCI, Instalación de la tubería hidrosanitarias, Instalación de ductos de ventilación mecánica, Instalaciones eléctricas e Instalaciones de Gases Medicinales.
- Se inicia la Instalación de marcos para puertas
- Se inicia lavado de Fachadas.
- Se inicia instalación de ventaneria de Fachadas.
- Se continua la Instalación de estructura para el montaje del cielo raso
- Se continua la Demolición de roca y retiro en el área del muro de Contención.
- Se continua Amarre de acero para el tanque de RCI, fosos eyectores, para continuar con la fundición en concreto.
- Se continua Amarre de acero para trincheras del Muro de Contención, para continuar con la fundición en concreto.
- Se continua Amarre de acero para Tanque de RCI, para continuar con la fundición en concreto.



Nota: Información de avance con corte al 17 de Abril de 2022









Registro Fotográfico al 13 Marzo de 2022



Encofrado de fosos eyectores.



Excavación mecánica área del muro.



Instalación de la estructura para el cielo raso



Instalación de la tubería hidrosanitarias batería de baños.



Estuco sobre muros (Nivel 3 Área de Consultorios)



Fundida de fosos eyectores.











Registro Fotográfico al 20 Marzo de 2022



Fundida de zarpa en concreto0 de 4000 psi



Amarre de Hierro muro de contención nivel - 3,75



Fundida de guarda escoba en media caña en granito y pulida del mismo piso 3



Instalación de estructura para la instalación del cielo raso falso en área de recepción Urgencias piso 1



Instalación de piso alfa en nivel



Instalación de tubería hidráulica en hall ingreso piso 2











Registro Fotográfico al 28 Marzo de 2022



Amarre de Hierros y fundida de



Instalación de tubería de presión y red de ventilación en área de ductos



Amuro pantalla nivel 1 marre de Hierro y fundida de zarpa muro de contención nivel - 2,75



Enchape de muros en batería de baños de la sala EDA piso 1



Instalación de testero y formaleta muros y fundida de tanque de Reserva de Agua -



Instalación de estructura de cielo raso falso piso 1 y 2












Registro Fotográfico al 1 de Abril del 2022



Instalación de enchape de muros en sala EDA nivel 1



Instalación de red de ventilación en ductos



Destronque y pulida de piso 2



Lavado de Fachadas costado Sur y Oriente



Instalación de testero y formaleta muros de tanque de Reserva de Agua - Exterior



instalación de red de ventilación mecánica piso 2











Registro Fotográfico al 10 de Abril del 2022



Finalización de enchape de pisos tipo alfa Nivel 3



Instalación de RCI



Terminación de armado de cielo raso falso



Instalación de red ventilación mecánica



Lavado de Fachada costado sur y oriente



Destronque y pulida de piso alfa nivel 2 y 3











Registro Fotográfico al 17 de Abril del 2022



Lavado de Fachada norte e Instalación de Fachaleta en vigas



Instalación de Testeros y formaleteado de muros trincheras previo fundido del elemento



Resane muro de contención fundido el 8 de abril



Instalación de planta de suplencia - desfogue



Instalación red Ventilación Mecánica



Afinado de piso área de Odontología, previo trazado caja de abastos













DOTACION EQUIPO BIOMEDICO Y MOBILIARIO









SEGUIMIENTO A LA DOTACION EQUIPOS BIOMEDICOS Y MOBILIARIO

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS

Contrato Interadministrativo No. 02-BS-0149-2021 EGAT - DOTACIÓN DIANA TURBAY

Resumen Valores Actualizados				
USS	EQ. BIOMEDICOS	EQ. MOBILIARIO	TOTALES	
Dotación Diana Turbay	\$ 2.105.766.425	\$ 270.390.066	\$ 2.376.156.491	

Nota: El mes de adjudicación estimado es Junio/2022.











Síguenos en nuestros canales digitales



Twitter @SubRedCentroOri



Facebook subredcentrooriente





Subred Centro Oriente



Telegram Subred CO Más Cerca de ti



Subred Centro Oriente







