



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. *RAD_S*

Fecha: *F_RAD_S*

****RAD S****

Página 1 de 5

Bogotá, D.C.

(Código de dependencia 652)

Doctora:

VIVIANA BARBERENA NISIMBLAT

Veedora Distrital

Avenida calle 26 No. 69-76 Edificio Elemento . Torreo 1 Piso 3

veeduria@veeduriadistrital.gov.co

Bogotá

Datos Notificación

Nombres/Apellidos: _____

No Identificación: _____

Fecha y Hora: _____

Nota: Los datos de este apartado solo serán diligenciados por la persona quien recibe este documento al momento de la notificación.

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA NO. 170-2022

REFERENCIA: Radicado FDLAN 20236510015862 del 17/03/2023

Respetada Doctora Barberena,

De acuerdo a su solicitud con el radicado del asunto donde solicita “..*Sírvase informar detalladamente a este Órgano de Control en que estado se encuentra el contrato 170 de 2022, así como las fechas previstas para la terminación de los segmentos viales pertenecientes al sector del Restrepo..*” amablemente damos reporte según la información reportada por la interventoría del proyecto y la información que reposa en el FDLAN

Respuesta: A la fecha del presente informe el contrato FDLAN 170 de 2022 se encuentra en ejecución de actividades físicas en los siguientes segmentos viales y de espacio público:

ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA

FRENTE DE OBRA CALLE 15 SUR ENTRE CARRERA 24 Y CARRERA 24B

Se realizó la instalación de señalización para actividades de obra, se continuo con el fresado de la carpeta asfáltica deteriorada llegando a un 50% del área del segmento vial

Alcaldía Local de Antonio Nariño

Calle 17 Sur No. 18 – 49

Código Postal: 111411

Tel. 4432490

Información Línea 195

www.antonionarino.gov.co

GDI-GPD-F094


Versión: 06

Vigencia: 15 de diciembre de 2022

Caso HOLA: 281893



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

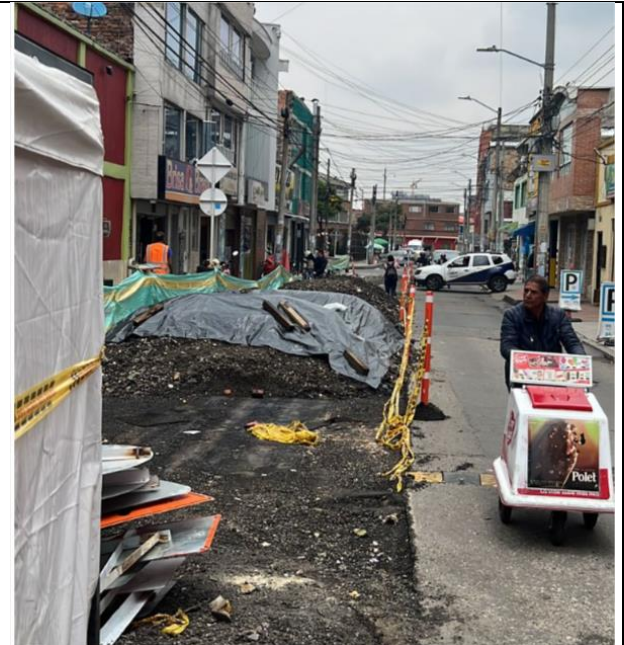

FRENTE DE OBRA CALLE 15 SUR ENTRE CARRERA 18 Y TRANSVERSAL 18 BIS

Se realizó la instalación de señalización para actividades de obra, se continuo con el fresado de la carpeta asfáltica deteriorada llegando a un 100% del área del segmento vial y se iniciaron las actividades de excavación y retiro de los materiales deteriorados el cual va en un 50%.





FRENTE DE OBRA INTERSECCIÓN TRANSVERSAL 24I CON CALLE 15 SUR

Se inicia la instalación de señalización para actividades de obra.



FRENTE DE OBRA ANDENES CARRERA 19 ENTRE CALLE 4 SUR Y CALLE 6 SUR COSTADO ORIENTAL

Se realizó la instalación de señalización para actividades de obra, se realizó la demolición de la superficie de tránsito al 100%, se realizó la excavación manual y transporte de material de excavación al 100%, se realizó la instalación de sardones y bordillos al 100% y se realizó la actividad suministro de material granular de relleno y compactación a nivel de la placa de concreto, se toman densidades y se esta a la espera del suministro y colocación del concreto como superficie de rodadura.



FECHAS PREVISTAS PARA ENTREGA FRENTES DE OBRA BARRIO RESTREPO

<u>DIRECCIÓN</u>	<u>TIEMPO</u>	<u>TIEMPO</u>
TV 24I CLL 16 S CLL 16A S	27/03/2023	10/04/2023
INTERSECCIÓN TV 24I CLL 15 S	21/03/2023	15/04/2023

CLL 15 S KR 24B KR 24	14/03/2023	14/04/2023
CLL 15 S KR 24 KR 22	20/04/2023	20/05/2023
CLL 15 S KR19 TV 18BIS	27/03/2023	29/04/2023
KR 24 G CLL 19 S CLL 20 S	08/05/2023	19/06/2023
DG 17C S KR 24 H - TV 24 H BIS	10/04/2023	17/04/2023
KR 24 C - CLL 13 S - DG 13 BIS S	24/04/2023	01/05/2023
KR 18 CLL 21 S - CLL 22 S	08/05/2023	15/05/2023
TV 24B CLL 13 S - KR 27	01/05/2023	08/05/2023
DG 13 BIS S KR 24 D BIS - KR 24 F BIS	27/03/2023	10/04/2023
CLL 18 S KR 24 B - KR 24	21/03/2023	15/04/2023

Cordialmente,

MÓNICA ALEJANDRA DÍAZ CHACÓN

Alcaldesa Local de Antonio Nariño

Alcalde.anarino@gobiernobogota.gov.co

Proyectó: Ing Manuel Eduardo Alvarez Vanegas- Profesional de Apoyo Oficina de Obras e Infraestructura FDLAN

Reviso / Aprobó: Ing Yenny Gutiérrez Castillo - Profesional Especializado Líder Oficina de Obras e Infraestructura FDLAN
