 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD <small>Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.</small>	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	CÓDIGO: ET-CO-FT-001 VERSIÓN: 03 FECHA: 2020-02-10
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	

FECHA AÑO/MES /DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2022/02/03	Reunión de seguimiento Veeduría Infraestructura Altamira	8:00 am	9:45 am

Proceso, área que lidera la reunión	Nombre de quien elabora el acta
Secretaria Distrital de Salud – Control Social Oficina Desarrollo Institucional Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano – Subred Centro Oriente E.S. E	Laura Murcia Profesional de Participación

1. Objetivo de la reunión:
Realizar acompañamiento a la reunión de seguimiento control y vigilancia con los integrantes de la Veeduría, en la ejecución del proyecto de infraestructura y ampliación del Centro de Salud Altamira

2. Temas a tratar:
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bienvenida y registro de asistentes.</li> <li>2. Presentación del objetivo de la reunión.</li> <li>3. Presentación de avances proyecto de infraestructura Centro de Salud Altamira</li> <li>4. Intervención de la comunidad</li> <li>5. Varios y cierre</li> </ol>

3. Desarrollo:
<p>Se inicia la reunión de manera presencial en el Centro de Desarrollo Comunitario La Victoria siendo las 8:00 am, contando lo asistencia de 8 ciudadanos veedores, Laura Murcia Rueda referente de participación social, doctora Marcia Graicy Guacaneme, jefe de Oficina Asesora de Desarrollo Institucional de la Subred Centro Oriente E.S.E. y su equipo de trabajo, se presenta excusa del profesional Henderson Walteros de Control Social de la SDS quien tuvo cruce de reunión.</p> <p>En donde, la doctora Marcia realiza presentación de cada uno de los profesionales que apoyan el desarrollo del proyecto de infraestructura Altamira, e inicia presentación de los avances del proyecto de infraestructura de Altamira.</p>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES /DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2022/02/03	Reunión de seguimiento Veeduría Infraestructura Altamira	8:00 am	9:45 am



**CAPS  
ALTAMIRA**

Convenio 1206-2017

Subred Integrada de Servicios  
Salud Centro Oriente E.S.E



#SubredCOMásCercaDeTi



SECRETARÍA DE  
SALUD



**Convenio Interadministrativo No.1206-2017**

**Objeto:** "Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto "Reordenamiento, Adecuación y Dotación CAPS Altamira"

**Valor del Convenio inicial:** \$223.031.565

**Aportes FFDS:** \$202.755.968

**Aportes ESE:** \$20.275.597

**ADICIONES:**

**Adición 1:** \$ 7.504.473

**Adición 2:** \$ 3.501.530.417

**Adición 3:** \$ 1.688.653.765

**Adición 4:** \$ 1.389.122.453

**Adición 5:** \$ 79.064.394

**Valor actual del convenio** \$ 6.888.907.067

**Fecha Suscripción:** 10/11/2017

**Fecha de inicio:** 27/11/2017

**Fecha de terminación actual:** 26/08/2023



#SubredCOMásCercaDeTi



SECRETARÍA DE  
SALUD



Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
**Centro Oriente E.S.E.**

Código: ET-CO-FT-001  
Versión: 03  
Fecha: 2020-02-10



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES /DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2022/02/03	Reunión de seguimiento Veeduría Infraestructura Altamira	8:00 am	9:45 am

SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA  
CAPS ALTAMIRA

CONTRATO DE OBRA

Contrato No. 02-BS-0072-2021  
Contratista: INGEBYP SAS  
Fecha de firma acta de inicio: 23/07/2021  
Valor Actual: \$ 4.674.340.642  
Fecha finalización Feb 22/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No. 02-BS-098-2021  
Contratista: LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S  
Fecha de firma acta de inicio: 23/07/2021  
Valor Actual: \$ 485.629.242  
Fecha finalización Feb 22 /2023

AVANCE DE OBRA EJECUTADO	AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	ATRASO
91,11%	92,90%	-1, 79%

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO

- Se da reinicio al contrato de obra e interventoría el 22 de diciembre de 2022.
- Se continúa con lijado de estuco y aplicación de pintura sobre muros interiores en primer piso y segunda mano de pintura en segundo piso.
- Se inició destroncado y pulida de granito en primer piso así como brillado en segundo piso.
- Se continúa con la instalación del ascensor, el cual tiene un avance del 60%
- Se programa por el contratista de obra entrega del piso 2 al 30 de enero de 2023
- Se firman actas de inicio de los contratos de dotación el 30 de diciembre de 2022 (14 contratos)



#SubredCOMásCercaDeTi



SECRETARÍA DE  
SALUD



EJECUCION FINANCIERA CONTRATO DE OBRA E  
INTERVENTORIA- ALTAMIRA

Contrato de Obra No. 02-BS-072-2021

	Valor	%
Valor actual contrato	\$ 4.674.340.642	100
Valor pagado	\$ 2.589.535.723	55
Saldo	\$ 2.084.804.919	45

Contrato de Interventoría No. 02-BS-098-2021

	Valor	%
Valor actual contrato	\$ 485.629.242	100
Valor pagado	\$ 306.683.329	63
Saldo	\$ 178.945.913	37



#SubredCOMásCercaDeTi



SECRETARÍA DE  
SALUD



Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
Centro Oriente E.S.E.

Código: ET-CO-FT-001  
Versión: 03  
Fecha: 2020-02-10



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES /DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2022/02/03	Reunión de seguimiento Veeduría Infraestructura Altamira	8:00 am	9:45 am


SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA  
CAPS ALTAMIRA



Limpieza de ladrillo y sellado de pañete de fachada



Instalación de aparatos eléctricos, puertas, porcelana sanitaria y pintura segunda mano

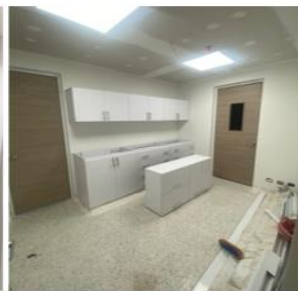

Instalación de muebles y pintura primera mano primer piso




#SubredCOMásCercaDeTi



SECRETARÍA DE  
SALUD




SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA  
CAPS ALTAMIRA

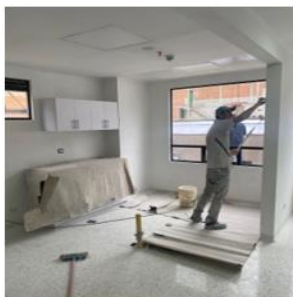

Pintura tercera mano en segundo piso



Instalación de mesones de baños y brillo de pisos

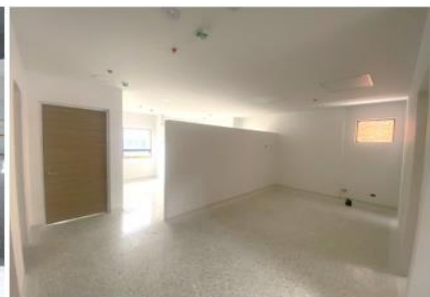

Aseo final tercer piso



#SubredCOMásCercaDeTi



SECRETARÍA DE  
SALUD



A lo anterior, la Dra. Marcia refiere que este mes de febrero se termina la obra y en marzo se inaugura.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES /DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2022/02/03	Reunión de seguimiento Veeduría Infraestructura Altamira	8:00 am	9:45 am

- Intervención de la comunidad.

El total de los asistentes veedores manifiestan inconformidad con la no información desde el inicio de no contar con el servicio de Urgencias. “Las Urgencias son vitales en Altamira, se debe revisar como creció la población”

La señora de Mery Ávila expresa “se jugó con la comunidad se quitó urgencias, se debe revisar y abrir el servicio, la comunidad nos dio representación como veedores para que la obra se realizara según las necesidades de la comunidad, por lo que lamento que no se cuenta con servicio de urgencia.”

La señora María Esperanza López manifiesta “se debe contar con urgencias o por lo menos primeros auxilios para la población de Altamira y tener ambulancia en el sitio permanente”.

A lo anterior, la Dra. Marcia manifiesta “ El objeto contractual del proyecto de infraestructura para el Centro de Salud De Altamira fue diseñado en el año 2017, bajo el modelo de Redes, según acuerdo 641, donde se reorganiza la prestación de servicios de salud, a lo cual responde esta obra, adicional a la calidad del terreno, el cual no permite una construcción mayor que permia contar con el espacio para la adecuación de un servicio de urgencias, resaltando que la veeduría nace en el 2021

Por otra parte, los asistentes solicitan para la próxima reunión contar con la asistencia de SDS, Subgerencia de Servicios de Salud, Ambulatorios, Servicio al Ciudadano, Desarrollo Institucional, para realizar:

1. Recorrido por el Centro de Salud Altamira.
  2. Reunión información Veeduría Altamira.
- Revisión y aclaración de la conformación de la Veeduría (resolución y actas de sesiones)
  - Socialización de los Servicios que se prestaran en el Centro Altamira.
  - Aclaración de no Servicios Urgencias en el Centro de Altamira.
  - Información de servicio de Ambulancias Subred Centro Oriente
  - Información de Servicios centro de salud Libertadores.
  - Recordatorio Inauguración Centro de Salud Altamira.

Por último, La Dra. Marcia Guacaneme sugiere próxima reunión 03/03/2023 a las 8:00 a.m. recorrido por el Centro de Salud Altamira, lo cual la comunidad acepta.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD

Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES /DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2022/02/03	Reunión de seguimiento Veeduría Infraestructura Altamira	8:00 am	9:45 am

EVIDENCIA REGISTRO FOTOGRÁFICO





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES /DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2022/02/03	Reunión de seguimiento Veeduría Infraestructura Altamira	8:00 am	9:45 am

4. Compromisos Establecidos y Responsables

Qué  Tarea o Actividad	Quién  Responsable	Cuando  Fecha límite	Observaciones	
			Si	No
Convocar a reunión mensual para realizar veeduría al proyecto de infraestructura del centro de salud de Altamira. Viernes 3 de marzo de 2022. Hora: 8:00 am	Participación Comunitaria	Marzo 2023		X



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES /DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2022/02/03	Reunión de seguimiento Veeduría Infraestructura Altamira	8:00 am	9:45 am

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	CÓDIGO: ET-CO-FT-001 VERSIÓN: 4 FECHA: 2022-02-27	
FORMATO ACTA DE REUNIÓN			
FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2023/02/03	Veeduría Altamira	8:00 AM	9:45

5. Asistencia

Nombres y Apellidos	Cargo	Área (unidad)	Correo	Firma
Nohemí Alicia López	presidenta Barrio Salud	Comunidad	nohemiac@saludcentrooriente.esse.gov.co	[Firma]
Maria Esperanza Lopez f	Vecedora de Altamira	Comunidad	esperanza.lopez@saludcentrooriente.esse.gov.co	[Firma]
Daniela Torres Vargas	Integrante	Salud Activa	danielatorresvargas@saludcentrooriente.esse.gov.co	[Firma]
JUAN RODRIGUEZ G. C.	control social	Asesoría	juanrodriguez@saludcentrooriente.esse.gov.co	[Firma]
Luz Mary Avila G.	control social	Asesoría	luzmaryavila@saludcentrooriente.esse.gov.co	[Firma]
Joaquín Albarraquín	ASO VICTORIA	Asociación	albarraquin@saludcentrooriente.esse.gov.co	[Firma]
Julio Carballo	USUARIOS	Asociación	carballo@saludcentrooriente.esse.gov.co	[Firma]
Carlos Alberto Rojas B.	control Infraestructura	Dpto Institución	carlosalberto@saludcentrooriente.esse.gov.co	[Firma]
Marcia Grisay Guacarene V	Jefe Of. Asesoría	Dpto Institución	marciaguacarene@saludcentrooriente.esse.gov.co	[Firma]
Carlos Andrés Nieto Pardo	Ingeniero biomédico	Dpto Institución	carlosandresnieto@saludcentrooriente.esse.gov.co	[Firma]
Alexandro Pacheco	Apoyo Técnico	Dpto Institucional	alexandropacheco@saludcentrooriente.esse.gov.co	[Firma]
Laydi Trujillo Campos	Apoyo Financiero	Dpto Institucional	layditrujillo@saludcentrooriente.esse.gov.co	[Firma]
Cecilia Jiménez M	Salud Social	Unidad Gestión Participación	ceciliajimenez@saludcentrooriente.esse.gov.co	[Firma]
Laura Murcia R	Prof Participación	Unidad Gestión Participación	lauramurcia@saludcentrooriente.esse.gov.co	[Firma]





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD

Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES /DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2022/02/03	Reunión de seguimiento Veeduría Infraestructura Altamira	8:00 am	9:45 am



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES /DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2022/02/03	Reunión de seguimiento Veeduría Infraestructura Altamira	8:00 am	9:45 am

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2022/12/21	Veeduría Altamira	10:30 a.m	1:30 p.m

5. Asistencia				
Nombres y Apellidos	Cargo	Área (unidad)	Correo	Firma
Mauricio Suspe Moreno	Comunidad		Profesuspex@gmail.com	<i>[Signature]</i>
José David Rodríguez	Aldo Concejal Saramiento		judrigo@oncepsal.gov.co	<i>[Signature]</i>
Carlos Nieto	Ing. Biomédico	Ds/10	blomendi@oncepsal.gov.co	<i>[Signature]</i>
Angelo Reyes	Referente Participación	Subred C.O	angeloporticipacion@oncepsal.gov.co	<i>[Signature]</i>
Laura Murcia Izuda	Referente participación	Subred C.O	participacionsonblava@oncepsal.gov.co	<i>[Signature]</i>
