

040000

Doctor

**RAMÓN VILLAMIZAR MALDONADO**

Veedor delegado para la Participación y los Programas Especiales

Veeduría Distrital

Av. El Dorado # 69-76 Torre 1 Piso 8

Bogotá D.C.

**Asunto:** Solicitud Reprogramación de actividad en la plataforma Colibrí

Respetado Doctor Villamizar:

De acuerdo con la competencia de la Secretaria Distrital de Salud, en cuanto al desarrollo de las actividades y su actualización en la Plataforma Colibrí, para el mes de enero del 2023, solicito respetuosamente la reprogramación de las actividades, para el siguiente compromiso:

*Rendición de cuentas Secretaría Distrital de Salud vigencia 2021: III DIÁLOGO: BOGOTÁ CONSTRUYE ESPERANZA: En las mesas de diálogo con la Veeduría Ciudadana del Complejo Hospitalario de San Juan de Dios, se solicita contar mínimo semestralmente con la asistencia de los interventores para brindar información técnica de los avances de este proyecto de infraestructura en Salud.*

Es de aclarar a lo largo de la vigencia 2022 se realizaron tres (3) mesas de trabajo con la Veeduría del proyecto los días 20 de mayo, 22 de julio y el día 23 de septiembre. En ese orden de ideas y para el avance en el compromiso, la primera mesa de Dialogo con la participación de la interventoría fue el 23 de septiembre del 2022 y de la cual el soporte que ya se encuentra cargado en la plataforma Colibrí.

Ahora bien, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., realizó con la Veeduría del proyecto la mesa de técnica el día 26 de enero 2023 (Se adjunta acta), mesa de Dialogo con la cual se pretendía cumplir con la actividad faltante, sin embargo, por un error administrativo de comunicación, la Interventoría del proyecto no fue citada a dicha reunión, razón por lo cual no se puede dar efectiva para el cumplimiento del compromiso.

Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita prorrogar nuevamente el término de cumplimiento estipulado para el 31 de enero del 2023 hasta el 28 de febrero del 2023.

Cordialmente,



**CRISTINA DE LOS ÁNGELES LOSADA FORERO**

Subsecretaria de Planeación y Gestión Sectorial (E)

Proyectó: David Leonardo López Suescún - Dirección de Infraestructura y Tecnología

Revisó: Gabriel Ricardo Camacho Arcila - Dirección de Infraestructura y Tecnología

Andrés Ricardo Cardoso Torres - Dirección de Planeación Sectorial

Aprobó: Jorge Emilio Mercado González - Asesor de Despacho

Anexo: Actas mesas de dialogo del 20 de mayo, 22 de julio, 23 de septiembre del 2022 y 26 de enero del 2023. Diecinueve (19) folios.

 ALCALDÍA MAIOR DE BOGOTÁ D.C. Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	CÓDIGO: ET-CD-PT-001 VERSIÓN: 01 FECHA: 2022-05-10
	<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>	

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2022/05/20	Mesa de trabajo Veeduría Proyecto de Infraestructura San Juan de Dios	8:00 am	10:20 am

Proceso, área que lidera la reunión	Nombre de quien elabora el acta
Participación Comunitaria	Leidy Johana Fuya Munevar

<b>1. Objetivo de la reunión:</b>
Desarrollar mesa de trabajo con veedores ciudadanos de la Veeduría Proyecto de Infraestructura San Juan de Dios

<b>2. Temas a tratar:</b>
Avances de la Obra Intervenciones de la comunidad veedora

<b>3. Desarrollo:</b>
<p>Dando cumplimiento a los compromisos de la mesa de trabajo del mes de marzo, se realiza convocatoria presencial al grupo de ciudadanos veedores del proyecto de Infraestructura San Juan de Dios, con asistencia técnica de la Oficina de Participación Comunitaria de la Subred Centro Oriente, el profesional de Control Social de la SDS y la arquitecta de Apoyo técnico de la Oficina de Desarrollo Institucional de la Subred.</p> <p>Se brinda la bienvenida a la comunidad asistentes, se agradece el compromiso, se informa la metodología de la mesa consistirá en presentar los avances del proyecto y poder resolver dudas de los asistentes.</p> <p>Para empezar, toma la palabra la Arquitecta Sandra Patricia Pita, quien se encargará de la presentación de los avances, refiere que el 13 de mayo de 2022 se realizó la presentación del Proyecto ante el consejo de Patrimonio.</p> <p>Indaga la señora María Helena respecto a los tiempos que se puede tardar la etapa de pre construcción, teniendo en cuenta que, ya se van a cumplir dos años desde el inicio de esta etapa.</p> <p>Informa la arquitecta Sandra que, de acuerdo al cronograma de la obra luego de ser aprobado el proyecto ante el ministerio de cultura, se da tramite a la licencia expedida por curaduría la cual puede tardar de 4 a 6 meses permitiendo dar inicio a la etapa de construcción.</p> <p>Continúan la arquitecta Sandra realiza proyección de presentación de <b>“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN SALUD (UMHES), CENTRO DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SALUD (CAPS) Y ALAMEDA”</b> el cual corresponde al Contrato de Obra 02-BS-008-2020 entre la Subred Centro Oriente y COPASA Sucursal Colombia y el Contrato de Interventoría 02-BS-038-2020 entre la</p>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>Subred Integrada de Servicios de Salud de Bogotá - Consorcio Salud Bogotá E.S.E.</small>	<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD</b> <b>CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b>	<b>CÓDIGO: ET-CO-FT-001</b> <b>VERSIÓN: 03</b> <b>FECHA: 2020-02-10</b>
	<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>	

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2022/05/20	Mesa de trabajo Veeduría Proyecto de Infraestructura San Juan de Dios	8:00 am	10:20 am

Subred Centro Oriente y Consorcio Salud Bogotá 01

Dentro de la presentación realizada se destacan aspectos tales como:

- Localización del predio
- Plan Especial de Manejo y Protección PEMP- Resoluciones
- Descripción grafica del previo y el tipo de conservación
- Antecedentes del proyecto
- Descripción grafica de los sectores a intervenir
- Obras prioritarias 2020-2024 / ERU – Propietario y ente gestor
- Proyectos de Diseño en Ejecución
- Zonificación de usos
- Determinantes proyecto UMHES
- Demanda y uso: nueva infraestructura hospitalaria
- Usos edificaciones
- Sectores normativos (PEMP)
- Sectores a intervenir – alcance
- Valoración y principios generales de intervención- valoración patrimonial
- Puesta en valor ejes compositivos y senderos peatonales
- Criterios de intervención y de diseño del sector normativo 3 UMHES
- Criterios de intervención y de diseño del sector normativo 5b CAPS
- criterios de intervención y de diseño del sector normativo 5d ALAMEDA

A fin de ampliar la información anteriormente mencionada, se agrega a la presente acta la presentación detallada.

Indica la señora Emma Romero, evaluar la posibilidad de que el grupo de veedores realice recorrido a las instalaciones del complejo a fin de conocer los avances de la obra y los proyectos que adelanta la ERU.

Refiere la arquitecta que, este proyecto busca revitalizar este sector, generar proceso de interacción de distintas instituciones en beneficio de la ciudadanía. Dentro de las principales dificultades para el avance del proyecto, se ha situado en la autorización de la demolición del edificio central, en parte por la desinformación de algunos ciudadanos.

La señora María Helena indaga si la resolución original del (PEMP), se ha renovado desde el principio del proyecto o se mantiene.

Presenta la arquitecta Sandra la diapositiva en la que se describen las resoluciones del (PEMP):

	<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b>	<b>CODIGO DE COPIAS VERIFICACION FECHA: 2022/05/20</b>
	<b>FORMATO ACTA DE REUNION</b>	

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNION	HORA INICIO	HORA FINAL
2022/05/20	Mesa de trabajo Veeduría Proyecto de Infraestructura San Juan de Dios	8:00 am	10:20 am

**INTRODUCCIÓN – PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN PEMP (Res.995/16)**



**PEMP HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL**

**RESOLUCIÓN 995 DE 2016 – MINISTERIO DE CULTURA:**

Por la cual se aprueba el Plan Especial de Manejo y Protección del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, ubicado en la ciudad de Bogotá, D. C.

**RESOLUCIÓN 3636 DE 2017.**

Por la cual se aclara la Resolución número 0995 del 29 de abril de 2016, referente al Nivel de Intervención en los predios Hospital de la Misericordia, Hospital Santa Clara y colindantes – Zona de influencia.

**RESOLUCIÓN 4033 de 2018.**

Por la cual se modifica la Resolución número 0995 de 2016, correspondiente al ajuste índice de ocupación sector normativo 3.

**RESOLUCIÓN 3917 DE 2019**

Por la cual se aclara el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, respecto al tratamiento urbanístico, área de actividad y usos del suelo en la zona de influencia



Pregunta la señora María Helena el concepto de los componedores amigables, respecto a los parqueaderos.

Responde la arquitecta que durante el mes de abril se emitido este concepto, en el que se determinó que la zona de parqueaderos se ubicará cerca a la alameda en el sótano, COPASA desarrollará la construcción del 60% total de parqueaderos que tendrá el complejo.

Para finalizar solicita la mesa de veedores la necesidad de conocer los representantes de COPASA y la Interventoría; se coordina la próxima mesa de trabajo para el 22 de julio.

Como cierre se realiza la invitación al 23-05-2022 de 3 a 5 a la Capacitación de Control Social.

¿Quieres conocer sobre los elementos asociados a la Participación y el Control Social?

 No te pierdas del Taller de Formación de Multiplicadores en Control Social 

 Lunes 23 de mayo de 2022

 3:00 pm - 5:00 pm

 Link: <https://meet.google.com/bfw-yhwx-nfg>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.</small>	<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b>	<b>CÓDIGO: ET-CO-FT-001 VERSIÓN: 03 FECHA: 2020-02-10</b>
	<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>	

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2022/05/20	Mesa de trabajo Veeduría Proyecto de Infraestructura San Juan de Dios	8:00 am	10:20 am



4. Compromisos Establecidos y Responsables					
Qué Tarea o Actividad	Quién Responsable	Cuando Fecha límite	Observaciones		
			Si	No	
Invitación del contratista e interventor de obra a la mesa de trabajo de la veeduría	Desarrollo Institucional	Por definir		X	
Recorrido a la obra	Control Social	Por definir		X	
Próxima mesa de veeduría	Veeduría Ciudadana-Subred CO	22-07-2022		X	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	CÓDIGO: SI-CO-E.S.E. VERSIÓN: 1.1 FECHA: 2022-02-10
<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>		

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FIN
2022/05/20	Mesa de trabajo Veeduría Proyecto de Infraestructura San Juan de Dios	8:00 am	10:20 am

**Registro fotográfico**






ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑOS/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2022/05/20	Mesa de trabajo Veeduría Proyecto de Infraestructura San Juan de Dios	8:00 am	10:20 am

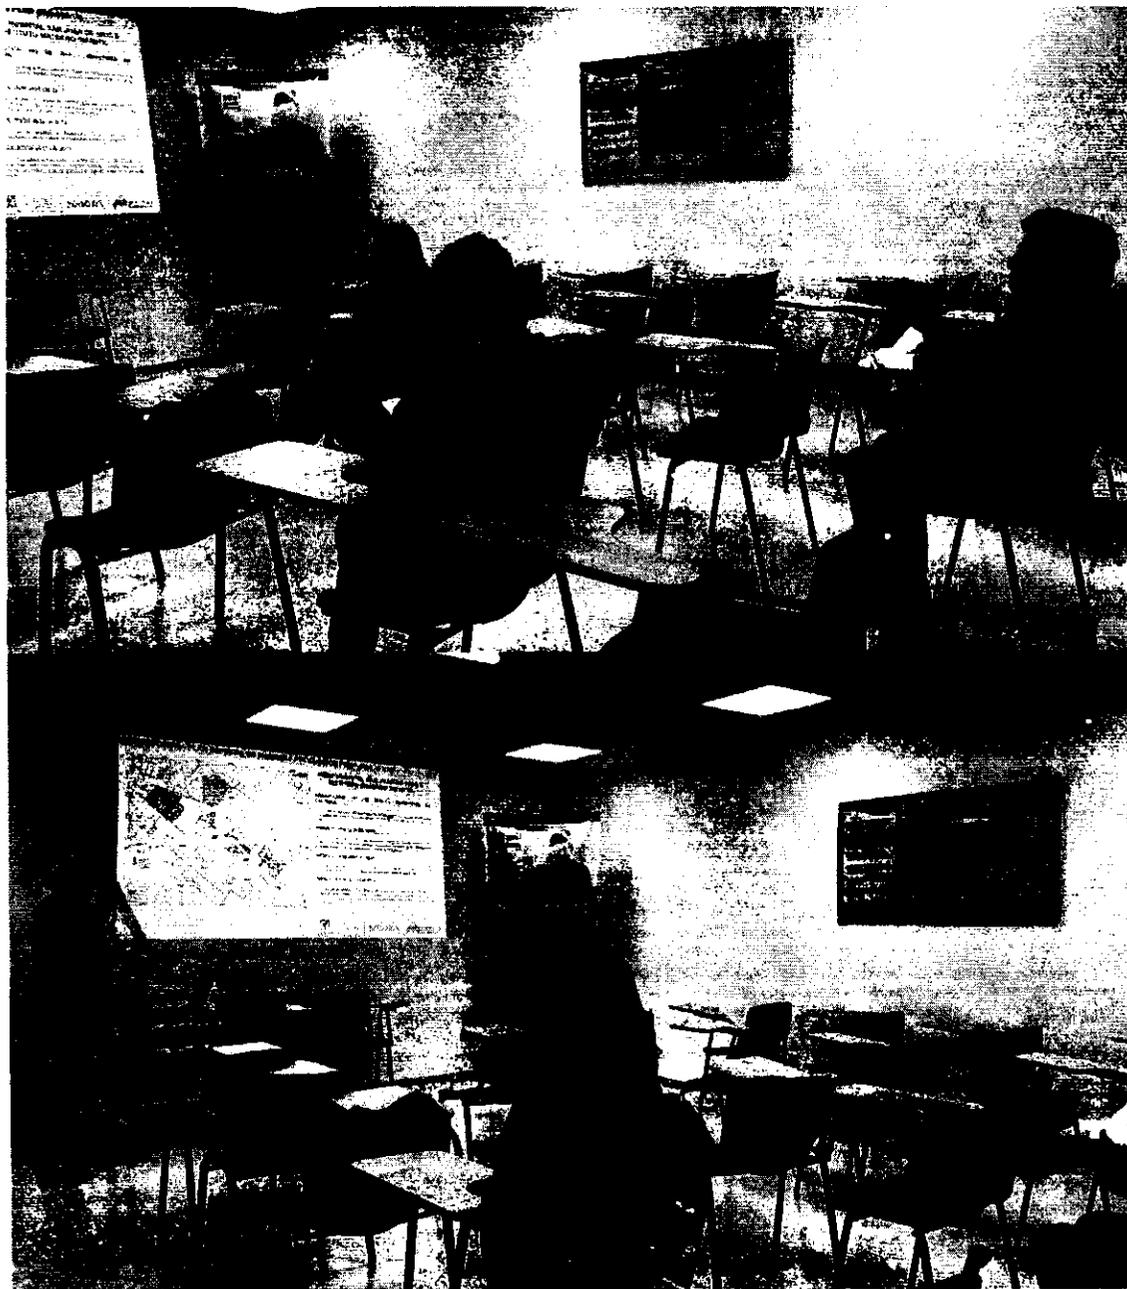

Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
Centro Oriente E.S.E.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ**



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD          CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b>	CÓDIGO: ET-CO-ET-001 VERSIÓN: 03 FECHA: 2022-07-19
	<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>	

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2022/07/22	Mesa Veeduría San Juan de Dios	8:00 am	9:15 am

Proceso, área que lidera la reunión	Nombre de quien elabora el acta
Participación Comunitaria	Leidy Johana Fuya M

**1. Objetivo de la reunión:**  
 Realizar asistencia técnica a la Asociación de Usuarios San Blas.

**2. Temas a tratar:**  
 Presentación avances Obra San Juan de Dios  
 Preguntas veedoras asistentes

**3. Desarrollo:**

Dando cumplimiento al compromiso de la Subred Centro Oriente con la veeduría ciudadana de la Obra de Infraestructura San Juan de Dios, se realiza convocatoria presencial al auditorio del Centro de Salud Antonio Nariño.

Se da inicio a la mesa con la bienvenida a las veedoras ciudadanas asistentes, da apertura a la mesa la Dra. Marcia Guacaneme Jefe de la Oficina Asesora de Desarrollo Institucional y supervisora del proyecto San Juan de Dios, antes de empezar solicita permiso a los asistentes para iniciar grabación de voz de la mesa de trabajo, autorización concedida por parte de las veedoras asistentes y el equipo profesional de la Subred y Control Social de la Secretaria Distrital de Salud.

Se informa a los asistentes que, al inicio de proyecto se contemplo un tiempo estimado para la etapa pre construcción de 12 meses, el cual a la fecha de ha superado, actualmente se cursa una nueva adición y prorroga por 15 meses más a partir del 03 de junio.



**HOSPITAL NUEVO SAN JUAN DE DIOS**

<p><b>CONTRATO DE OBRA</b>          Tipo de Contrato: Llave en mano          Contrato No. 02-BS-008-2020          Valor: \$486.576.184.539          Contratista: Sociedad Anónima de Obras y Servicios COPASA, Sucursal Colombia.          Duración: 108 meses          Fase actual: PRE CONSTRUCCIÓN          Unidades Funcionales: 2</p>	<p><b>CONTRATO DE INTERVENTORÍA</b>          Contrato No. 02-BS-036-2020          Valor: \$13.559.231.024          Adición N°1: \$2.379.838.236          Valor actual: \$18.939.069.260          Contratista: Consorcio Salud Bogotá 01          Duración: 66 meses          Fecha Acta de Inicio: 8 Junio 2020          Fase actual: PRE CONSTRUCCIÓN          Actualizante se transita una prórroga por 15 meses y adición \$2.974.767.810</p>
--	--

  
 312  
 Casas

  
 286.419  
 Población Insuficiente

  
 Servicios

  
 Entre otros  
 Cardiología  
 Cirugía  
 Gastroenterología  
 Neumología  
 Medicina Interna  
 Urgencias  
 Vigilancia



#SubredCOMás Cerca De Ti






ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
del Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2022/07/22	Mesa Veeduría San Juan de Dios	8:00 am	9:15 am

### DESARROLLO - HITOS CONTRATO OBRA

CONTRATO DE OBRA - 02-BS-008-2020

**2021**

1 2 3 4 5 6 7

1<sup>o</sup> RADICACIÓN PROYECTO 38 ABRIL 2021 ANTE MINISTERIO DE CULTURA

2<sup>o</sup> RADICACIÓN 30 JULIO 2021

2021 - AVAL POR MINISTERIO DE CULTURA PARA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO AL COMITÉ TÉCNICO DE PATRIMONIO DE INDICACIÓN de solicitud de iniciar radicación el Documento Técnico de Soportes - DTS.

14 febrero 2022 - 1<sup>o</sup> RADICACIÓN DTS  
31 marzo 2022 - 2<sup>o</sup> RADICACIÓN DTS  
13 mayo 2022 - 3<sup>o</sup> RADICACIÓN DTS

13 MAY 2022 - Presentación al CONSEJO DISTRITAL DE PATRIMONIO - Votación por Consideración que el Proyecto se enmarca dentro de las estrategias de protección y recuperación del CHSJD

1 JUN 2022 - Presentación al COMITÉ TÉCNICO del CONSEJO NACIONAL DE PATRIMONIO - CNPC - Otorgan aval para presentación del Proyecto ante el CNPC para el 22 de Junio 2022.

22 JUNIO 2022 4 PM **PRESENTACIÓN DEL PROYECTO ANTE EL CNPC.**

EN LAS DOS RADICACIONES SE REALIZARON OBSERVACIONES POR MINISTERIO DE CULTURA REBUeltas EN MESAS TÉCNICAS

20 abr 2022 - Decisión Amigable Compositor

OBTENER EL AVAL PARA RADICACIÓN DEL PROYECTO ANTE EL MINISTERIO DE CULTURA, POSTERIOR APROBACIÓN E INICIO DE PROCESO EN DICIEMBRE 2022 ANTE CURADURÍA URBANA PARA LICENCIAMIENTO DEL PROYECTO

SubredCOMásCercaDeTi 27/06/2022

SECRETARÍA DE SALUD BOGOTÁ

---

### DESARROLLO - ESTADO ACTUAL CONTRATO OBRA

CONTRATO DE OBRA - 02-BS-008-2020 - PRODUCTOS AVANZADOS Y APROBADOS PARA FASE DE PRECONSTRUCCIÓN POR COPASA

- Emisión Resolución 0048 de 2021 Ministerio de Cultura - 25 enero 2021
- Plan de SGSST, Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado
- Plan de Contingencia y Emergencias, aprobado
- Plan de Gestión Social y Ambiental, aprobado
- Plan de manejo de Tránsito, Señalización y desvío.
- Plan de Proyecto V1.06 . En ajuste
- Estudio de Suelos, aprobado
- Plan de manejo arqueológico.
- Tratamiento Silvicultural, aprobado.

EJECUCION	Avance Programado***	Avance ejecutado	Diferencia
Actualizado Junio 2022	100%	67,03%	-32,97%

\*\*\* Dado el Pronunciamiento del Panel de Amigable Compositor, se está realizando actualización del Plan de Proyecto

AVANCE GENERAL  
HSTC HOSPITAL SANTA CLARA-CAP1

% Esperado % Observado

SubredCOMásCercaDeTi 27/06/2022

SECRETARÍA DE SALUD BOGOTÁ



Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
Centro Oriente E.S.E.



 **ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD**  
**CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
**FORMATO ACTA DE REUNIÓN**  
**CÓDIGO: ET-CD-001**  
**VERSIÓN: 02**  
**FECHA: 2020-07-22**

FECHA AÑOS/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2022/07/22	Mesa Veeduría San Juan de Dios	8:00 am	9:15 am

  **DESARROLLO - ESTADO ACTUAL CONTRATO OBRA**  
**CONTRATO DE OBRA - 02-BS-008-2020 - ORDENES DE PAGO POR ANTICIPO**

- Para Junio 2022 las Ordenes de Pago aprobadas a COPASA son del 10.26% del valor del anticipo \$7.182.229.106.
- Se aprueba ajuste al PIA por Interventoría al 22 de junio 2022, manteniendo el valor total del anticipo, redistribuyendo rubros de Items.

ANTICIPO GIRADO		
ANTICIPO GIRADO	69.966.427.881	100,0%
VALOR OP SOLICITADAS (hasta la OP No.239)	18.947.190.879	22,7%
OP APROBADAS	7.182.229.106	10,26%
OP EN REVISIÓN DE INTERVENTORÍA	112.143.488	0,16%
OP EN REVISIÓN DE COPASA	19.702.188	0,02%
VALOR OP NEGADAS / DEVUELTAS	8.633.066.097	12,33%
ANTICIPO GIRADO PENDIENTE POR EJECUTAR	62.804.199.875	89,7%

 **#SubredCOMásCercaDeTi** 22/06/2022  **SECRETARÍA DE SALUD** **BOGOTÁ**

  **DESARROLLO - ESTADO ACTUAL CONTRATO INTERVENTORÍA**  
**CONTRATO DE INTERVENTORIA - 02-BS-008-2020**

- El contrato contempla pagos mensuales, diferenciados por cada una de las etapas del proyecto, y el reconocimiento del (IVA). A la fecha se ha generado una adición al contrato por 12 meses, y se ha facturado un total de \$4.515 millones, correspondientes al 28,32% del Contrato.



 **#SubredCOMásCercaDeTi** 22/06/2022  **SECRETARÍA DE SALUD** **BOGOTÁ**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
del Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2022/07/22	Mesa Veeduría San Juan de Dios	8:00 am	9:15 am

Complementando la información expuesta en la presentación, manifiesta la Dra. Marcia que, la proroga implicara una modificación de cronogramas de acuerdo a los nuevos tiempos. Se informa además la entrega titularidad del previo se encuentra a cargo de la Secretaria Distrital de Salud, este se podría dar a través de un convenio para hacer efectiva la entrega de los edificios a intervenir por la Subred.

Se abre el espacio para las intervenciones de la comunidad:

- María Helena Becerra: “En cuanto a la adición los veedores pueden conocer en curso o actividad se adelantará y se cuenta algún trámite para las licencias”

Respecto a la pregunta de la señora María Helena, informa la Dra. Marcia dentro del diagnostico presentado se especifican los 15 meses, y a la fecha no se cuenta con trámite de solicitud de licencias.

- María Helena Becerra: ¿Cuándo se indica que el predio paso a manos de la SDS, se refieren a los 24 edificios que componen el complejo San Juan de Dios?

Aclara la Dra. Marcia que esta información es mejor que se tramite directamente por parte de la SDS, se allegaran las resoluciones de esta entrega.

A partir de lo anterior se pacta solicitar a la SDS desde su dirección de infraestructura la claridad respecto a la entrega del predio por parte de la ERU a la SDS.

Respecto a lo anterior el profesional Hederson Gualteros manifiesta que, este proceso se dio desde el mes de octubre de 2021 al mes de mayo de 2022, relacionado al tramite de permisos para la intervención de torre central, desde patrimonio de la SDS se brindara esta información.

- María Helena Becerra: solicitan se alleguen las resoluciones que se han generado para el PEM. Refiere además que adelantara proceso con el concejo para revisar el espacio y verificación del proyecto; solicita además para la mesa de septiembre la presentación del cronograma ajustado de acuerdo a las novedades presentadas en la mesa del día de hoy, además del envío de los conceptos de los amigables componedores y los cambios que ha solicitado Copasa. Finaliza preguntado si mantienen los 108 meses para la construcción.

Frente a la pregunta del tiempo de construcción de la obra, refiere la Dra. Marcia no poder brindarse con certeza esta información, teniendo en cuenta las modificaciones que se han presentado con el proyecto.

Se presenta el arquitecto Carlos Rojas apoyo a la supervisión de la Obra San Juan de Dios, quien



Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
Centro Oriente E.S.E.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. E.S.E. <small>Secretaría de Salud          Subred Integrada de Servicios de Salud          Centro Oriente E.S.E.</small>	<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD          CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b>	<b>CÓDIGO: ET-CO-TT-001          VERSIÓN: 03          FECHA: 2022-02-10</b>
	<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>	

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2022/07/22	Mesa Veeduría San Juan de Dios	8:00 am	9:15 am

estará acompañando a la Arquitecta Sandra Pita, vinculado desde el mes de abril de 2022.

- Emma Romero: indaga respecto a la demora con los conceptos y avales por parte del Ministerio.

La arquitecta Sandra, informa que se ha venido realizando la revisión de la preservación del patrimonio, para el mes de abril y junio se recibieron las observaciones, en diciembre de 2021, se brinda el aval respecto la imagen adecuada.

Para este año se ha venido adelantando:

- Presentación al comité técnico Distrital 13-05-2022
- Presentación al comité técnico Nacional- en proceso
- Consejo Nacional de Patrimonio



Agotados los puntos de la agenda, se da por terminada la mesa de trabajo.

I. Compromisos, Subejecución y Responsables					
Tarea o Actividad	Quién Responsable	Cuándo Fecha límite	Observaciones		
			SI	No	
Envío de acta de mesa de trabajo, con presentaciones.	Profesional de Participación Social	19-08-2022		X	
Resoluciones que se han generado para el PEM	Desarrollo Institucional	23-09-2022		X	
Presentación del cronograma ajustado de acuerdo a las novedades presentadas en la mesa	Desarrollo Institucional	23-09-2022		X	
envío de los conceptos de los amigables componedores y los cambios que ha solicitado Copasa	Desarrollo Institucional	23-09-2022		X	
solicitar a la SDS desde su dirección de infraestructura la claridad respecto a la entrega del predio por parte de la ERU a la SDS	Profesional de Control Social de la SDS	23-09-2022		X	

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SALUD <small>Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.</small>	<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD</b> <b>CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b>	<b>CÓDIGO: ET-CO-FT-001</b> <b>VERSIÓN: 03</b> <b>FECHA: 2020-02-10</b>
	<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>	

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2022/07/22	Mesa Veeduría San Juan de Dios	8:00 am	9:15 am

**Registro fotográfico**

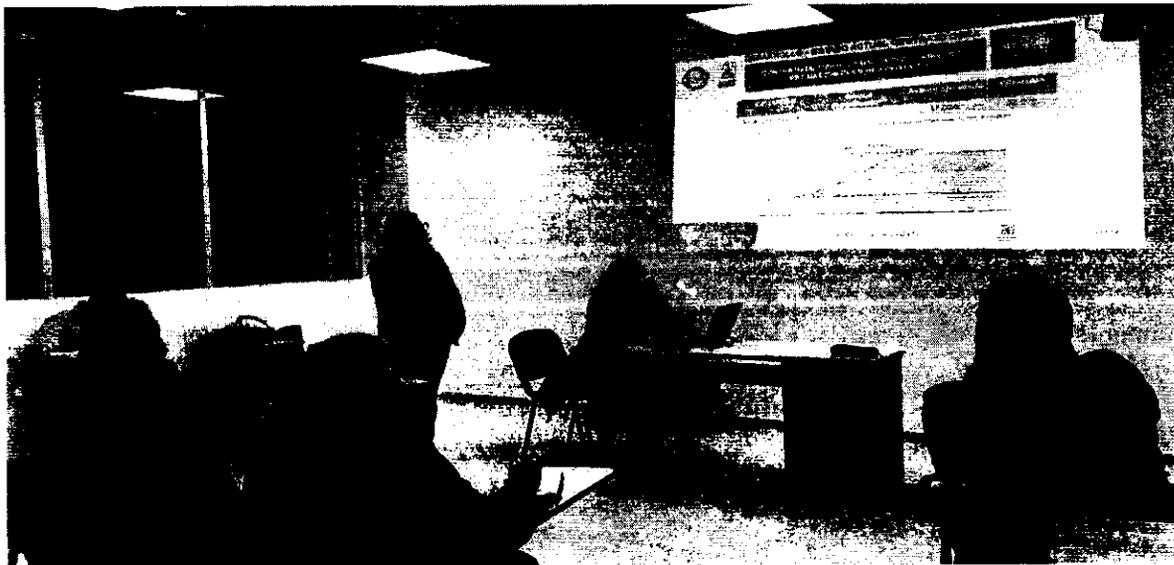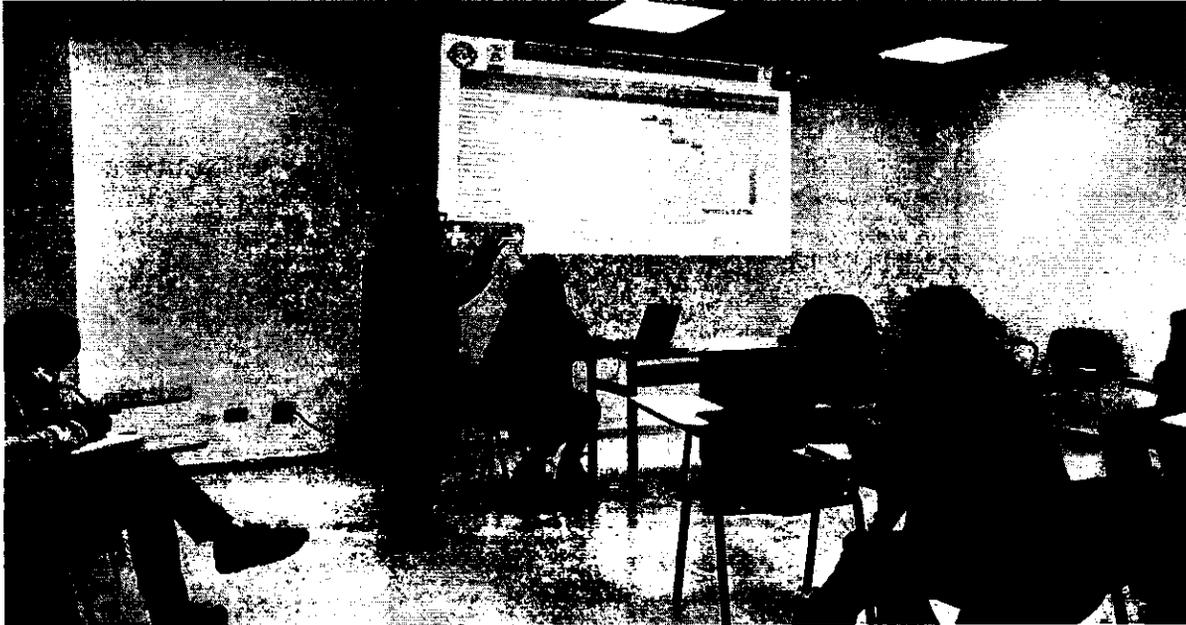

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>Secretaría de Salud</small>	<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD</b> <b>CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b>	<b>CÓDIGO: ET-CO-PT-001</b> <b>VERSIÓN: 03</b> <b>FECHA: 2010-02-18</b>
<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>		


FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2022/07/22	Mesa Veeduría San Juan de Dios	8:00 am	9:15 am



Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.  
 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO  
 FORMATO LISTA DE ASISTENCIA - CAPACITACIÓN USUARIOS

INFORMACIÓN GENERAL

PROCESO Y/O DEPENDENCIA	FECHA	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	FIRMA	
Participación Comunitaria	Viernes 22 de Julio / 22	5:00 am	9:15 am	Jenny Jbara Tulez	
NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ZPS	TELÉFONO DE CONTACTO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
María Helena Becerra	41698162	Nueva EPS	3074614096	anele.395@gmail.com	María Helena Becerra
Maria Greicy Guaraná	32150028	Compensar	3045928039	deparollo.msh@telefonos.com	Maria Greicy Guaraná
Carlos A. Rosas B.	00101345	Compensar	300818393	ABE15ANJUAN@EUNES	Carlos A. Rosas B.
Janeth P. P. P.	02540309	Compensar	3143061754	abrujanjan@subredcentrooriental.gov.co	Janeth P. P. P.
María Stella Bello	41395511	Compensar	3123581865	stella.bello19@gmail.com	María Stella Bello
Yaracelis Rodríguez	41495300	Compensar	3104882494	carmensitaro@Holmóid.com	Yaracelis Rodríguez
Emma R. De Boyaca	41527389	Compensar	3118459761	emma.romero@telefonos.com	Emma R. De Boyaca
Federico Gustavo	80072032	Famisanar	3017340756	MG6uulterosa@subredcentrooriental.gov.co	Federico Gustavo
Julián Belique Tullis	80263060	Compensar	3152026373	julian.belique@telefonos.com	Julián Belique Tullis
Jenny Jbara Tulez M	10628742	Sanitas	3086620059	participacioncomunitaria@subredcentrooriental.gov.co	Jenny Jbara Tulez



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Oficina de Planeación y Desarrollo Urbano	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE COPASA SOC. POR INTERESTADO	CÓDIGO: SI-CO-PI-001 VERSIÓN: 01 FECHA: 2022/09/23
	<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>	

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2022/09/23	Mesa de Trabajo Veeduría San Juan de Dios	8:00 am	9:00 am

Proceso, Área que Valora la reunión	Nombre de quien elabora el acta
Participación Comunitaria	Leidy Johana Fuya M

**1. Objetivo de la reunión:**  
 Desarrollar mesa de trabajo con los veedores ciudadanos del proyecto de Infraestructura San Juan de Dios, dando cumplimiento a los cronogramas de encuentros y presentación de avances.

**2. Temas a tratar:**  
 Presentación de avances proyecto de Infraestructura San Juan de Dios  
 Presentación de equipo de interventoría y construcción.

**3. Desarrollo:**  
 Se realiza convocatoria a la ciudadanía vinculada a la Veeduría del proyecto de Infraestructura San Juan de Dios, de acuerdo al cronograma de mesas de trabajo, para dar inicio se brinda la bienvenida a los asistentes y por parte de la Dra. Marcia Jefe de la Oficina Asesora de Desarrollo Institucional de la Subred Centro Oriente, se informa que, de acuerdo a los compromisos pactados en las mesas anteriores, para la jornada del día se cuenta con la asistencia de profesionales de la firma interventora y el contratista a cargo de la obra.

Se realiza la presentación de los profesionales:

Nombre	Cargo	Institución
Saul Celis	Especialista construcción hospitalaria	Firma interventora Consorcio Salud Bogotá
Diego Fernando Quitian	Director interventoría	Firma interventora Consorcio Salud Bogotá
Gustavo Andrés Correa	Director de proyectos	Firma contratista COPASA

Continuando, da inicio la Dra. Marcia y el arquitecto con la presentación de los avances en la etapa precontractual de la obra:



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2022/09/23	Mesa de Trabajo Veeduría San Juan de Dios	8:00 am	9:00 am



HOSPITAL NUEVO SAN JUAN DE DIOS

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

LOCALIDAD: ANTONIO NARIÑO

CONTRATO DE OBRA

Tipo de Contrato: Llave en mano  
Contrato No. 02-BS-008-2020  
Valor: \$ 466.576.184.539  
Contratista: Sociedad Anónima de Obras y Servicios COPASA, Sucursal Colombia.  
Duración: 108 meses  
Fecha Acta de Inicio: 2 Julio 2020  
Terminación: Año 2029  
Fase actual: PRE CONSTRUCCIÓN  
Unidades Funcionales: 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No. 02-BS-038-2020  
Valor: \$13.559.231.024  
Adición N°1: \$2.379.838.236  
Prorroga: 12 meses  
Contratista: Consorcio Salud Bogotá 01.  
Duración: 86 meses  
Fecha Acta de Inicio: 8 Junio 2020  
Terminación: Año 2025  
Fase actual: PRE CONSTRUCCIÓN

312

Camas



286.410

Población beneficiada



Servicios

Cardiología  
Cirugía  
Gastroenterología  
Neumología  
Medicina Interna  
Ergonomía  
Vacunación



Certificación  
LEED



#SubredCOMásCercaDeTi




SECRETARÍA DE SALUD

BOGOTÁ



DESARROLLO - HITOS CONTRATO OBRA

CONTRATO DE OBRA - 02-BS-008-2020

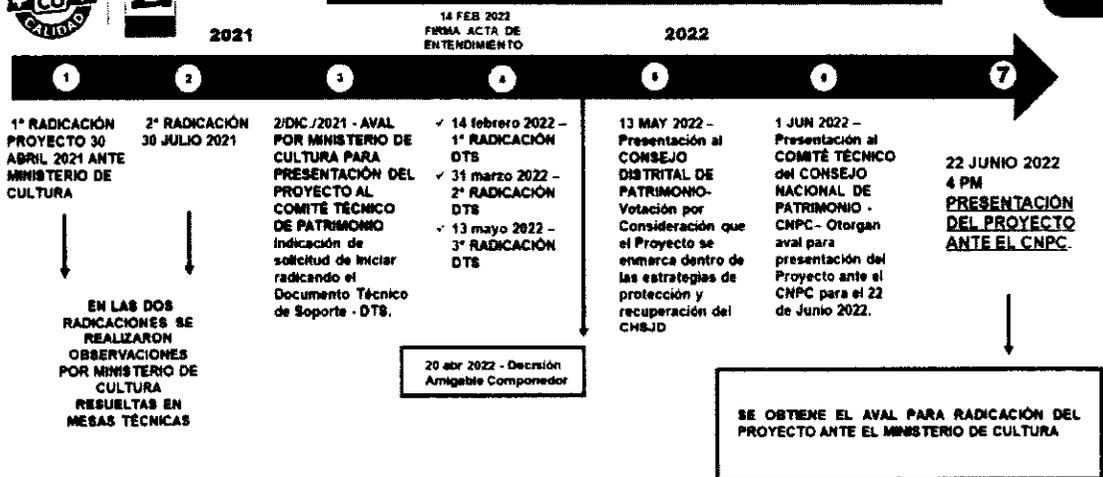

#SubredCOMásCercaDeTi



SECRETARÍA DE SALUD

BOGOTÁ

De acuerdo a los compromisos de la mesa con las veedoras del mes de julio, el concepto del



Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
Centro Oriente E.S.E.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b>		<b>CÓDIGO PROYECTO: 00000000000000000000</b> <b>FECHA: 2022/09/23</b>
	<b>FORMATO ACTA DE REUNION</b>		


FECHA AÑOS/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FIN
2022/09/23	Mesa de Trabajo Veeduría San Juan de Dios	8:00 am	9:00 am

amigable componedor, la Dra. Marcia resalta que, para el 20 de abril de 2022 se presenta la decisión del amigable componedor la cual tiene implicaciones en el proyecto.



### PRESENTACIÓN ANTE CNPC – JUN 2022

#### IMPACTO DEL PROYECTO

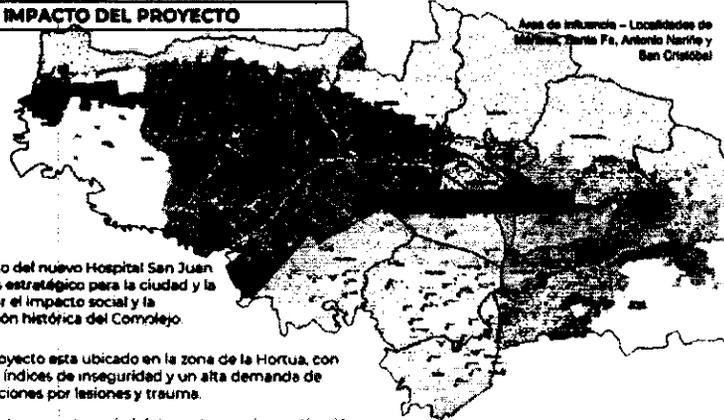

- El proyecto del nuevo Hospital San Juan de Dios es estratégico para la ciudad y la región, por el impacto social y la connotación histórica del Complejo.
- El proyecto está ubicado en la zona de la Hortua, con altos índices de inseguridad y una alta demanda de atenciones por lesiones y trauma.
- Este proyecto será el detonante para la reactivación de los espacios abiertos y servicios asistenciales del Complejo San Juan de Dios para la comunidad.



#SubredCOMásCercaDeTi



#### CONTEXTUALIZACIÓN



**Ubicación:** Localidad 15 Antonio Nariño - UPZ 35 Ciudad Jardín, Barrio la Hortua.  
Localidad 04 - San Cristóbal - UPZ 33 Sosiego, barrio Modelo Sur.  
**Número de matrícula:** 505-40727785  
**Código catastral:** AAA0262KCNX  
**Dirección Catastral:** Carrera 10 No. 1-59 Sur

**Área según matrícula inmobiliaria:** 13 hectáreas (16,3 Ha con predios del Instituto Radium).  
**Código del sector:** 001208001

**Edificio:** 25 inventariados y 12 mineros

**Protección Nacional:** Monumento Nacional, Ley 738 de 2002

**PEMP:** Resolución 996 de abril de 2016

**Modificación 1:** Resolución 4033 de 2018

**Aclaraciones:** Resolución 3626 de 2017 y 3917 de 2019

Área Afecteda  
Zona de Influencia



#SubredCOMásCercaDeTi





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD  
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2022/09/23	Mesa de Trabajo Veeduría San Juan de Dios	8:00 am	9:00 am




PRINCIPIOS GENERALES DE INTERVENCIÓN

Respeto de la evolución  
histórica del bien,  
valoración crítica de  
agregados



- 1. Respeto a la historia
- 2. Creación de los agregados
- 3. Integración con el PDP

Nota: A parte del Decreto 1080 de 2015 del Ministerio de Cultura y los criterios establecidos en las resoluciones de Mancomunidad 4 del IENP del Comité Hospitalario San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil aprobados mediante Resolución 993 de 2016



#SubredCOMásCercaDeTi



SECRETARÍA  
SALUD

BOGOTÁ



CRITERIOS GENERALES DE INTERVENCIÓN



Puesta en valor de las relaciones del CIESO con su contexto urbano y ambiental

Implementación que dialogue con los usos permisivos del CIESO

Desarrollo volumétrico propio de la actividad que alberga (De acuerdo con el Programa Médico Arquitectónico)

Definición de fachadas acordes con el desarrollo del conjunto patrimonial

Nota: A parte del Decreto 1080 de 2015 del Ministerio de Cultura y los criterios establecidos en las resoluciones de Mancomunidad 4 del IENP del Comité Hospitalario San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil aprobados mediante Resolución 993 de 2016



#SubredCOMásCercaDeTi



SECRETARÍA  
SALUD

BOGOTÁ



Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
Centro Oriente E.S.E.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD</b> <b>CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b>	<b>CÓDIGO: ET-CO-ES-001</b> <b>VERSION: 03</b> <b>FECHA: 2021-04-29</b>
	<b>FORMATO ACTA DE REUNION</b>	

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNION	HORA INICIO	HORA FIN
2022/09/23	Mesa de Trabajo Veeduría San Juan de Dios	8:00 am	9:00 am




**CRITERIOS GENERALES DE INTERVENCION ALAMEDA**





**ALAMEDA**  
SECTOR NORMATIVO 5D

Ofrer la máxima comodidad de las barreras físicas de los espacios colectivos y zonas verdes para su disfrute.

Integración del edificio con la infraestructura urbana planteada para la zona de influencia.

Verificar de manera física y espacial las instalaciones del edificio en relación del perfil (Ambientación, Dermatológica, y nuevas desarrollos).



#SubredCOMAsCercaDeTi



SECRETARÍA DE SALUD







**CRITERIOS GENERALES DE INTERVENCION UMHES**





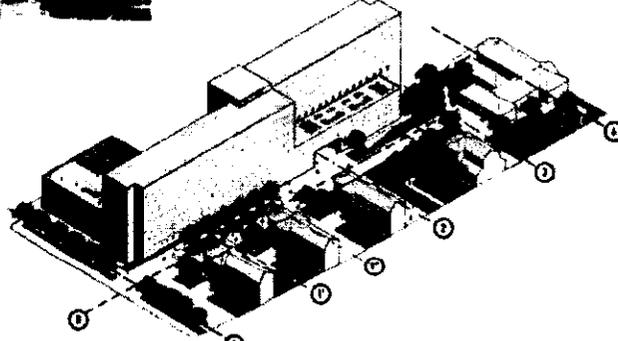



#SubredCOMAsCercaDeTi



SECRETARÍA DE SALUD







**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD**  
**CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

**CÓDIGO DE CO-1301**  
**FECHA: 2022-09-23**

---

**FORMATO ACTA DE REUNIÓN**

FECHA ANGIO/MES/AÑO	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2022/09/23	Mesa de Trabajo Veeduría San Juan de Dios	8:00 am	9:00 am




**POTENCIALIZACION VALORES DE PATRIMONIO CULTURAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**



Se refuerza la vocación verde del Complejo Hospitalario

Se libera el área perimetral en el Sector 3 y se mejoran las condiciones de dotamiento con diferentes inmuebles patrimoniales del complejo:

- Siberia
- Santiago Semper
- Enfermedades Tropicales
- Pabellones

Se garantiza la reapertura del Hospital San Juan de Dios como un Hospital Universitario de 4to Nivel

Al servicio de la comunidad académica y la ciudadanía



#SubredCOMásCercaDeTi








**DESARROLLO - ESTADO ACTUAL CONTRATO OBRA**

**AVANCE DE OBRA - PLAN DE PROYECTO**



COPASA se encuentra actualmente realizando el análisis respectivo del PLAN DE PROYECTO, con el fin de poder evaluar los impactos en el cronograma que ha tenido, la decisión del amigable componedor y el proceso adelantado ante Ministerio de Cultura.

**6. GUÍA INFORMATIVA DE TENDENCIA DE AVANCE DE OBRA**

CONCENTRACION	2022	2021	2020	2019
Asignado	67,89%	100,00%	-32,87%	-67,76
Devuelto	0,00%	0,00%	0,00%	-1,00
Asignado Actual	67,89%	100,00%	-32,87%	-68,76

AVANCE GENERAL

HIST. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS





#SubredCOMásCercaDeTi







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2022/09/23	Mesa de Trabajo Veeduría San Juan de Dios	8:00 am	9:00 am



DESARROLLO – ESTADO ACTUAL CONTRATO OBRA

CONTRATO DE OBRA - 02-BS-008-2020 – ORDENES DE PAGO POR ANTICIPO

Valor Contrato: \$ 466.576.184.539 – Anticipo: 69.986.427.681 equivalente al 15%

- Para Septiembre 2022 las Ordenes de Pago aprobadas a COPASA son del 11,3% del valor del anticipo correspondientes a \$7.936.796.218.

ANTICIPO GIRADO	69.986.427.681	100%
VALOR OP SOLICITADAS (hasta la OP No. 277)	12.456.618.180	17,7%
VALOR OP APROBADAS	7.936.796.218	11,3%
VALOR OP EN REVISIÓN DE INTERVENTORÍA	0	0%
VALOR OP EN REVISIÓN DE COPASA	19.792.188	0,02%
VALOR OP NEGADAS / DEVUELTAS	4.500.119.754	6,4%
ANTICIPO GIRADO PENDIENTE POR EJECUTAR	62.049.631.484	88,6%

Tabla de pagos por anticipo - Septiembre 2022



#SubredCOMásCercaDeTi



SECRETARÍA DE  
SALUD

BOGOTÁ



DESARROLLO – ESTADO ACTUAL CONTRATO INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA - 02-BS-008-2020

- El contrato contempla pagos mensuales, diferenciados por cada una de las etapas del proyecto, y el reconocimiento del (IVA). A la fecha se ha facturado un total de \$4.713 millones, correspondientes al 34,7% del Contrato. Se encuentra en trámite prórroga y adición para la fase de Preconstrucción.

VALOR PENDIENTE	VALOR EJECUTADO	FECHA DE CORTE
\$ 396.639.706	\$ 4.713.000.000	Junio y Julio 2022

Tabla de pagos a Interventoría - Junio 2022

Pendiente facturar \$ 396.639.706 correspondiente a Junio y Julio 2022



#SubredCOMásCercaDeTi



SECRETARÍA DE  
SALUD

BOGOTÁ



Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
Centro Oriente E.S.E.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	CÓDIGO: EL-CO-11-00 VEEDURÍA FECHA: 2022-09-23
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIAL	HORA FINAL
2022/09/23	Mesa de Trabajo Veeduría San Juan de Dios	8:00 am	9:00 am

Toma la palabra la señora Aleyda, orienta su intervención a los pagos realizados a los contratistas de la obra, y desde su perspectiva no se evidencia avances en el proyecto.

Respecto a esto, informa la Dra. Marcia que, durante la etapa de pre construcción, las acciones pese a que no son tan tangibles, si ha presentado un sin numero de actividades, mesas de trabajo, para la concertación de los diseños de la obra y toda la gestión para permisos necesarios para dar paso a la etapa de construcción.

Teniendo en cuenta el recorrido que se tiene proyectado para el día de hoy en los predios del complejo San Juan de Dios con la ERU, se da cierre a la mesa, concertándose la próxima mesa para el 18 de noviembre de 2022.

Refiere la señora María Helena que se enviara próximamente unas dudas que surgen por parte de la veeduría para ser resueltas en la próxima mesa.

Se da por termina la mesa.

4. Compromiso Establecido y Responsable					
Que	Quién	Cuando	Cómo	Por Qué	Para Qué
Actividad	Responsable	Fecha	Forma	Medio	Objetivo
Envío de acta de la mesa de trabajo	Oficina de Participación	26-09-2022		X	
Envío de preguntas	Veeduría	30-09-2022			
Próxima mesa de trabajo	Oficinas de Participación y Desarrollo Institucional- Veeduría Ciudadana	18-11-2022			

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE SALUD</small> <small>Subred Integrada de Servicios de Salud</small>	<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD</b> <b>CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b>	CÓDIGO: ET-CO-FI-001 VERSIÓN: 03 FECHA: 2020-02-10
	<b>FORMATO ACTA DE REUNION</b>	

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2022/09/23	Mesa de Trabajo Veeduría San Juan de Dios	8:00 am	9:00 am

**Registro fotográfico**





**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD**  
**CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

**BOGOTÁ - CO - FIC001**  
**VERSIÓN 01**  
**FECHA: 2020-02-10**


**BOGOTÁ ACTA DE REUNIÓN**

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2022/09/23	Mesa de Trabajo Veeduría San Juan de Dios	8:00 am	9:00 am

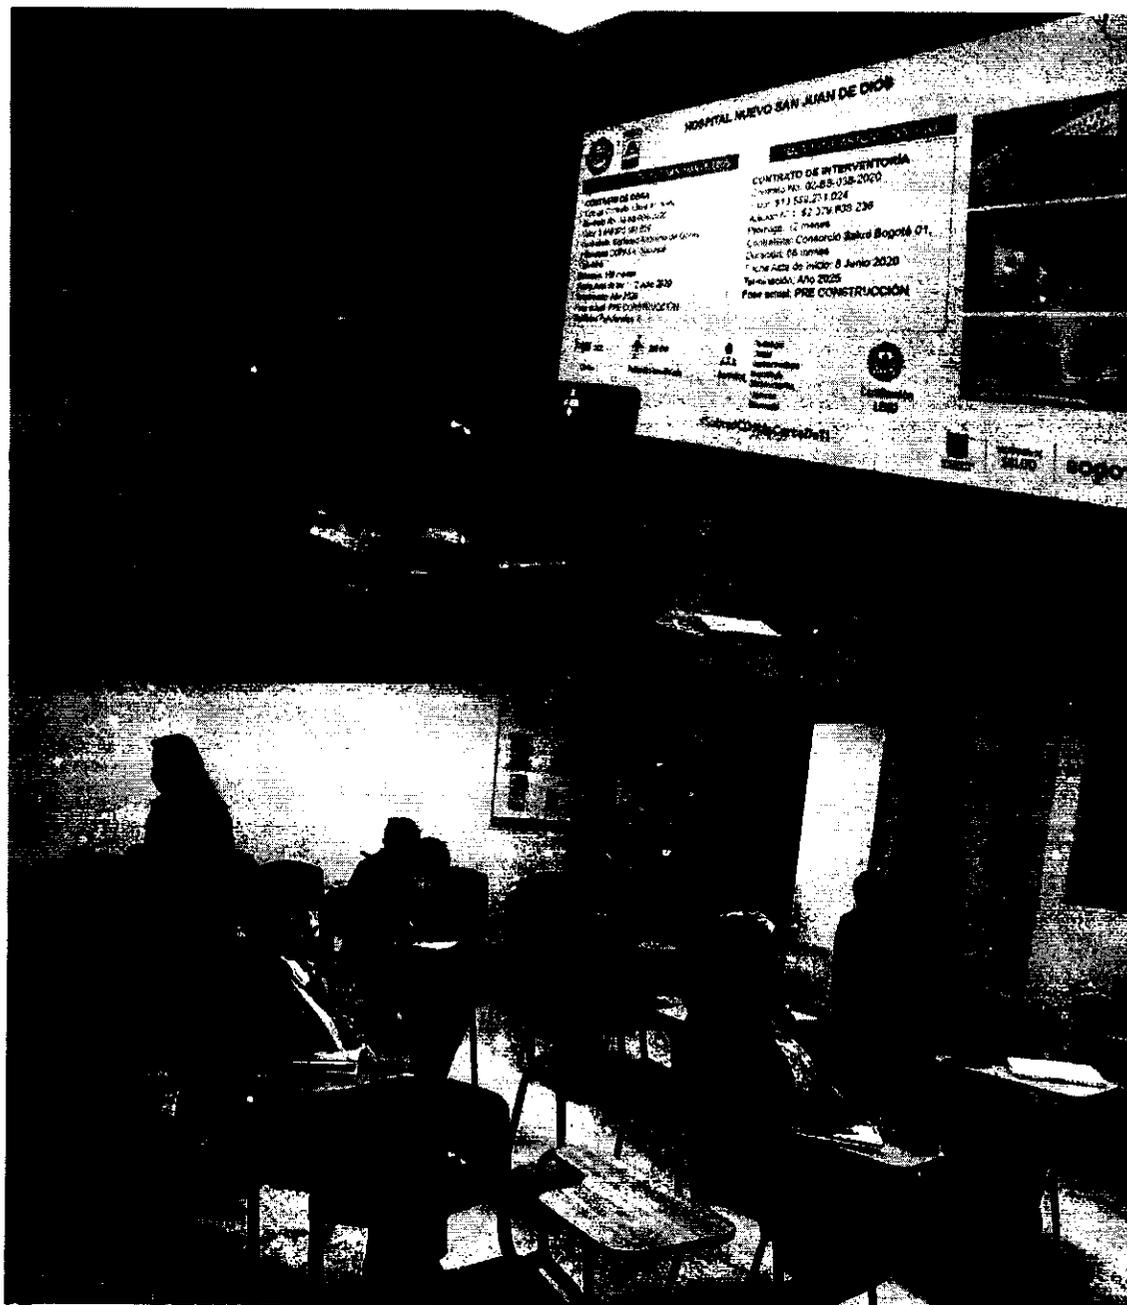

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud del Centro Oriente E.S.E.</p>	<p>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p>	<p>CÓDIGO: ET-CO-FT-001 VERSIÓN: 03 FECHA: 2020-02-10</p>
<p>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</p>		

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2022/09/23	Mesa de Trabajo Veeduría San Juan de Dios	8:00 am	9:00 am

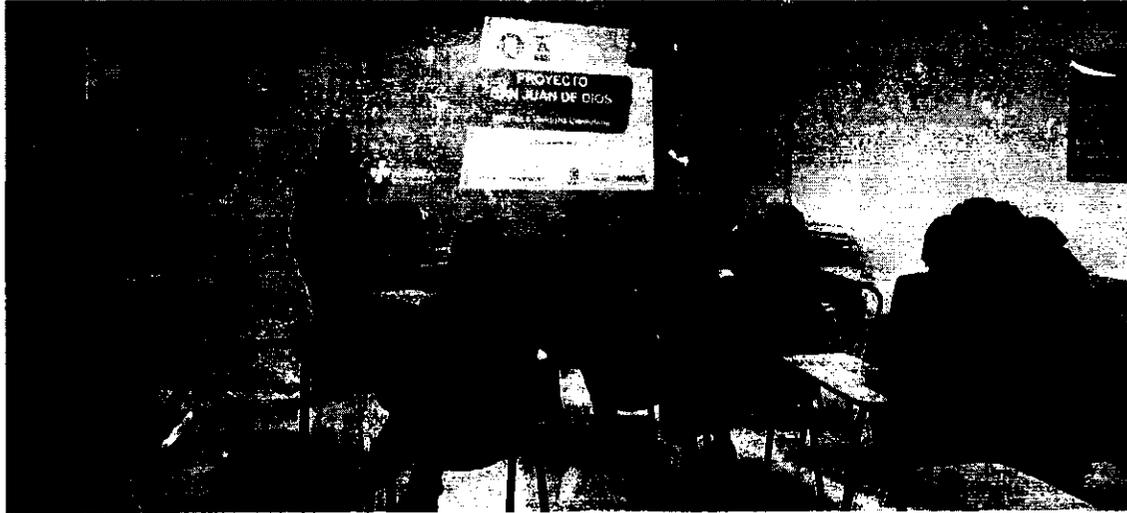

[Redacted]

[Redacted]

19/10/1922 N. 1000 di - f. 1000 - ced. n. 1000 - Sin. Jan. di P. 1000

[Redacted]

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>			
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	

Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa

**ACTA DE REUNIÓN**

**Tema: Mesa de diálogo con la Veeduría Santa Clara – Hospital Nuevo San Juan de Dios con la Dirección de Desarrollo Institucional de la Subred Integrada de Servicio de Salud de Centro Oriente.**

<b>Dirección / Oficina</b>	<b>Proceso</b>
Dirección de Participación, Gestión territorial y Transectorialidad.	Gestión Social en Salud

<b>Objetivo</b>	<b>Fecha:</b>			
Mesa de diálogo de seguimiento bimensual con la Veeduría Santa Clara – Hospital Nuevo San Juan de Dios con la Dirección de Desarrollo Institucional de la Subred Integrada de Servicio de Salud de Centro Oriente.	<b>TIPO</b>			
	<b>Reunión</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Asistencia Técnica</b> <input type="checkbox"/>		
		Asesoría <input type="checkbox"/>	Acompañamiento <input checked="" type="checkbox"/>	Capacitación <input type="checkbox"/>
	<b>Modalidad:</b>	Presencial <input checked="" type="checkbox"/>	Virtual <input type="checkbox"/>	Mixta <input type="checkbox"/>
	Lugar: Centro de Salud Antonio Nariño			
	Hora Inicio: 02:00 pm ____ Hora Fin: __04:00 pm			
	Notas por: Hederson Gualteros			
	Próxima Reunión: 23 de Marzo del 2022			
Quien cita: Dirección de Desarrollo Institucional de la Subred Centro Oriente				

**TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS \***

**Orden del Día:**

1. Saludo y bienvenida
2. Socialización del proyecto San Juan de Dios.
3. Preguntas de la ciudadanía veedora.
4. Conclusiones

**Desarrollo:**

1. Saludo y bienvenida

La Profesional de la oficina de participación de la Subred Centro Oriente, desarrolla el salud y bienvenida a los ciudadanos a la primera reunión del 2023, El profesional de Control Social de la Secretaría Distrital de Salud Hederson Gualteros, da inicio a la reunión brindando un saludo a todas y todos los ciudadanos, estableciendo el balance del año 2022 de cada uno de los procesos desarrollados y las mesas bimensuales que se han ejecutado alrededor de la Obra del Edificio Central del Hospital San Juan de Dios. Se afirma la necesidad de la sistematización de cada uno de los proceso en el anexo 2, se recuerdan los temas desarrollados en el pasado noviembre, junto con el balance, se recuerda de la información que brindaron en el concejo de Bogotá en el pasado 28 de noviembre del 2022.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	<b>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD</b> <b>DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>			
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>			
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	

Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa

## 2. Socialización del proyecto San Juan de Dios.




### HOSPITAL NUEVO SAN JUAN DE DIOS



**COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS**

**CONTRATO DE OBRA**

Tipo de Contrato: Llave en mano  
 Contrato No. 02-BS-008-2020  
 Valor: \$ 466.576.184.539  
 Contratista: Sociedad Anónima de Obras y Servicios COPASA, Sucursal Colombia.  
 Duración: 108 meses  
 Fecha Acta de Inicio: 2 Julio 2020  
 Terminación: Año 2029  
 Fase actual: PRE CONSTRUCCIÓN  
 Unidades Funcionales: 2

**LOCALIDAD: ANTONIO NARIÑO**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

Contrato No. 02-BS-038-2020  
 Valor: \$13.559.231.024  
 Adición N°1: \$2.379.838.236  
 Adición N°2: \$2.974.797.810  
 Prorroga N°1: 12 meses  
 Prorroga N°2: 15 meses  
 Contratista: Consorcio Salud Bogotá 01.PAYC SUPERVISIÓN S.A.S. 40%.- MAB INGENIERIA DE VALOR S.A 40%.- ZAÑARTU INGENIEROS CONSULTORES SEDE COLOMBIA 20%  
 Duración: 81 meses  
 Fecha Acta de Inicio: 8 Junio 2020  
 Terminación: Año 2027  
 Fase actual: PRE CONSTRUCCIÓN







312  
Comas



286.410  
Población beneficiada



Servicios

- Cardiología
- Orugía
- Gastroenterología
- Neurología



Medicina Interna

- Urgencias
- Vacunación



Certificación  
LEED



#SubredCOMásCercaDeTi  
26/01/2023




La Arquitecta Sandra de la Oficina de Desarrollo Institucional , inicia la exposición presentando los dos contratos que viene desarrollan la Subred Centro Oriente el primero con Sociedad Anónima de Obras y Servicios COPASA, Sucursal Colombia. Y el segundo, Consorcio Salud Bogotá 01.PAYC SUPERVISIÓN S A.S. 40%,- MAB INGENIERIA DE VALOR S.A 40% - ZAÑARTU INGENIEROS CONSULTORES SEDE COLOMBIA 20%, explicando la composición de cada uno de ellos. Recordando las generalidades del proyecto alrededor de los servicios.

De esta forma presentan cada uno de los hitos de la obra en todo lo relacionado con el cronograma de ejecución, recordando a los ciudadanos veedores las acciones realizadas desde las raditaciones del proyecto y cada uno de los pasos desarrollados en la ejecución de la obra en su etapa de preconstucción.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	<b>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD</b> <b>DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>			
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>			
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	

Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa

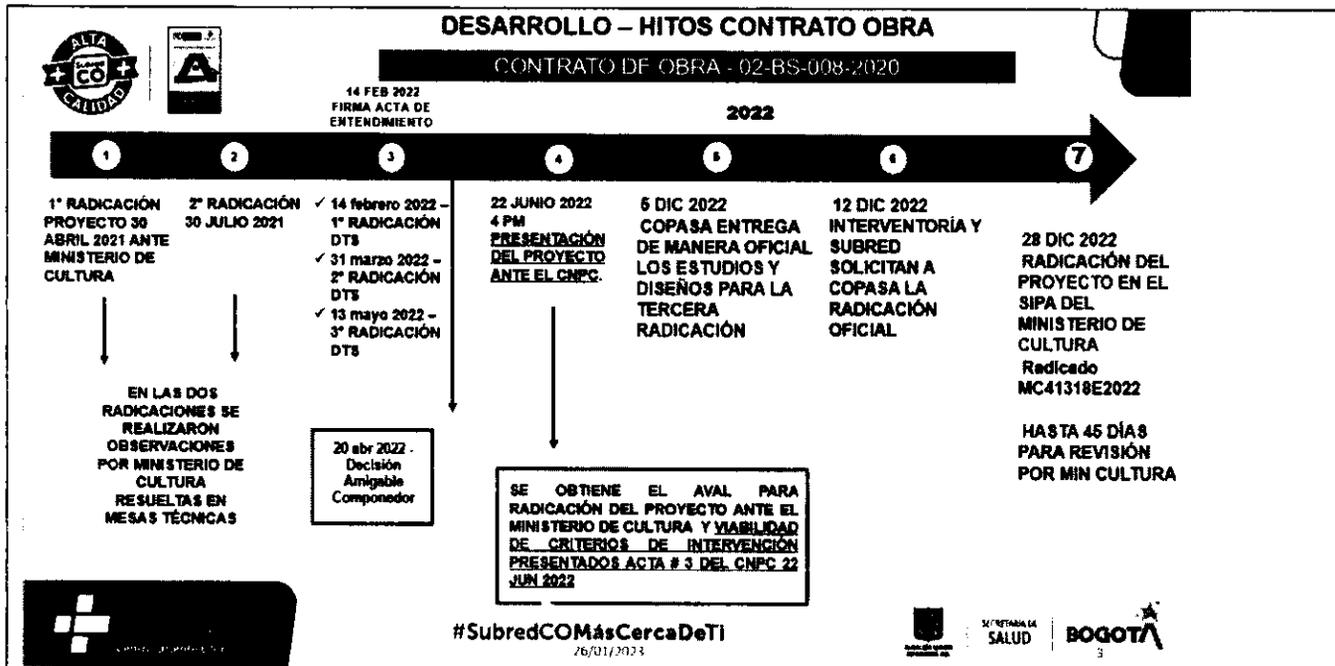

De esta forma, informan que los procesos de radicación del proyecto al Ministerio de Cultura, se encuentra realizado desde el pasado 28 de diciembre del 2022, entonces se espera los 45 días que toma de la dirección de patrimonio del Ministerio de Cultura para su entrega. Aclaran que los responsables directos son los contratistas en la Etapa de preconstrucción en el desarrollo de la obra.

### TERCERA RADICACIÓN ANTE MINISTERIO DE CULTURA

ENTREGA OFICIAL REALIZADA POR COPASA

- El 5 de Diciembre 2022 se realiza entrega OFICIAL por parte de COPASA de los Diseños a presentar para Radicación ante Ministerio de Cultura. Comunicado JAL-0821
- Con lo cual la Interventoría Consorcio Salud Bogotá 01 a través del Comunicado QBD 1225 del 12 de diciembre 2022 da viabilidad a la presentación de Estudios y Diseños.
- Y a su vez la Subred Centro Oriente a través del Comunicado 20221200207251 del 12 de diciembre 2022, solicita a COPASA la continuidad del proceso para Radicación del Proyecto de manera Definitiva ante el Ministerio de Cultura.

#SubredCOMásCercaDeTi  
26/01/2023

La arquitecta Sandra, el 5 de Diciembre 2022 se realiza entrega OFICIAL por parte de COPASA de los Diseños a presentar para Radicación ante Ministerio de Cultura. Comunicado JAL- 0821, atendiendo Con lo cual la Interventoría Consorcio Salud Bogotá 01 a través del Comunicado QBD 1225 del 12 de diciembre 2022 da viabilidad a la presentación de Estudios y Diseños. Informando que a su vez la Subred Centro Oriente a través

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>			
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	
Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa				

del Comunicado 20221200207251 del 12 de diciembre 2022, solicita a COPASA la continuidad del proceso para Radicación del Proyecto de manera Definitiva ante el Ministerio de Cultura.

Además del proceso, desde el día 12 de diciembre 2022 se realiza el proceso de consecución de documentos jurídicos necesarios para la Radicación ante Ministerio de Cultura así:

1. Carta de solicitud de autorización de la Intervención
2. Poder especial del propietario del predio
3. Copia cc de representante legal propietario del predio
4. Copia del acta de posesión del representante legal del propietario del predio
5. Copia de referencia del comodato que se adelanta con el propietario del predio
6. Listado de documentos a Radicar

Información entregada en su totalidad al Contratista el 23 de diciembre 2022

Fwd: Radicación del proyecto de intervención en el aplicativo SIPA del Mincultura

From: SIPA - Sistema de Información de Patrimonio Cultural [mailto:sipa@mincultura.gov.co]  
 Sent: Tuesday, December 27, 2022 6:23:00 PM  
 To: Gustavo Andrés Correa Barreto <gabarreto@arquitecta.com>  
 Subject: Radicación del proyecto de intervención en el aplicativo SIPA del Mincultura

**SIPA, Sistema de Información de patrimonio**

**Solicitud de autorización de intervención de inmueble declarado bien de interés cultural del ámbito nacional - BIC Nal**

Respetado señor (a): Gustavo Andrés Correa Barreto

La Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura recibió su solicitud mediante el radicado N° MC41318E2022 en el cual solicita evaluar el proyecto de intervención: NUEVA UHMES SANTA CLARA Y CAPS CONJUNTO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS con número de proyecto PROY-20221213054524, con la siguiente descripción:

Denominación o denominaciones del Bien: Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil

Tipo de bien: inmueble declarado bien de interés cultural del ámbito nacional - BIC Nal

Tipo de intervención: Reconstrucción

Ubicación: BOGOTÁ, D. C./BOGOTÁ, D.C.

Para hacerle seguimiento al proceso de evaluación, haga clic [aquí](#).





Cordialmente,

Mirella Cristina Cuellar Sánchez  
 Director de Patrimonio  
 Ministerio de Cultura





A partir de lo anterior, la Arquitecta se dispone a socializar cada uno de los planos, piso a piso explicando los servicios y acomodación que dispone.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	<b>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD</b> <b>DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>			
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>			
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	

Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa

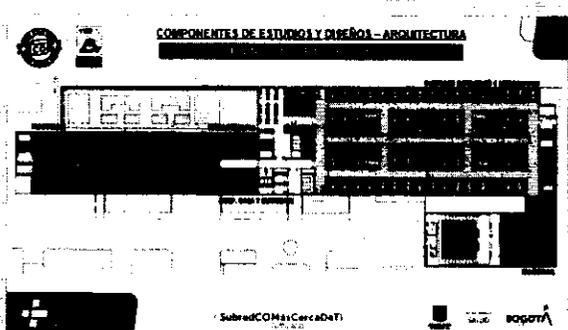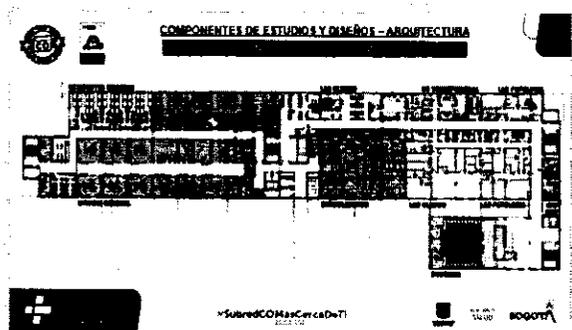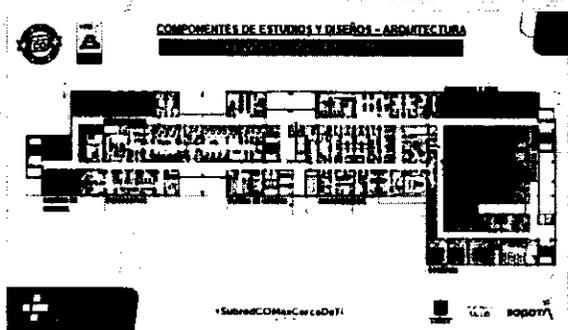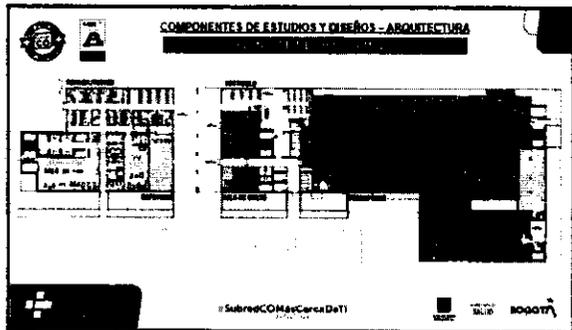


Desarrolla su exposición expresando cada una de los elementos, explicando que tienen inclusive en las imágenes la disposición del mobiliario que se tiene previsto para dotar el hospital en los presentes diseños.

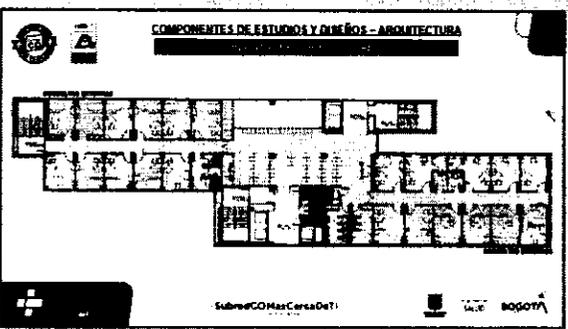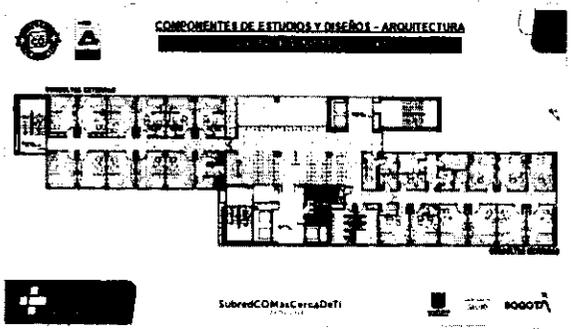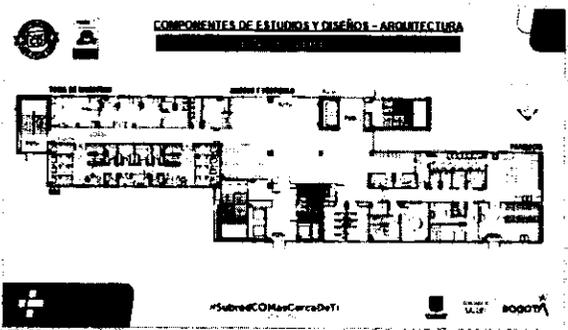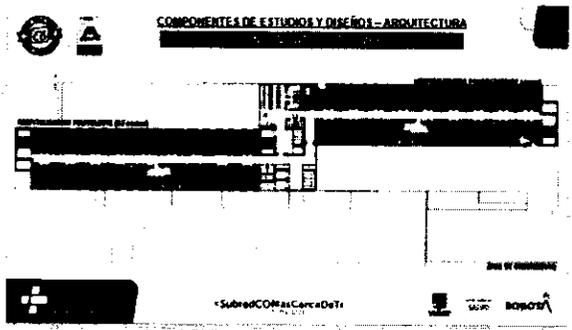


Además de presentar la disposición tanto de los espacios académicos que tendrá como Hospital Universitario, como todas las disposiciones para las especialidades más importantes que desarrolla el sector.

COMPONENTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS – ARQUITECTURA



SubredCOMásCercaDeTi

COMPONENTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS – ARQUITECTURA



SubredCOMásCercaDeTi

COMPONENTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS – IMÁGENES



SubredCOMásCercaDeTi

DESARROLLO – ESTADO ACTUAL CONTRATO OBRA

AVANCE DE OBRA – PLAN DE PROYECTO

Con la Radicación del Proyecto ante Ministerio de Cultura se retornará a COPASA el requerimiento de ajuste del Plan de Proyecto. En informe de interventoría para enero 2023 se logra una tendencia de avance del 92,25%.

Ítem	Revisión	Estado	%	Valor
Obra	1	100%	100%	1.00
Interventoría	1	92,25%	92,25%	1.00
<b>Total</b>			<b>92,25%</b>	<b>2.00</b>

SubredCOMásCercaDeTi

Se puede evidenciar que los estudios de arquitectura desarrollados por COPASA cuentan con las disposiciones, explicando las dimensiones en longitud y altura del proyecto, así mismo como las posibles imágenes que disponen de fachadas y muros, agregando que estos deben tener concordancia con el entorno que se encuentra en proceso de adjudicación a través de la arquitectura paisajística adelantada por la Empresa de renovación Urbana

En la actualidad el Contrato de Obra se encuentra en ejecución de la Etapa Preoperativa - Fase de Preconstrucción.

En cumplimiento de sus obligaciones contractuales, COPASA radicó ante el Ministerio de Cultura el Plan de Intervención (Radicado MC41318E2022 del 28 de diciembre de 2022)

Una vez se conozca el pronunciamiento formal del Ministerio de Cultura, y dependiendo del sentido del mismo, la Subred deberá establecer la ruta contractual a seguir, siempre en procura del cumplimiento de la ejecución contractual como fin estatal y de la efectiva prestación de servicios públicos, en este caso la salud.

La Subred, con el acompañamiento de la Interventoría integral para el Contrato de Obra hace un seguimiento semanal de las actividades que debe desarrollar COPASA. Igualmente, la Subred hace seguimiento semanal a la ejecución del Contrato de Interventoría.

19

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	<b>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD</b> <b>DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>				
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	7	
Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa					

**DESARROLLO - ESTADO ACTUAL CONTRATO OBRA**

En la actualidad el Contrato de Obra se encuentra en ejecución de la Etapa Preoperativa - Fase de Preconstrucción.

En cumplimiento de sus obligaciones contractuales, COPASA radicó ante el Ministerio de Cultura el Plan de Intervención (Radicado MC413118E2022 del 28 de diciembre de 2022)

Una vez se conozca el pronunciamiento formal del Ministerio de Cultura, y dependiendo del sentido del mismo, la Subred deberá establecer la ruta contractual a seguir, siempre en procura del cumplimiento de la ejecución contractual como fin esencial y de la efectiva prestación de servicios públicos, en este caso la salud.

La Subred, con el acompañamiento de la interventoría integral para el Contrato de Obra hace un seguimiento semanal de las actividades que debe desarrollar COPASA. Igualmente, la Subred hace seguimiento semanal a la ejecución del Contrato de Interventoría.

**DESARROLLO - ESTADO ACTUAL CONTRATO OBRA**

Valor Contrato: \$ 466.576.184.539 - Anticipo: \$ 69.986.427.681 equivalente al 15% del valor total del Contrato.

DESCRIPCIÓN	VALOR	%
VALOR OP DEL ESTADO DE OBRA	\$ 11.977.772,00	2,58%
VALOR OP DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS	\$ 2.000.000,00	0,43%
VALOR OP DE PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN	\$ 10.000.000,00	2,14%
VALOR OP DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS	\$ 10.000.000,00	2,14%
ANTICIPO GLOBAL CORRESPONDIENTE POR EJECUCIÓN	\$ 69.986.427,68	15,00%

Para la primera semana de enero 2023 las Ordenes de Pago aprobadas a COPASA son del 12,14% del valor del anticipo correspondientes a \$8.493.940.302

**DESARROLLO - ESTADO ACTUAL CONTRATO INTERVENTORÍA**

El contrato contempla pagos mensuales, diferenciados por cada uno de los etapas del proyecto, y el reconocimiento del IVA. A la fecha se han generado dos prórrogas al contrato en la fase de Pre-construcción. La 1ra por 12 meses y la 2da por 18 meses.

Se ha recibido un total de \$2.396 millones, correspondientes al 30,86% del valor del Contrato.

En trámite con SDS pago para Octubre - Noviembre 2022 por \$396.639.706 y revisión de pago en Subred para Diciembre 2022.

**SubredCO**  
**+ Cerca de ti**

**GRACIAS**

Síguenos en nuestros canales digitales

  
 SubredCO  
 @SubredCO

  
 SubredCO  
 @SubredCO

  
 SubredCO  
 @SubredCO

Del mismo modo, presentan que los contratistas se encuentran en la ejecución del 15% del contrato del cual detallan cada uno de los desembolsos, explicando a los veedores que el Valor Contrato: \$ 466.576.184.539 – Anticipo: 69.986.427.681 equivalente al 15% del valor total del Contrato, además que: Para la primera semana de enero 2023 las Ordenes de Pago aprobadas a COPASA son del 12,14% del valor del anticipo correspondientes a \$8.493.940.302

E las preguntas que realiza la Veeduría tiene que ver con la información de la propiedad del predio, que la Arquitecta Sandra explica que en este momento y desde el pasado octubre fue desarrollado por las partes. La propiedad se encuentra en manos de la Secretaria Distrital de Salud que entrega en como dato a COPASA la tenencia del proyecto mientras se ejecutan acciones de ejecución de obra.

**COMPROMISOS\***

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA

**REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA**

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Hederson Gualteros Tellez	H1Gualteros@saludc	301734075 6	DPSGTYT -STCO	

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>			
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	

Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa

		apital.gov.co			
2	////////////////////	////////////////////	//////////	////////////////////	//////////
3	////////////////////	////////////////////	//////////	////////////////////	//////////
4	////////////////////	////////////////////	//////////	////////////////////	//////////
5	////////////////////	////////////////////	//////////	////////////////////	//////////
6	////////////////////	////////////////////	//////////	////////////////////	//////////
7	////////////////////	////////////////////	//////////	////////////////////	//////////
8	////////////////////	////////////////////	//////////	////////////////////	//////////
9	////////////////////	////////////////////	//////////	////////////////////	//////////

**ASISTENTES**

**Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.**

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-PYC-FT-002, según lineamiento SDS-PYC-LN-011

**Evaluación y cierre de la reunión**

¿Se logró el objetivo?		Observaciones (si aplica)
Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Ninguna

\* Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.
