



NOMBRE DE LA REUNIÓN: MESA DE DIÁLOGO VEEDURÍA “CONVENIO 2980595 DE 2021- “PROYECTO ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y TERMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LA TORRE 1 DE LA USS MEISSEN.

RESPONSABLE: Mónica Salguero. Líder Proyectos Subred Integrada De Servicios De Salud Sur. **SECRETARIO:** Notas: Rosa T. Quintero. Profesional Participación Subred Sur Ciudad Bolívar.

REUNIÓN No. **FECHA:** Noviembre 25 de 2022 **HORA INICIO:** 10:00 a.m.

LUGAR: Oficina Sótano USS Meissen **HORA FINAL:** 11:30 a.m.

1. OBJETIVO:

REALIZAR MESA DE DIALOGO VEEDURÍA CONVENIO 2980595 DE 2021- “PROYECTO ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y TERMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LA TORRE 1 DE LA USS MEISSEN.

2. PARTICIPANTES:

Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de “Listado de asistencia DI-DE-FT-07

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1					
2					
3					
4					

5. Se anexa lista de asistencia

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)

1. Saludo y presentación del objetivo de la reunión
2. Presentación del objetivo de la reunión.
3. Seguimiento a compromisos
4. Socialización avances convenio. 2980595 DE 2021- “PROYECTO ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y TERMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LA TORRE 1 DE LA USS MEISSEN.
5. Aclaración de inquietudes a la comunidad.
6. Recorrido a la obra
7. Cierre.

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

- 6 veedores.
- Arquitecta Ana González Castillo.
- Ricardo Serrano. IC Meissen
- Rosa Tulia Quintero. Profesional Participación Comunitaria Subred Sur. Profesional de Participación Ciudad Bolívar Subred Sur.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

1. Entregar presentación o documento con los avances del convenio a los veedores en cada una de las reuniones, en el que se especifique que se ha realizado en cada uno de los pisos a intervenir. El día de hoy 25 de noviembre la Arquitecta Ana González hace entrega del documento (Se anexa presentación en Power Point).
2. Se acuerda realizar mesa de diálogo el día 18 de noviembre de 2022. Se reprogramó para el día de hoy 25 de noviembre, debido a que el día 18 de noviembre se cruzó con una actividad de la Subred Sur.



6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

Siendo las 10:00 a.m. se da inicio a la reunión.

1. La profesional de Participación Comunitaria de Ciudad Bolívar Subred Sur, Rosa Tulia Quintero, da un saludo de bienvenida y agradece la asistencia a esta mesa de diálogo.

2. Presentación del objetivo de la asamblea. La profesional de Participación Ciudad Bolívar Subred Sur, Rosa Tulia Quintero, presenta el objetivo de la reunión, es cual es dar a conocer los avances del **convenio. 2980595 DE 2021- "PROYECTO ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y TERMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LA TORRE 1 DE LA USS MEISSEN.**

3. Seguimiento a compromisos de la reunión del mes de septiembre de 2022. Se da respuesta en el numeral 5 del formato del acta.

4. Socialización avances del convenio 2980595 DE 2021- "PROYECTO ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y TERMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LA TORRE 1 DE LA USS MEISSEN. La arquitecta Ana González, inicia informando que durante el mes no se ha podido avanzar mucho, debido a que se están prestando simultáneamente los servicios de salud.

El ingeniero Ricardo Serrano, socializa los avances por cada área así:

-Sótano: Se termina mampostería con su respectivo confinamiento y se inicia pañete de muros con un avance del 90%.

-Primer Piso: Se está realizando mampostería y confinamiento con elementos no estructurales. Se Hace retiro de escombros a botadero certificado.

-Segundo piso: Se realizo desmonte del cielo falso, retiro de ductos de ventilación y de baterías sanitarias.

5. Aclaración de inquietudes a la comunidad.

Los veedores manifiestan satisfacción por los avances que se llevan hasta el momento, entiende el retraso en la obra por la razón de la prestación de los servicios, refieren que lo prioritario e importante es dar respuesta a las necesidades de los usuarios.





6.Recorrido por la obra: Terminada la reunión se realiza recorrido a la obra, con el fin de que los veedores, verifiquen la información que recibieron en el desarrollo de la reunión. Se anexa registro fotográfico



6.Cierre. Siendo las 11:30 m se da por terminada la reunión.

Se anexa lista de asistencia.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

MI-SIG-SIG-FT-01 V4

7. COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha limite dd-mm-aa)	QUIEN (Responsable)
Se acuerda realizar mesa de diálogo el día 16 de Diciembre de 2022	Mesa de Diálogo	30 de Diciembre de 2022	Dra. Mónica Salguero y Rosa Tulia Quintero. Subred Sur

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

Rosa Tulia Quintero.

Profesional Participación Subred Sur Ciudad Bolívar

SECRETARIO REUNIÓN




SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

LISTA ASISTENCIA REUNION MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

PS-PAR-FI-05 V2

N°	FECHA: (DD-MM-AA)	HORA DE INICIO: HORA TERMINACION:	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TEMA PRINCIPAL DE LA REUNION:		ESPACIO COMUNITARIO:		CORREO	FIRMA
				ORGANIZACION COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	NUMERO TELEFONO FIJO	NUMERO CELULAR		
1	25-11-2012		17.191.459	ASOCIACION MEISEN	19	314213108	3125436714	Reunion vacunas Toma 1 Meissen	
2			79831615	MEISEN	19	3144463649	3125436714		
3			91478720 B7h	MEISEN	19	314213108	3125436714		
4			51801601	MEISEN	19	3272300	314213108		
5			2375375	MEISEN	19	32031584	3125436714		
6			52269331	MEISEN	19	310314401	3125436714		
7			P.79310276	IC MEISEN	19	3715274382	3125436714		
8			52411839	Asociacion Meissen	19				
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									

ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, REFORZAMIENTO Y REORDENAMIENTO DE LA TORRE 1 DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD MEISEN




CONSORCIO
IC MEISEN 2022

BOGOTÁ D.C. – NOVIEMBRE 25 2022




SOTANO – ARQUITECTURA ADECUACIÓN

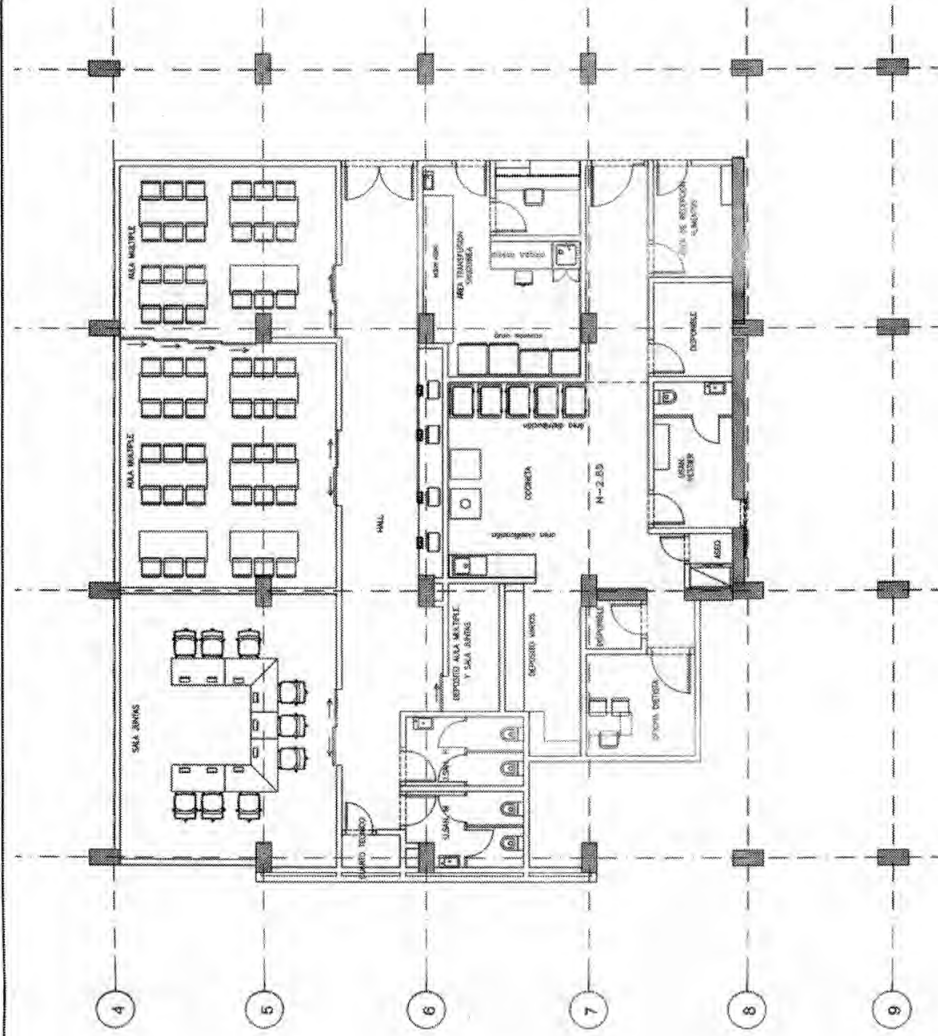

ACTIVIDADES EN OBRA:

- SE TERMINA MAMPOSTERIA CON SU RESPECTIVO CONFINAMIENTO.
- SE INICIA PAÑETE DE MUROS - AVANCE 90%





CONSORCIO
IC MEISEN 2022

SOTANO – ARQUITECTURA ADECUACIÓN

PORCENTAJE PROGRAMADO 19% EJECUTADO 27%





PAÑETES EN MUROS



CONSORCIO
IC MEISEN 2022

PRIMER PISO - ESTADO ACTUAL - ADECUACIÓN

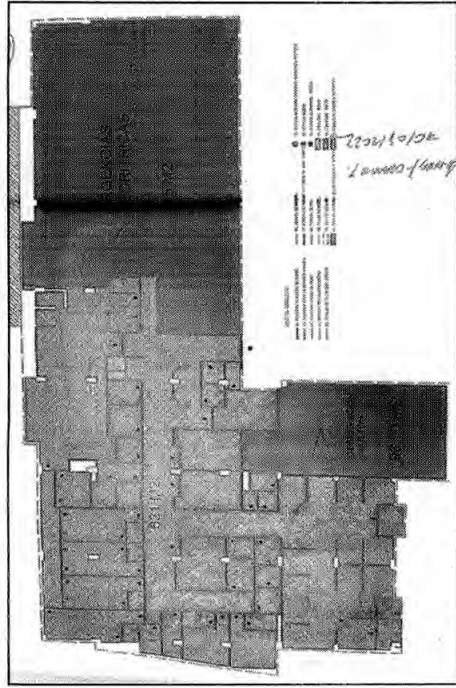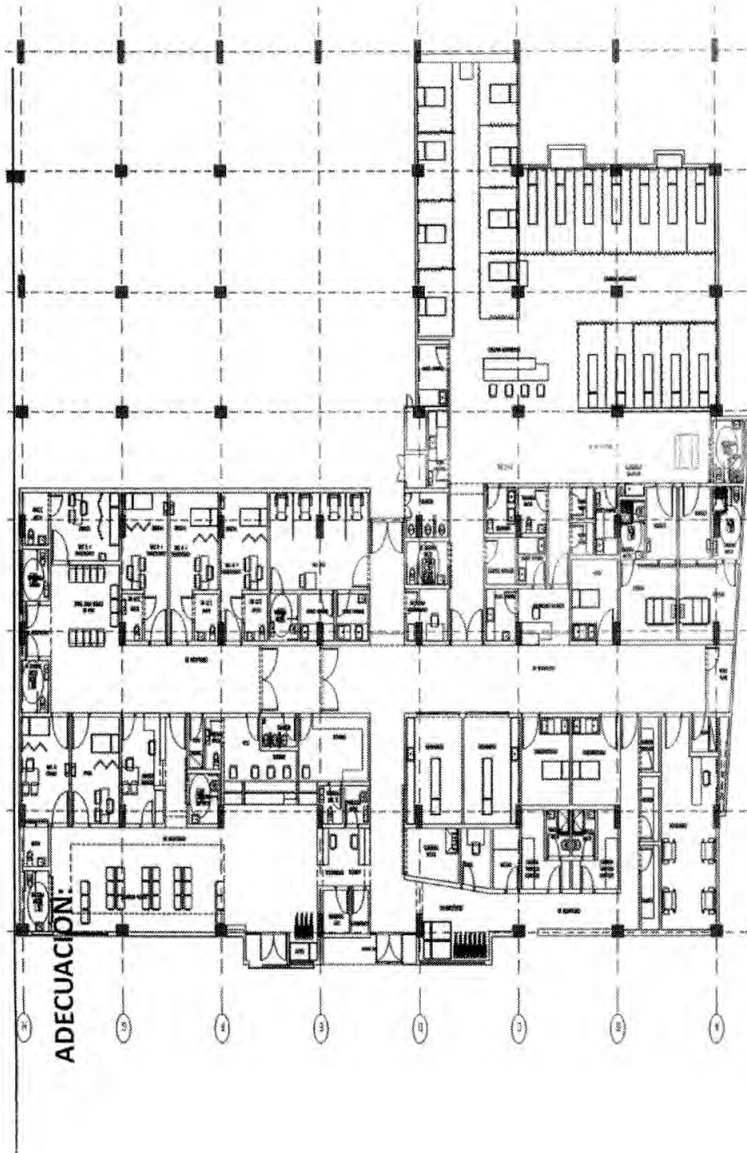


ACTIVIDADES EN OBRA:

Se esta realizando mampostería y confinamiento con elementos no estructurales. Se Hace retiro de escombros a botadero certificado.


ÁREAS DE INTERVENCIÓN PRIMER PISO:

- Urgencias: 696,33 m²
- Circulaciones: 281,75
- Total Construido: 1089,87 m²



CONSORCIO
IC MEISEN 2022

PRIMER PISO - ESTADO ACTUAL - ADECUACIÓN

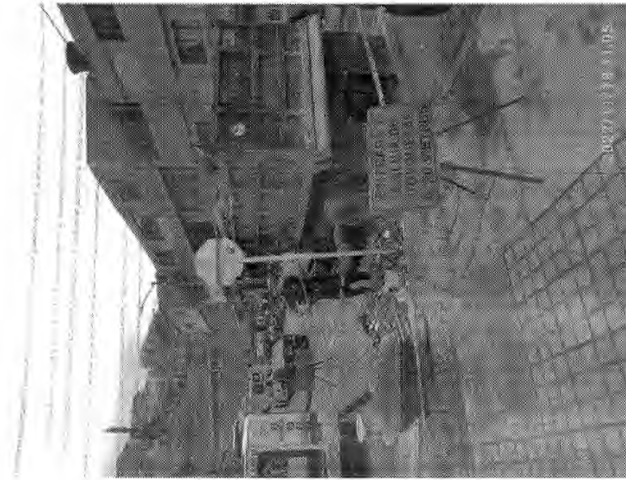

RETIRO DE ESCOMBROS
A BOTADERO CERTIFICADO



DEMOLICION DE
REVESTIMIENTO EN
MUROS



INICIO DE MAMPOSTERIA





AVANCE DE
MAMPOSTERIA



CONSORCIO
IC MEISEN 2022


Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E.

SEGUNDO PISO – ARQUITECTURA ADECUACIÓN

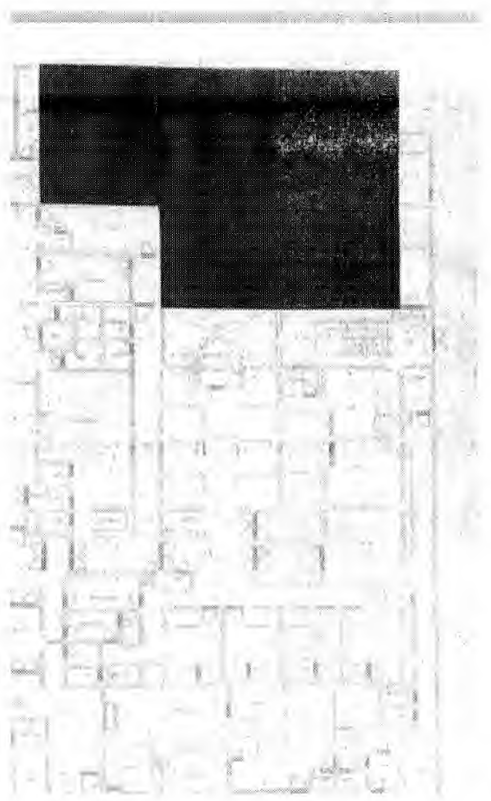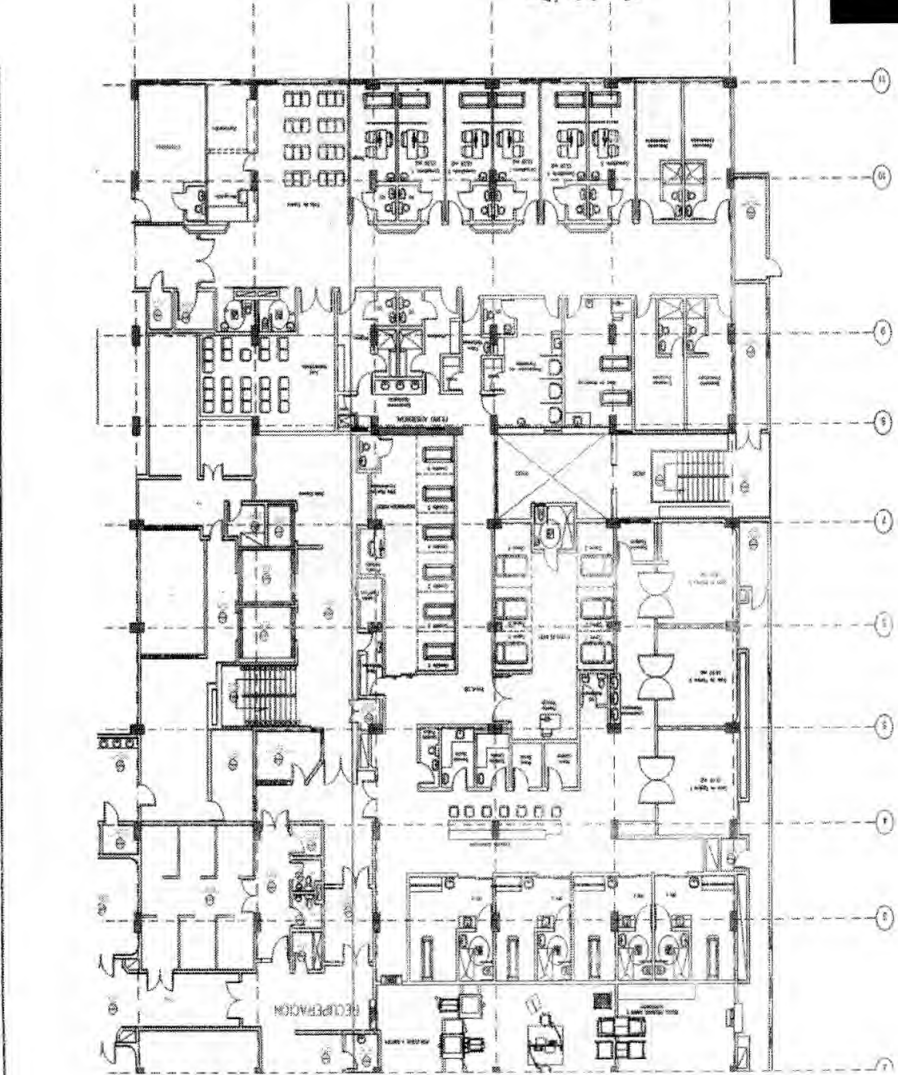


ACTIVIDADES EN OBRA:

Se realizo desmonte del cielo falso, retro de ductos de ventilación y de baterías sanitarias.



GRACIAS



**CONSORCIO
IC MEISSEN 2022**
