



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2022/09/23	Mesa de Trabajo Veeduría San Juan de Dios	8:00 am	9:00 am

Proceso, área que lidera la reunión	Nombre de quien elabora el acta
Participación Comunitaria	Leidy Johana Fuya M

1. Objetivo de la reunión:

Desarrollar mesa de trabajo con los veedores ciudadanos del proyecto de Infraestructura San Juan de Dios, dando cumplimiento a los cronogramas de encuentros y presentación de avances.

2. Temas a tratar:

Presentación de avances proyecto de Infraestructura San Juan de Dios
Presentación de equipo de interventoría y construcción.

3. Desarrollo:

Se realiza convocatoria a la ciudadanía vinculada a la Veeduría del proyecto de Infraestructura San Juan de Dios, de acuerdo al cronograma de mesas de trabajo, para dar inicio se brinda la bienvenida a los asistentes y por parte de la Dra. Marcia Jefe de la Oficina Asesora de Desarrollo Institucional de la Subred Centro Oriente, se informa que, de acuerdo a los compromisos pactados en las mesas anteriores, para la jornada del día se cuenta con la asistencia de profesionales de la firma interventora y el contratista a cargo de la obra.

Se realiza la presentación de los profesionales:

Nombre	Cargo	Institución
Saul Celis	Especialista construcción hospitalaria	Firma interventora Consorcio Salud Bogotá
Diego Fernando Quitian	Director interventoría	Firma interventora Consorcio Salud Bogotá
Gustavo Andrés Correa	Director de proyectos	Firma contratista COPASA

Continuando, da inicio la Dra. Marcia y el arquitecto con la presentación de los avances en la etapa precontractual de la obra:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2022/09/23	Mesa de Trabajo Veeduría San Juan de Dios	8:00 am	9:00 am



HOSPITAL NUEVO SAN JUAN DE DIOS



COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

CONTRATO DE OBRA
 Tipo de Contrato: Llave en mano
 Contrato No. 02-BS-008-2020
 Valor: \$ 466.576.184.539
 Contratista: Sociedad Anónima de Obras y Servicios COPASA, Sucursal Colombia.
 Duración: 108 meses
 Fecha Acta de Inicio: 2 Julio 2020
 Terminación: Año 2029
 Fase actual: PRE CONSTRUCCIÓN
 Unidades Funcionales: 2

LOCALIDAD: ANTONIO NARIÑO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
 Contrato No. 02-BS-038-2020
 Valor: \$13.559.231.024
 Adición N°1: \$2.379.838.236
 Prorroga: 12 meses
 Contratista: Consorcio Salud Bogotá 01,
 Duración: 66 meses
 Fecha Acta de Inicio: 8 Junio 2020
 Terminación: Año 2025
 Fase actual: PRE CONSTRUCCIÓN



312
Camas



286.410
Población beneficiada



Servicios
 Cardiología
 Cirugía
 Gastroenterología
 Neumología
 Medicina Interna
 Urgencias
 Vacunación



**Certificación
LEED**



#SubredCOMásCercaDeTi
23/09/2022



DESARROLLO – HITOS CONTRATO OBRA

CONTRATO DE OBRA - 02-BS-008-2020



2021

14 FEB 2022
FIRMA ACTA DE ENTENDIMIENTO

2022



1

2

3

4

5

6

7

1º RADICACIÓN PROYECTO 30 ABRIL 2021 ANTE MINISTERIO DE CULTURA

↓

EN LAS DOS RADICACIONES SE REALIZARON OBSERVACIONES POR MINISTERIO DE CULTURA RESUELTAS EN MESAS TÉCNICAS

2º RADICACIÓN 30 JULIO 2021

↓

2/DIC./2021 - AVAL POR MINISTERIO DE CULTURA PARA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO AL COMITÉ TÉCNICO DE PATRIMONIO Indicación de solicitud de Iniciar radicando el Documento Técnico de Soporte - DTS.

✓ 14 febrero 2022 – 1º RADICACIÓN DTS
 ✓ 31 marzo 2022 – 2º RADICACIÓN DTS
 ✓ 13 mayo 2022 – 3º RADICACIÓN DTS

↓

20 abr 2022 - Decisión Amigable Compendor

13 MAY 2022 – Presentación al CONSEJO DISTRITAL DE PATRIMONIO- Votación por Consideración que el Proyecto se enmarca dentro de las estrategias de protección y recuperación del CHSJD

1 JUN 2022 – Presentación al COMITÉ TÉCNICO del CONSEJO NACIONAL DE PATRIMONIO - CNPC- Otorgan aval para presentación del Proyecto ante el CNPC para el 22 de Junio 2022.

22 JUNIO 2022 4 PM PRESENTACIÓN DEL PROYECTO ANTE EL CNPC.

↓

SE OBTIENE EL AVAL PARA RADICACIÓN DEL PROYECTO ANTE EL MINISTERIO DE CULTURA



#SubredCOMásCercaDeTi
23/09/2022



De acuerdo a los compromisos de la mesa con las veedoras del mes de julio, el concepto del



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN


FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2022/09/23	Mesa de Trabajo Veeduría San Juan de Dios	8:00 am	9:00 am

amigable componedor, la Dra. Marcia resalta que, para el 20 de abril de 2022 se presenta la decisión del amigable componedor la cual tiene implicaciones en el proyecto.



PRESENTACIÓN ANTE CNPC – JUN 2022

IMPACTO DEL PROYECTO

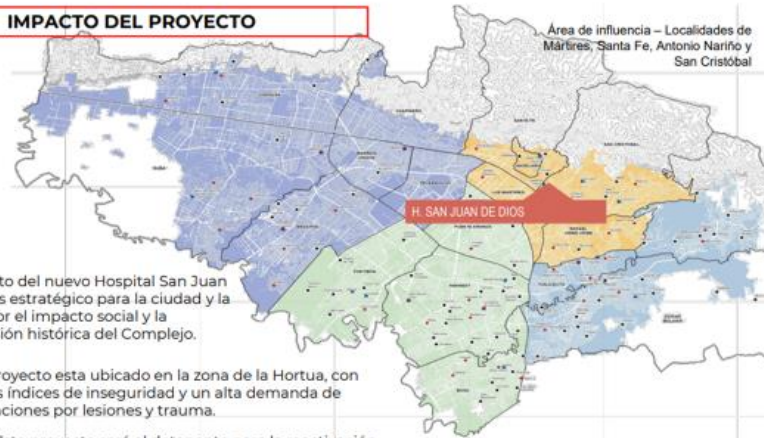

- El proyecto del nuevo Hospital San Juan de Dios es estratégico para la ciudad y la región, por el impacto social y la connotación histórica del Complejo.
- El proyecto está ubicado en la zona de la Hortua, con altos índices de inseguridad y una alta demanda de atenciones por lesiones y trauma.
- Este proyecto será el detonante para la reactivación de los espacios abiertos y servicios asistenciales del Complejo San Juan de Dios para la comunidad.



#SubredCOMásCercaDeTi
23/09/2022



SECRETARÍA DE
SALUD



CONTEXTUALIZACIÓN



Área Afectada

Zona de Influencia

Ubicación:

Localidad 15 Antonio Nariño – UPZ 35 Ciudad Jardín, Barrio la Hortua.
Localidad 04 San Cristóbal - UPZ 33 Sosiego, barrio Modelo Sur.

Número de matrícula:

50S-40727785

Código catastral:

AAA0262XCNX

Dirección Catastral:

Carrera 10 No. 1-59 Sur

Área según matrícula inmobiliaria:

13 hectáreas (16,3 Ha con predios del Instituto Radium).
001208001

Código del sector:

Edificios:

24 inventariados y 12 menores

Protección Nacional:

Monumento Nacional.

PEMP:

Lev 735 de 2002

Modificación 1:

Resolución 4033 de 2018

Aclaraciones:

Resolución 3626 de 2017 y 3917 de 2019



#SubredCOMásCercaDeTi
23/09/2022



SECRETARÍA DE
SALUD



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2022/09/23	Mesa de Trabajo Veeduría San Juan de Dios	8:00 am	9:00 am



PRINCIPIOS GENERALES DE INTERVENCIÓN

Respeto de la evolución
histórica del bien,
valoración crítica de
agregados

Presenta los elementos a liberar
según niveles de intervención del
PEMP y acta 01 de 2021 del CNPC



1. Conservación Integral
 2. Conservación de tipo arquitectónico
 3. Conservación contextual / compatibles con contexto
- Liberaciones previstas en el PEMP

Nota: A partir del Decreto 1080 de 2015 del Ministerio de Cultura y los criterios establecidos en las condiciones de Manejo Capítulo 4 del PEMP del Conjunto Hospitalario San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil aprobado mediante Resolución 995 de 2016.



#SubredCOMásCercaDeTi
23/09/2022



SECRETARÍA DE
SALUD



CRITERIOS GENERALES DE INTERVENCIÓN



Puesta en valor de las relaciones del CHSJD
con su contexto urbano y ambiental

Implantación que dialoga con los ejes
compositivos del CHSJD

Desarrollo volumétrico propio de la actividad que alberga
(De acuerdo con el Programa Médico Arquitectónico)

Definición de fachadas acordes con el desarrollo
del conjunto patrimonial

Fuente: Imagen Presentación Contrato interadministrativo 232/2013.
PEMP Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil



#SubredCOMásCercaDeTi
23/09/2022



SECRETARÍA DE
SALUD



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2022/09/23	Mesa de Trabajo Veeduría San Juan de Dios	8:00 am	9:00 am



CRITERIOS GENERALES DE INTERVENCIÓN ALAMEDA



ALAMEDA
SECTOR NORMATIVO 5D

OBJETIVOS PROYECTO EMBLEMÁTICOS PEMP SAN JUAN DE DIOS

- Ofrecer a la comunidad de los barrios circundantes, espacios abiertos, colectivos y zonas verdes para su disfrute
- Integración del predio con la estructura urbana planteada para la zona de influencia
- Vincular de manera física y espacial las instituciones del costado occidental del predio (Ancianato, Dermatológico, y nuevos desarrollos)




#SubredCOMásCercaDeTi
23/09/2022



SECRETARÍA DE
SALUD



CRITERIOS GENERALES DE INTERVENCIÓN UMHES

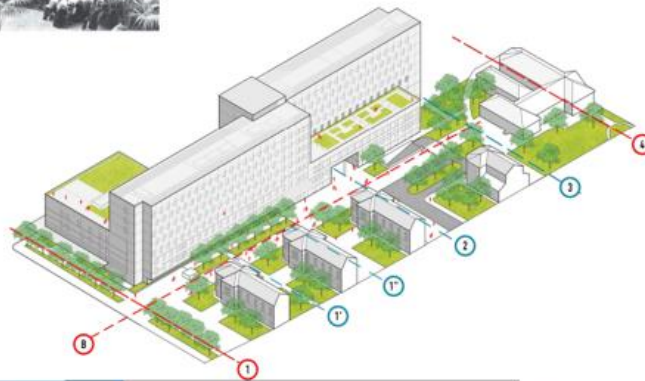

#SubredCOMásCercaDeTi
23/09/2022



SECRETARÍA DE
SALUD






ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO


CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2022/09/23	Mesa de Trabajo Veeduría San Juan de Dios	8:00 am	9:00 am




CRITERIOS GENERALES DE INTERVENCIÓN UMHES





CRITERIOS DE INTERVENCIÓN Y DE DISEÑO DEL SECTOR
NORMATIVO 3 - UMHES

CRITERIOS NORMATIVOS	Optimizar la edificabilidad permitida en la normativa establecida en el PEMP
CRITERIOS URBANÍSTICOS	Restituir las conexiones Norte - Sur , Manejo de terrazas verdes, Relaciones internas - externas
CRITERIOS FUNCIONALES	Incluir en el CHSJD un Hospital Universitario de alta complejidad que reactive y revitalice el uso del BIC y su vínculo con la comunidad.
CRITERIOS AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICOS	Fortalecer la jerarquía de los ejes B y C del CHSJD Aportar en la caracterización de espacios abiertos desde las propuestas vegetales Reinterpretar el área verde pre-existente antes de la aparición de la Torre Central
CRITERIOS DE VALORACIÓN PATRIMONIAL	Liberar el área perimetral y mejorar las condiciones de distanciamiento entre el UMHES y las edificaciones patrimoniales circundantes : San Eduardo, San Lucas, Paulina Ponce, Siberia, Santiago Samper y Enfermedades Tropicales Reinterpretar el área de espacios verdes existentes anteriores a la implantación de la Torre Central, entendida como masas y/o franjas verdes en el sentido oriente - occidente asociadas principalmente al eje C, como estrategia de resignificación del paisaje histórico del conjunto hospitalario Facilitar la integración de los sectores norte y sur del San Juan de Dios (Eje 2), propiciando la puesta en valor de los inmuebles que conforman el sector sur (<i>Samper, Enfermedades Tropicales y Salud Mental</i>), a través de una mayor permeabilidad visual y funcional de la primera planta Integrar el eje C como sendero peatonal del Complejo en sentido oriente - Occidente , como fortalecimiento de la visión de conjunto y propiciando la aparición de espacios de encuentro diferenciales en las relaciones público - privadas de los mismos. Establecer diálogos formales entre la envolvente de la edificación propuesta y su contexto patrimonial inmediato




#SubredCOMásCercaDeTi
23/09/2022






CRITERIOS GENERALES DE INTERVENCIÓN CAPS




CRITERIOS DE INTERVENCIÓN Y DE DISEÑO DEL SECTOR
NORMATIVO 5B - CAPS

CRITERIOS NORMATIVOS	Cumplir las normas establecidas en el PEMP
CRITERIOS URBANÍSTICOS	Articular la conexión entre la Alameda con las edificaciones del costado oriental
CRITERIOS FUNCIONALES	Incluir en el CHSJD un Centro de Salud que complemente los servicios del Hospital Universitario de alta complejidad y apoye la reactivación del BIC
CRITERIOS AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICOS	Generar áreas verdes que aporten en la consolidación de áreas libres jerarquizadas en relación con el CHSJD Aportar en la continuidad y fortalecimiento del eje C Establecer la separación y caracterización de espacios con usos diferenciados
CRITERIOS DE INTERVENCIÓN PATRIMONIAL	Integrar el eje compositivo 6 como elemento jerárquico en la composición, y/o generador de simetrías Integrar el eje compositivo C como articulador del complejo en sentido oriente - occidente Consolidar espacios de encuentro como parte de la red de espacios abiertos caracterizados Fortalecer las relaciones público - privado a través de la planta de primer piso Establecer diálogos formales entre la envolvente de la edificación propuesta y su contexto patrimonial inmediato



#SubredCOMásCercaDeTi
23/09/2022





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2022/09/23	Mesa de Trabajo Veeduría San Juan de Dios	8:00 am	9:00 am



POTENCIALIZACIÓN VALORES DE PATRIMONIO CULTURAL
DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

Se refuerza la vocación verde del
Complejo Hospitalario

Se reinterpretan y ponen en valor
zonas verdes perdidas

Se minimiza el tráfico vehicular

Se libera el área perimetral en el
Sector 3 y se mejoran las condiciones
de distanciamiento con diferentes
inmuebles patrimoniales del
conjunto:

- Siberia
- Santiago Samper
- Enfermedades Tropicales
- Pabellones

Se garantiza la reapertura del
Hospital San Juan de Dios como un
Hospital Universitario de 4to Nivel

Al servicio de la comunidad
académica y la ciudadanía



#SubredCOMásCercaDeTi
23/09/2022



SECRETARÍA DE
SALUD




DESARROLLO – ESTADO ACTUAL CONTRATO OBRA

AVANCE DE OBRA . PLAN DE PROYECTO

COPASA se encuentra actualmente realizando el análisis respectivo del PLAN DE PROYECTO, con el fin de poder evaluar los impactos en el cronograma que ha tenido, la decisión del amigable componedor y el proceso adelantado ante Ministerio de Cultura.

6. GUIA INFORMATIVA DE TENDENCIA DE AVANCE DE OBRA.

PORCENTAJE PONDERADO				
Ejecución	Observado	Esperado	Diferencia	Adelanto / Atraso semanas
Acumulado Anterior	67,03%	100,00%	-32,97%	-67,78
Durante el Período	0,00%	0,00%	0,00%	-1,00
Acumulado Actual	67,03%	100,00%	-32,97%	-68,78



#SubredCOMásCercaDeTi
23/09/2022



SECRETARÍA DE
SALUD



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2022/09/23	Mesa de Trabajo Veeduría San Juan de Dios	8:00 am	9:00 am



DESARROLLO – ESTADO ACTUAL CONTRATO OBRA

CONTRATO DE OBRA - 02-BS-008-2020 –ORDENES DE PAGO POR ANTICIPO

Valor Contrato: \$ 466.576.184.539 – Anticipo: 69.986.427.681 equivalente al 15%

- Para Septiembre 2022 las Ordenes de Pago aprobadas a COPASA son del 11.3% del valor del anticipo correspondientes a \$7.936.796.218.

ANTICIPO GIRADO	69.986.427.681	100%
VALOR OP SOLICITADAS (hasta la OP No. 277)	12.456.618.160	17,7%
VALOR OP APROBADAS	7.936.796.218	11,3%
VALOR OP EN REVISIÓN DE INTERVENTORÍA	0	0%
VALOR OP EN REVISIÓN DE COPASA	19.792.188	0,02%
VALOR OP NEGADAS / DEVUELTAS	4.500.119.754	6,4%
ANTICIPO GIRADO PENDIENTE POR EJECUTAR	62.049.631.464	88,6%

Tabla de pagos por anticipo – septiembre 2022



#SubredCOMásCercaDeTi
23/09/2022



SECRETARÍA DE
SALUD



DESARROLLO – ESTADO ACTUAL CONTRATO INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORIA - 02-BS-038-2020

- El contrato contempla pagos mensuales, diferenciados por cada una de las etapas del proyecto, y el reconocimiento del (IVA). A la fecha se ha facturado un total de \$4.713 millones, correspondientes al 34,7% del Contrato. Se encuentra en trámite prórroga y adición para la fase de Preconstrucción.

	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO Incluido MAYO 2022	SALDO DEL CONTRATO
VALOR TOTAL A LA FECHA	15.939.069.260	4.713.401.840***	11.225.667.420

Tabla de pagos a Interventoría – junio 2022

Pendiente facturar \$ 396.639.706 correspondiente a Junio y Julio 2022



#SubredCOMásCercaDeTi
23/09/2022



SECRETARÍA DE
SALUD





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2022/09/23	Mesa de Trabajo Veeduría San Juan de Dios	8:00 am	9:00 am

Toma la palabra la señora Aleyda, orienta su intervención a los pagos realizados a los contratistas de la obra, y desde su perspectiva no se evidencia avances en el proyecto.

Respecto a esto, informa la Dra. Marcia que, durante la etapa de pre construcción, las acciones pese a que no son tan tangibles, si ha presentado un sin numero de actividades, mesas de trabajo, para la concertación de los diseños de la obra y toda la gestión para permisos necesarios para dar paso a la etapa de construcción.

Teniendo en cuenta el recorrido que se tiene proyectado para el día de hoy en los predios del complejo San Juan de Dios con la ERU, se da cierre a la mesa, concertándose la próxima mesa para el 18 de noviembre de 2022.

Refiere la señora María Helena que se enviara próximamente unas dudas que surgen por parte de la veeduría para ser resueltas en la próxima mesa.

Se da por termina la mesa.

4. Compromisos Establecidos y Responsables

Qué Tarea o Actividad	Quién Responsable	Cuándo Fecha límite	Observaciones		
			Si	No	
Envío de acta de la mesa de trabajo	Oficina de Participación	26-09-2022		X	
Envío de preguntas	Veeduría	30-09-2022			
Próxima mesa de trabajo	Oficinas de Participación y Desarrollo Institucional- Veeduría Ciudadana	18-11-2022			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2022/09/23	Mesa de Trabajo Veeduría San Juan de Dios	8:00 am	9:00 am

Registro fotográfico





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2022/09/23	Mesa de Trabajo Veeduría San Juan de Dios	8:00 am	9:00 am





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2022/09/23	Mesa de Trabajo Veeduría San Juan de Dios	8:00 am	9:00 am





FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
23/10/2022	Mesa de trabajo veeduría San Juan de Dios	8:00am	9:00am

5. Asistencia

Nombres y Apellidos	Cargo	Área (unidad)	Correo	Firma
1. Andrés Castro Vando	Veedor	/	acastro2607@hotmail.com	[Firma]
2. Day Stella Belli	Integrante	/	stellabelli19@gmail.com	[Firma]
Yolanda Becker	Integrante	/	yolabec19@gmail.com	[Firma]
Luis Roberto Muro	Integrante	/	lroberto1941@gmail.com	[Firma]
Magdalena Misse	Integrante	/	527@91mail.com misse.magdalena	[Firma]
Emma Fede Boreca	Integrante	/	emmafede@saludcapital.gov.co	[Firma]
Eliana Paola Martínez C.	Coordina. Local MTS. Antonio Nariño.	/	EPHartinez@saludcapital.gov.co	[Firma]
María Helena Becerra	Veedora	/	anelk.395@gmail.com	[Firma]
Federico Guaitero	Control Social-Profesional	SDS-DPSGT4T	H16guaiteros@saludcapital.gov.co	[Firma]
Saul Celis Pérez	Especialista Forestal Hospitalario Interventor	Comunicación Hospital	cepib@saludcapital.gov.co	[Firma]
DIEGO FERNANDO QUITIAN B	DIR INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	hospital.santolara@cehc.co	[Firma]
Marcia Grisely Guaranese V.	Jose Q. Arzobispo D	Interventoría	decomolbin@saludcapital.gov.co	[Firma]
CARLOS A. ROSAS B.	APDO TECNICO	Interventoría	AROSASJUAN@saludcapital.gov.co	[Firma]
Gustavo Andrés Correa J	Dir. Proyecto	Copasa	gacorra@copasa.gov.co	[Firma]
Jedy Johana Faya Muro	Profesional de Participación Ciudadana	Subred CO	Participacionciudadana@saludcapital.gov.co	[Firma]

