

Construcción Troncal Av Cali Instituto de Desarrollo Urbano - IDU



INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO



1

GENERALIDADES

2

GRUPO 1

3

GRUPO 2

4

GRUPO 3

5

GRUPO 4

1

GENERALIDADES

Principales Beneficios

- Población beneficiada: 1.194.768 Habitantes
- Av. Circunvalar Sur (límite Soacha) a Av. Américas
- Localidades: Bosa - Kennedy



7.4 KM

VÍA



7.4 KM

CICLORRUTA



137.807 M2

ESPACIO PÚBLICO



Estación Terreros

1

GENERALIDADES

FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS

Factibilidad Y Actualización, Complementación, Ajustes De Los Estudios Y Diseños, Y Estudios Y Diseños Para La Ampliación Y Extensión De La Avenida Ciudad De Cali Al Sistema Transmilenio, Entre La Avenida Circunvalar Del Sur Y La Avenida Calle 170 Y De Los Equipamientos Urbanos Complementarios, En Bogotá.

Contrato Consultoría IDU-1352-2017	CONSORCIO TRONCALES BOGOTA <small>(INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS SAS INGETEC SAS ANTES INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS S.A. INGETEC - INGETEC I&D SAS ANTES INGETEC INGENIERIA & DISEÑOS S.A)</small>	Terminación Actual 19-ago-20	Estado: Suspendido	\$17.609.537.731
Contrato Interventoría IDU-1393-2017	CONSORCIO CIVILTEC – PIV <small>(CIVILTEC INGENIEROS LTDA PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES LTDA. - P.I.V. INGENIERIA LTDA.)</small>	Terminación Actual 19-sep-20	Estado: Suspendido	\$2.837.225.934

1

GENERALIDADES

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO - GRUPOS




2

GRUPO 1

LONGITUD: 2.85 KM

AV. CIRCUNVALAR SUR A AV. BOSA

CONTRATISTA	CONTRATO IDU-1646- 2020	CONSORCIO CONEXIÓN 20	JMV INGENIEROS S.A.S. TECCIVIL S.A.S. CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO INGENIERIA S.A.S. VIAS, TUNELES Y PAVIMENTOS S.A.S	\$141.226.481.736
INTERVENTORÍA	IDU- 1666- 2020	CONSORCIO INTER AVENIDAS	GNG INGENIERÍA S.A.S. B&C S.A. INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.	\$11.551.228.902

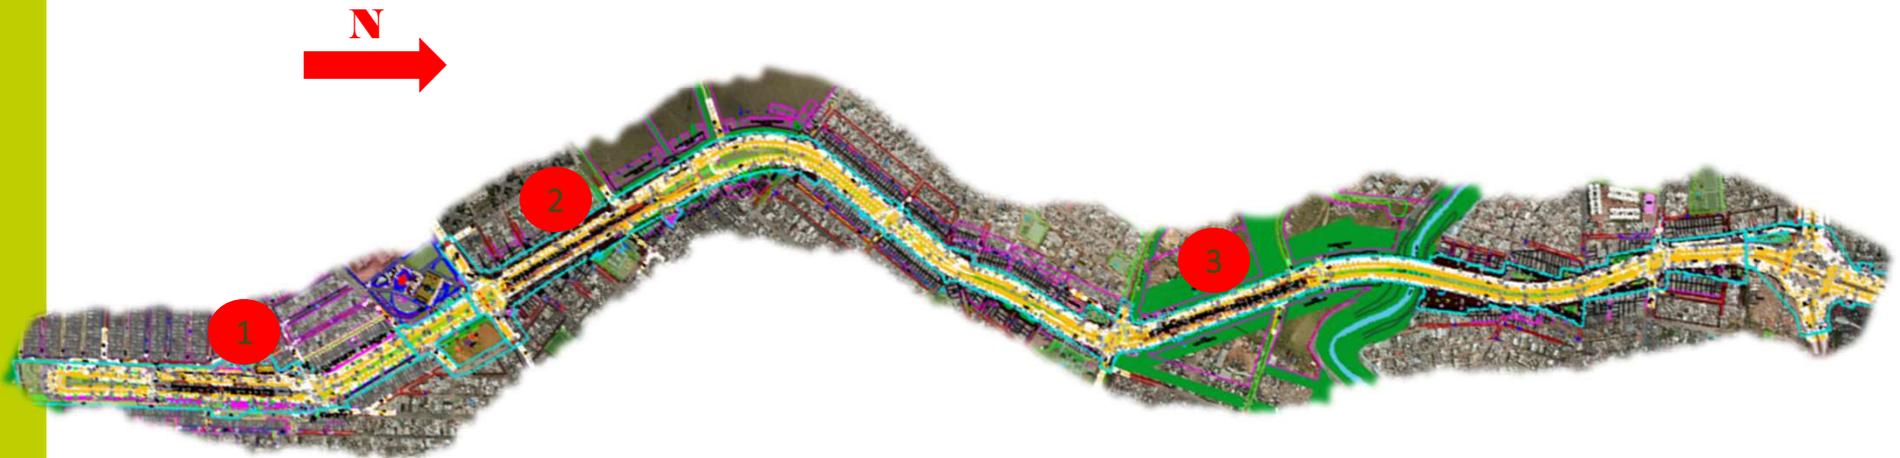

PRECONSTRUCCIÓN 6 MESES

CONSTRUCCIÓN 18 MESES

MANTENIMIENTO 60 MESES

Infraestructura principal

1. Estación Transmilenio – Terreros
2. Estación Transmilenio – San Bernardino
3. Estación Transmilenio – Calle 70 Sur


3

GRUPO 2

LONGITUD: 2.50 KM

AV. BOSA A AV. VILLAVICENCIO

CONTRATISTA	CONTRATO IDU-1647- 2020	CONSORCIO SANTA MARÍA 004	ALCA INGENIERÍA S.A.S CASTRO TCHERASSI S.A.	\$221.019.965.377
INTERVENTORÍA	IDU- 1667- 2020	CONSORCIO SUPERVISOR A - H	ACI PROYECTOS S.A.S HMV PROYECTOS S.A.S	\$11.305.413.321

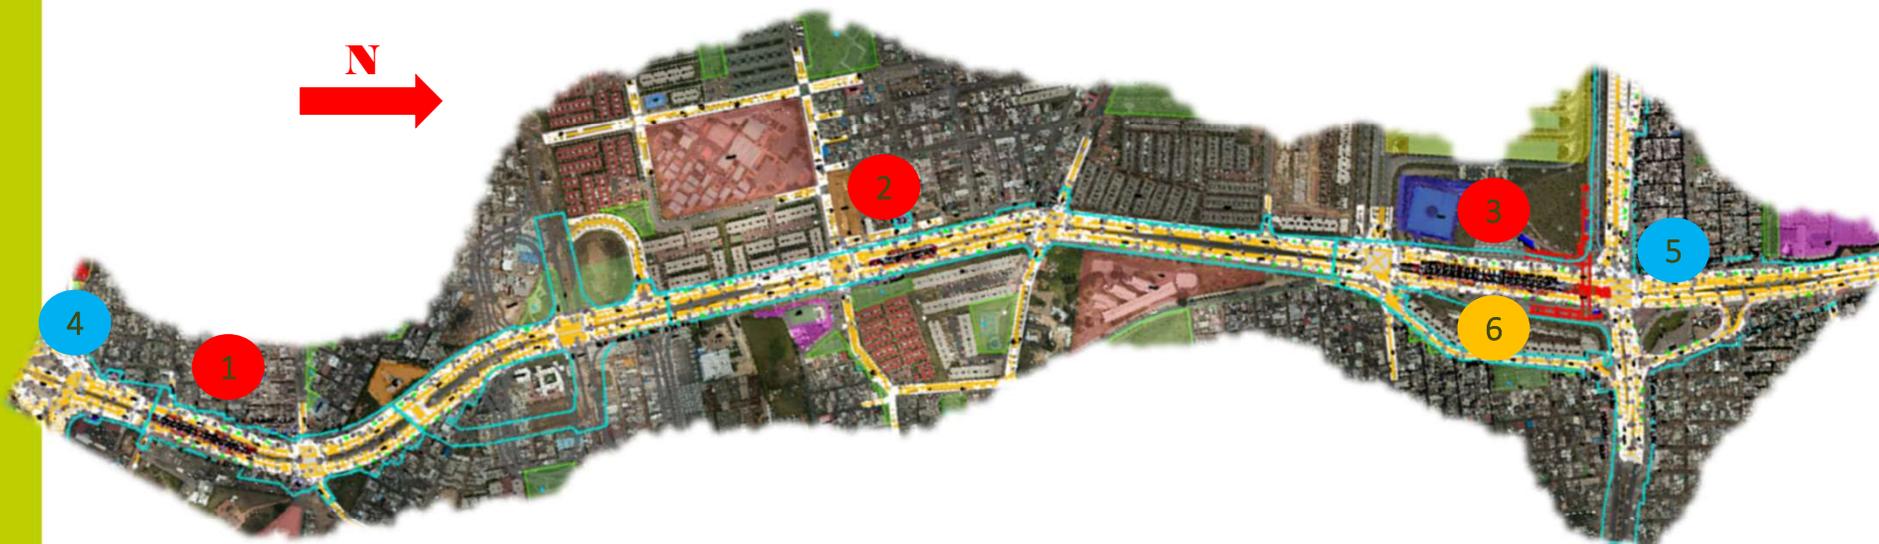

Infraestructura principal

1. Estación Transmilenio – Av. Bosa
2. Estación Transmilenio – Diagonal 49 Sur
3. Estación Transmilenio – Av. Villavicencio
4. Intersección – Av. Bosa

PRECONSTRUCCIÓN 6 MESES

CONSTRUCCIÓN 17 MESES

MANTENIMIENTO 60 MESES

5. Intersección – Av. Villavicencio
6. Puente Peatonal – Portal Américas

4

GRUPO 3

LONGITUD: 1.67 KM

AV. VILLAVICENCIO A AV. MANUEL CEPEDA VARGAS



CONTRATISTA	CONTRATO IDU-1653-2020	OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL COLOMBIA	N/A	\$128.484.094.540
INTERVENTORÍA	IDU-1674-2020	MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.	N/A	\$13.469.113.435



PRECONSTRUCCIÓN 6 MESES

CONSTRUCCIÓN 22 MESES

MANTENIMIENTO 60 MESES

Infraestructura principal

1. Estación Transmilenio – Patio Bonito
2. Estación Transmilenio – Biblioteca El Tintal

5

GRUPO 4


LONGITUD: 0.40 KM

INTERSECCIÓN AV. MANUEL CEPEDA VARGAS

CONTRATISTA	IDU-1670-2020	CONSORCIO MAHFER	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES MHC INGENIERIA S.A.S. FERROVIAL CONSTRUCCIÓN S.A. SUCURSAL COLOMBIA	\$167.023.565.788
INTERVENTORÍA	IDU-1697-2020	CONSORCIO AIRUG	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L. SUCURSAL EN COLOMBIA, AIRIFICIAL INTELIGENCIA STRUCTURES S.A. – SUCURSAL COLOMBIA,	\$15.349.572.479

Infraestructura principal

1. Canal - Américas
2. Puente Intersección – Glorieta elevada
3. Puente Intersección – Ramales Norte - Sur
4. Puente Intersección – Ramales Oriente – Occidente
5. Intersección – A nivel

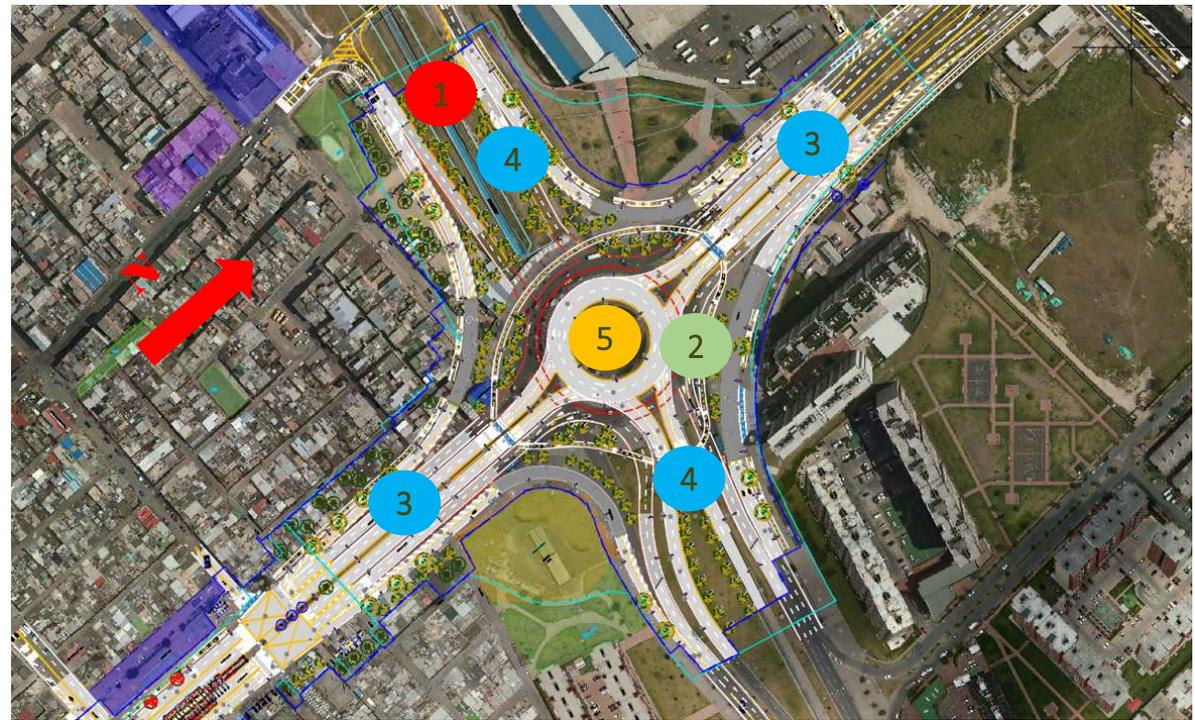

PRECONSTRUCCIÓN 6 MESES

CONSTRUCCIÓN 27 MESES

MANTENIMIENTO 60 MESES

¡GRACIAS!

Síguenos en:



www.idu.gov.c

o



INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO

