CONTRATO IDU 1650 - 2019

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y CICLORRUTAS EN EL CORREDOR AMBIENTAL LOCALIZADO EN EL CANAL CÓRDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 170 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

14vo. COMITÉ IDU

ORDEN DEL DÍA

1. Recomendaciones
2. Verificación de compromisos
3. Objetivos de la Reunión
4. Trazabilidad Contractual
   - Personal Contractual
   - Avance cronograma general de obra
   - Presupuesto general
   - Detalle de presupuesto total
5. Avance de obra
   - Técnico
   - Ambiental
   - SST
   - Social
6. Inquietudes y aportes de la comunidad finalizando cada área.

1 RECOMENDACIONES

Mantener el silencio, respetando el orden de la reunión y la palabra de quien esté socializando.

Diligenciar el formato de asistencia que se pasará en físico por parte del equipo social.

Permitir grabar la reunión como soporte de la actividad; puede solicitarla al finalizar la reunión o a través de los canales de atención a la ciudadanía del contrato.

Las inquietudes, preguntas y aportes de la comunidad serán ordenadas y enumeradas para ser respondidas al final de la reunión.

Las intervenciones de los participantes deben ser concisas para cumplir con la duración de la reunión (2 horas).

Dar cumplimiento a las recomendaciones anteriores permitirán un diálogo ciudadano constante entre el Proyecto, el Comité IDU y la Veeduría Ciudadana Canal Córdoba.

Nota: Es fundamental para el desarrollo de la reunión hacer las intervenciones en el marco del respeto, si se evidencian faltas en este sentido, se podría dar por terminada la sesión.

2 COMPROMISOS ANTERIORES COMITÉ IDU

No.	COMPROMISO	GESTIÓN	ESTADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1.	Desde el área forestal se deberá socializar la nueva compensación solicitada a la SDA para los individuos arbóreos conceptuados para traslado.	Se realizarán las gestiones para saber con certeza la cantidad de individuos arbóreos que no sobrevivieron a esta actividad.	Pendiente	Por determinar
2.	La veeduría, solicita al área forestal contemplar para la solicitud de nueva compensación de los individuos arbóreos conceptuados para traslado, la zona verde ubicada desde la calle 138 y 137 y desde la 135 y 134	Están en proceso de verificación los puntos a lo largo del corredor donde se podrían ubicar los individuos arbóreos para la nueva compensación.	En proceso	Por determinar
3.	Una vez el IDU remita los diseños de sector 1, entre la calle 129B y 131, iniciar gestiones con la veeduría y comunidad del sector 1 para la realización de una reunión extraordinaria (coordinación entre las partes IDU- Interventoría y Contratista).	Pendiente remisión de diseños del sector 1 para programar la reunión extraordinaria con el fin de socializarlos con la comunidad	Pendiente	Por determinar

2 COMPROMISOS 13vo COMITÉ IDU

No.	COMPROMISO	GESTIÓN	ESTADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
4.	Remitir la presentación PDF de la reunión y registro fotográfico a los asistentes que proporcionaron sus datos, comunidad interesada y entidades.	Se remite presentación en PDF y registro fotográfico a las partes mediante correo electrónico	Cerrado	27 de noviembre de 2023
5.	Remitir acta de 13vo. comité IDU avalada por las partes, a los asistentes que proporcionaron sus datos.	Pendiente remisión, puesto que se encuentra en revisión del IDU	Pendiente	Diciembre de 2023
6.	La señora María del Carmen Pinilla Directora de la Veeduría Ciudadana canal Córdoba y Alejandra Porras solicitarán al Consorcio realizar un recorrido para el año entrante (2024), con el fin de verificar las condiciones de los individuos arbóreos	A la espera de la programación por parte de las ciudadanas.	Pendiente	Por determinar

3 OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

- Promover espacios de participación para la comunidad y líderes sociales, mediante este Comité IDU
- Dar a conocer a la comunidad los avances de la etapa de obra para la infraestructura peatonal y ciclorrutas en el corredor ambiental localizado en el Canal Córdoba.
- Atender inquietudes de los asistentes.

4 TRAZABILIDAD CONTRACTUAL

PERSONAL CONTRACTUAL

Equipo Coordinador del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

CARGO	ETAPA DE OBRA
	NOMBRES Y APELLIDOS
Apoyo a la Supervisión de la Subdirección técnica de ejecución del subsistema vial DTC	Ing. Yajaira Judith Combariza (Etapa Constructiva)
Profesionales de Apoyo a la supervisión Ambiental y SST	Ing. Ambiental César Cárdenas Ing. Forestal Alexander Castilla. Ing. Angélica Viviana Celis Rodríguez (SST)
Profesional de Apoyo a la supervisión Fauna	Bióloga Adriana Patiño Núñez
Profesional de Apoyo a la supervisión Social	ADE. Tatiana Castaño

4 TRAZABILIDAD CONTRACTUAL

PERSONAL CONTRACTUAL

Identificación de Interventoría del proyecto

CONTRATO IDU-1652 DE 2019 CONSORCIO SAN RAFAEL	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y CICLORRUTAS EN EL CORREDOR AMBIENTAL LOCALIZADO EN EL CANAL CÓRDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 170 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C
	ETAPA DE OBRA
CARGO	**NOMBRES Y APELLIDOS**
Director de la interventoría	Arq. Wilson Andrade Rojas
Coordinadora de la interventoría	Ing. María Andrea Reyes
Especialista en Presupuestos de la interventoría	Ing. Juan Camilo Varela
Residente Ambiental de la interventoría	Ing. Mauricio Turriago Hoyos
Profesional Forestal	Ing. Leidy Acosta
Bióloga	Ing. Gina Alejandra Romero
Residente SST de la interventoría	Ing. Mariutcy Ramírez Ramírez
Residente Social de la interventoría	T.S. Jenny Andrea Verano Sepúlveda

4 TRAZABILIDAD CONTRACTUAL

PERSONAL CONTRACTUAL

Identificación de Contratista del proyecto

CONTRATO IDU-1650 DE 2019 CONSORCIO CANAL CÓRDOBA	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y CICLORRUTAS EN EL CORREDOR AMBIENTAL LOCALIZADO EN EL CANAL CÓRDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 170 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
	ETAPA DE OBRA
CARGO	**NOMBRES Y APELLIDOS**
Director del contratista	Ing. Flavio Alejandro Araujo
Coordinadora del contratista	Arq. Lina Plazas
Especialista en Presupuestos	Arq. Liliana Leal
Residentes de Obra	Ing. Julio César Bogotá Ing. William Gerardo Barahona Ing. Leonardo Galarcio
Residente Ambiental del contratista	Ing. Néstor Yesid Hernández Piraquive
Profesional Forestal	Ing. Oscar David Ruenes Sánchez
Bióloga	Ing. Angie Paola Gallo Mahecha
Residente SST del contratista	Ing. Angie Katherine Fonseca
Residente Social del contratista	T.S. Luz Adriana Morales

AVANCE CRONOGRAMA GENERAL

PORCENTAJE EJECUTADO – PROGRAMADO

PROGRAMADO

64.11%

EJECUTADO

49.62%

- La demora en la aprobación de los Diseños de Redes Hidrosanitarios generó retrasos en la ejecución de la obra.
- El sector suspendido entre la calle 129B a la calle 131B presenta atrasos, sobre los cuales el contratista no puede intervenir.
- En este momento nos encontramos en la solicitud de una prórroga para extender la duración del contrato.

Datos al 2 de Diciembre 2023

PRESUPUESTO GENERAL

CONTRATO IDU-1650-2019

VALOR OBRAS INCLUYE A.I.U.	**$ 98,716,605,904.00**
Costos Actividades Ambientales	$ 2,661,580,054.00
Costo diálogo ciudadano y comunicación estratégica	$ 1,298,224,455.00
Costo Plan de Manejo de Tráfico	$ 772,991,508.00
Ajuste por cambio de vigencia	$ 10,220,757,237.00
SUBTOTAL OBRAS	**$ 113,670,159,158.00**
Valor a monto agotable para ensayos de laboratorio	$ 21,196,649.00
Costos de compensaciones, evaluación y seguimiento SDA	$ 491,794,219.00
Apéndice de Bioseguridad	$ 31,377,002.00
Amigable Componedor	$ 150,000,000.00
VALOR TOTAL OBRAS	**$ 114,364,527,028.00**
VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 3,777,200,197.00**
VALOR TOTAL PROYECTO	**$ 118,141,727,225.00**

DETALLE DE PRESUPUESTO TOTAL
PAGADO AVANCE DE OBRA

SECTOR	COSTO TOTAL OBRA	VALOR FACTURADO A NOVIEMBRE 2023	% DE AVANCE
SECTOR 1 OCCIDENTAL (Calle 129 - Calle 134)	$ 8,736,738,423	$ 3,125,895,621.00	35.78%
SECTOR 1 ORIENTAL (Calle 129 - Calle 134)	$ 205,094,029	$ 11,373,959.00	5.55%
SECTOR 2 OCCIDENTAL (Calle 134 - Calle 138)	$ 7,056,295,126	$ 1,295,687,541.00	18.36%
SECTOR 2 ORIENTAL (Calle 134 - Calle 138)	$ 525,476,832	$ 4,407,830.00	0.84%
SECTOR 3 OCCIDENTAL (Calle 138 - Calle 145A)	$ 11,046,681,326	$ 4,652,004,760.00	42.11%
SECTOR 3 ORIENTAL (Calle 138 - Calle 145A)	$ 287,482,024	$ 29,593,915.00	10.29%
SECTOR 4 OCCIDENTAL (Calle 145A - Calle 149)	$ 4,759,071,193	$ 3,456,295,473.00	72.63%
SECTOR 4 ORIENTAL (Calle 145A - Calle 149)	$ 6,296,478,921	$ 18,287,391.00	0.29%

(*) Datos según última acta a Noviembre 2023

DETALLE DE PRESUPUESTO TOTAL
PAGADO AVANCE DE OBRA

SECTOR	COSTO TOTAL OBRA	VALOR FACTURADO A NOVIEMBRE 2023	% DE AVANCE
SECTOR 5 OCCIDENTAL (Calle 149- Calle 152)	$ 6,945,044,126	$ 4,896,541,862.00	70.50%
SECTOR 5 ORIENTAL (Calle 149 - Calle 152)	$ 7,201,893,976	$ 265,436,954.00	3.69%
SECTOR 6 OCCIDENTAL (Calle 152 - Calle 153)	$ 4,034,113,904	$ 1,036,547,210.00	25.69%
SECTOR 6 ORIENTAL (Calle 152 - Calle 153)	$ 5,228,374,903	$ 658,765,964.00	12.60%
SECTOR 7 OCCIDENTAL (Calle 153 - Calle 163B)	$ 19,462,700,407	$ 1,365,981,230.00	7.02%
SECTOR 8 OCCIDENTAL (Calle 165B-Calle 163B)	$ 8,079,218,310	$ 3,895,214,625.00	48.21%
SECTOR 8 ORIENTAL (Calle 163B - Calle 168A)	$ 5,099,223,784	$ 3,300,000.00	0.06%
SECTOR 9 OCCIDENTAL (Calle 168A - Calle 170)	$ 2,746,544,229	$ 1,641,958,328.81	59.78%
SECTOR 9 ORIENTAL (Calle 167 - Calle 168A)	$ 1,006,174,387		0.00%
VALOR TOTAL DE OBRAS (COSTO DIRECTO)	$ 76,052,855,017	$ 44,006,299,828.00	57.86%

(*) Datos según última acta Noviembre 2023

4

AVANCE DE OBRA
COMPONENTE TÉCNICO

5 AVANCE COMPONENTE TÉCNICO

SECTOR 1.

Entre calles 129 y 134

1

ESPACIO PÚBLICO

Se realizaron actividades para la construcción del espacio público sobre la calle 129 con carrera 54 costado occidental.

2

CALZADA

Construcción de la rampa en vía en concreto rígido sobre la calle 131 con carrera 54 costado sur.

3

ESPACIO PÚBLICO

Se realizaron actividades para la construcción del espacio público sobre la calle 131 con carrera 54 costado sur.

4

CALZADA

Construcción de la placa en concreto rígido sobre el carril derecho en la calle 134 con carrera 54 costado sur - oriental.

5 AVANCE COMPONENTE TÉCNICO

SECTOR 2.

Entre calles 134 y 138

1

ESPACIO PÚBLICO

Instalación de inmobiliario urbano del espacio público en el andén entre las calles 134 a la 135 con carrera 54.

2

ESPACIO PÚBLICO

Construcción del espacio público estructura de andén entre las calles 135 a la 135 B con carrera 54.

3

CALZADA

Construcción de la placa en concreto rígido sobre el carril izquierdo en la calle 134 con carreras 54 costado sur - oriental.

4

REDES

Se realizó excavación mecánica, construcción de la infraestructura de red pluvial sobre la carrera 54 con calle 135 A.

5 AVANCE COMPONENTE TÉCNICO

SECTOR 3.

Entre calles 138 y 145A

1

CICLORUTA

Instalación de bordillo tipo A-80 y canal monolítico entre las calles 143A a la 145 C con carrera 54, costado occidental

2

ESPACIO PÚBLICO

Construcción del espacio público estructura de andén entre las calles 143A a la 145 C con carrera 54, costado occidental

3

REDES

Se realizó excavación mecánica, construcción de pozo para la infraestructura de red pluvial sobre la carrera 54 con calle 143 A

4

ESPACIO PÚBLICO

Construcción del espacio público sendero peatonal entre las calles 143 A a la 134 con carrera 54, costado occidental

5 AVANCE COMPONENTE TÉCNICO

SECTOR 4.

Entre calles 145A y 149

1

PUENTES

Construcción de apoyo para montaje de puente cl. 146ª norte.

2

ESPACIO PÚBLICO

Construcción de andenes entre cl. 145c y cl. 146.

3

ESTRUCTURAS

Demolición de estructuras para construcción de puentes.

4

CALZADA

Construcción de rampas de acceso sobre la calzada cl. 146

5 AVANCE COMPONENTE TÉCNICO

SECTOR 5.
Entre calles 149 y 152

1

ESPACIO PÚBLICO
Conformación de andenes.

2

ESPACIO PÚBLICO
Conformación de andenes.

3

REDES
Construcción de redes secas.

4

CALZADA
Conformación de vía, construcción de pompeyano, cl. 151

5 AVANCE COMPONENTE TÉCNICO

SECTOR 6.

Entre calles 152 y 153

1

ESPACIO PÚBLICO

Construcción de anden costado occidental entre calles 152 y 153.

2

ESPACIO PÚBLICO

Construcción de anden costado occidental entre calles 152 y 153.

3

ESPACIO PÚBLICO

Construcción de anden costado oriental entre calles 152 y 153.

4

ESPACIO PÚBLICO

Construcción de anden costado oriental entre calles 152 y 153.

5 AVANCE COMPONENTE TÉCNICO

SECTOR 7.
Entre calles 153 y 163B

1

MURO DE CONTENCIÓN
Instalación tablestacado

2

REDES

Retiro de tubería para tablestacado

3

REDES

Empates de acueducto

5 AVANCE COMPONENTE TÉCNICO

SECTOR 8.
Entre calles163B y 168A

1

REDES
Acometida sanitaria

2

ESPACIO PÚBLICO
Conformación del sendero peatonal

3

PUENTES
Armado estribo de puente calle 163

4

CALZADA
Fresado de la vía

5 AVANCE COMPONENTE TÉCNICO

SECTOR 9.
Entre calles 168A y 170

1

CALZADA
Cajeo de vía

2

REDES
Construcción de pozos

3

REDES
Instalación de tubería pluvial

AVANCE COMPONENTE TÉCNICO

INQUIETUDES Y PREGUNTAS DE LA COMUNIDAD

5

AVANCE DE OBRA
COMPONENTE AMBIENTAL

5 AVANCE COMPONENTE AMBIENTAL

Para el desarrollo del proyecto, se debe:

- Implementar las medidas del Manual Ambiental de Obra - MAO encaminadas a evitar, prevenir, controlar, minimizar, mitigar y/o compensar los impactos hacia el ambiente.

- Garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente.

5 AVANCE COMPONENTE AMBIENTAL

Manejo Ambiental de Obra – MAO
Estructura

5 AVANCE COMPONENTE AMBIENTAL

A-CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES

PERMISOS Y/O TRÁMITES	
Permiso de Ocupación de Cauce - POC	Canal Pasadena: Otorgado con Resolución No. 04756 de diciembre del 2021 por un término de 24 meses (06 de diciembre 2023). Finalizado, se encuentra en proceso de cierre. Canal Córdoba: Permiso permanente y temporal otorgado con Resolución No. 00742 de Marzo del 2022 por un término de 24 meses (25 de marzo 2024).
Permiso Tratamiento Silvicultural (tala, traslado y poda del arbolado urbano).	Permiso otorgado con Resolución No. 04186 de noviembre de 2021 por un término de 2 años (09 de noviembre 2023).
Diseño paisajístico y zonas verdes.	Acta de aprobación WR 1163-2021 del 02 de agosto de 2021 del Jardín Botánico de Bogotá - JBB y la Secretaria Distrital de Ambiente – SDA.
Permiso Trabajo Nocturno:	La Alcaldía Local de Suba mediante radicado 20236130264361 del 17/febrero/2023 otorga el permiso hasta el 01 de abril de 2024.
Registro de elementos de publicidad exterior visual.	Valla de Obra Convencional con REGISTRO No. 02148 proferido el 02 de diciembre de 2021.
Obtención PIN Ambiental.	Se estructuró Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición – PG-RCD en cumplimento de las Res 01115 de 2012 y 00932 de 2015. PIN 20881.

5 AVANCE COMPONENTE AMBIENTAL

COMPONENTE B1 – MANEJO AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES Y CENTROS DE ACOPIO

El proyecto cuenta con un campamento fijo principal y campamentos en obra móviles para el uso del personal.

Campamento provisional sector 1 y 5

5 AVANCE COMPONENTE AMBIENTAL

COMPONENTE B2 – MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Consolidado de material adquirido

.

Etapa de Construcción (Mes)	Periodo	Cantidad m3
20	Nov-23	5.243,97
	TOTAL	**44.310,30**

SITIO DE ADQUISICIÓN
INCOMINERIA- SAP AGREGADOS - ICEIN- AGREGADOS DE ORIENTE- ARENA Y AGREGADOS IVONESAS- HOLCIM, CEMEX, RECICLADOS INDUSTRIALES

5 AVANCE COMPONENTE AMBIENTAL

COMPONENTE B2 – MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Seguimiento y Consolidado del Material Reutilizado y Reciclado

PG-RCD PIN: 20881

Resolución 1257 de 2021

Mes,	Comprado reciclado (m3)	Reutilizado proveniente de obra (m3)	Volumen (m3)
Nov-23	363,76	146,87	510,63
Total	**2.635,97**	**1.264,996**	**3.900,966**

De acuerdo a la normativa Distrital, el porcentaje de reutilización mínimo para cumplimiento en la obra es del 25%, y a la fecha el valor corresponde al 25.75%

Demolición Sardinel

Mezcla de fresado con material

5 AVANCE COMPONENTE AMBIENTAL

B3 – MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Tanto la oficina del Consorcio Canal Córdoba M.I. como en los frentes de obra se cuenta con puntos ecológicos para la adecuada disposición y clasificación de los residuos sólidos generados.

Puntos ecológicos de acuerdo al código de colores del MADS – Res 2184/2019

5 AVANCE COMPONENTE AMBIENTAL

B3 – MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Consolidado de RCD generado en obra

Etapa de Construcción (Mes)	Periodo	Cantidad m3
20	Nov-23	5.688,35
	TOTAL	**51.717,956**

TIPO DE RCD GENERADO	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL
Residuos provenientes de excavación, Fresado, lodos y residuos vegetales.	MINERSA, LAMD, R Y R, CEMEX, RECICLADOS INDUSTRIALES, EKO BOJACA SAS, UNICONIC y PATIO DEL IDU

Cargue RCD en el sector 3

5 AVANCE COMPONENTE AMBIENTAL

B-4 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Disminuir la generación de emisiones atmosféricas (gases y material particulado), por fuentes móviles en los frentes de obra objeto del contrato, al igual que la generación de ruido

Limpieza de llantas de volquetas a la salida del frente de obra en el sector 4

Limpieza de vías de acceso y salida de volquetas en el sector 7

Protección de materiales en el sector 4

5 AVANCE COMPONENTE AMBIENTAL

B5 MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA Y SUMIDEROS

Se basa en la formulación de medidas de control para el manejo de aguas superficiales y/o redes de alcantarillado que pueden verse afectadas por la construcción de las obras, igualmente se busca disponer y controlar en forma adecuada el combustible, sustancias químicas y residuos líquidos resultantes de las diferentes actividades de obra.

Limpieza y Mantenimiento de sumideros presentes en los sectores de obra

AVANCE COMPONENTE AMBIENTAL

INQUIETUDES Y PREGUNTAS DE LA COMUNIDAD

5

AVANCE ACTIVIDADES SILVICULTURALES

5

TRATAMIENTOS SILVICULTURALES AUTORIZADOS POR LA SDA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE AMBIENTE

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE Folios 385 Anexos: 0
Proc. # 5252786 Radicado # 2021EE243167 Fecha: 2021-11-09
Tercero: 899999081-6 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
Dep.: SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE
Tipo Doc.: Acto administrativo Clase Doc.: Salida

RESOLUCIÓN No. 04186

"POR LA CUAL SE AUTORIZAN TRATAMIENTOS SILVICULTURALES EN ESPACIO PÚBLICO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

LA SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA FLORA Y FAUNA SILVESTRE DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE AMBIENTE

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE Folios 44 Anexos: 0
Proc. # 5956636 Radicado # 2023EE240906 Fecha: 2023-10-13
Tercero: 899999081-6 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
Dep.: SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE
Tipo Doc.: Acto administrativo Clase Doc.: Salida

RESOLUCIÓN No. 01947

"POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN No. 04186 DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES"

LA SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE AMBIENTE

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE Folios 24 Anexos: 0
Proc. # 6044501 Radicado # 2023EE252038 Fecha: 2023-10-26
Tercero: 899999081-6 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
Dep.: SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE
Tipo Doc.: Acto administrativo Clase Doc.: Salida

RESOLUCIÓN No. 02197

"POR LA CUAL SE AUTORIZAN TRATAMIENTOS SILVICULTURALES EN ESPACIO PÚBLICO Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

LA SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA FLORA Y FAUNA SILVESTRE DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

CANTIDADES DE TRATAMIENTOS SILVICULTURALES AUTORIZADOS

TRATAMIENTO SILVICULTURAL	RESOLUCION 01947	
	CANTIDAD	%
Bloqueo y Traslado	233	12,1
Tala	567	29,35
Podas de Copa, Radiculares y Tratamiento Integral	1039	53,78
Conservación	93	4,81
TOTAL GENERAL	1932	100

TRATAMIENTO SILVICULTURAL	RESOLUCION 02197	
	CANTIDAD	%
Bloqueo y Traslado	2	18,18
Tala arboles	7	63.63
Tala setos	2	18,18
Conservación	0	0
TOTAL GENERAL	11	100

5 ACTIVIDADES SILVICULTURALES EJECUTADAS

Tala y recolección de residuos vegetales noviembre 2023

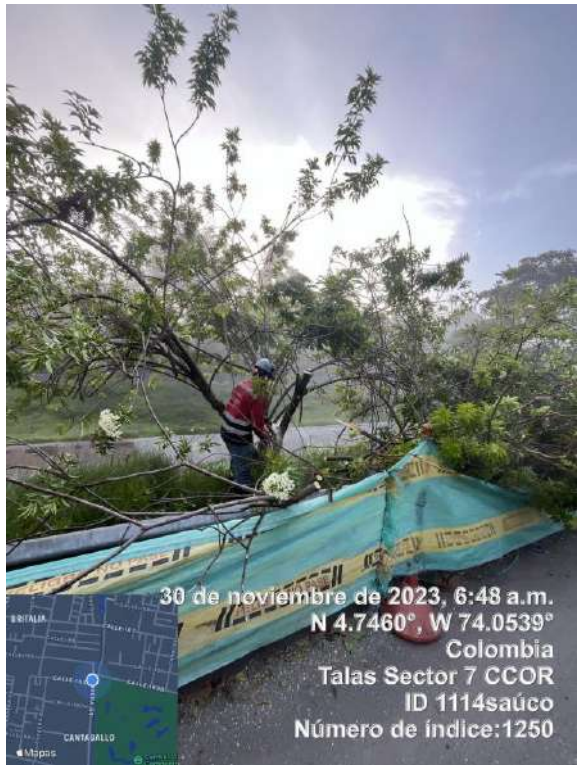

5 ACTIVIDADES SILVICULTURALES EJECUTADAS

Mantenimiento y cerramiento de individuos arbóreos de traslados

5 ACTIVIDADES SILVICULTURALES EJECUTADAS

TRASLADOS DE ÁRBOLES

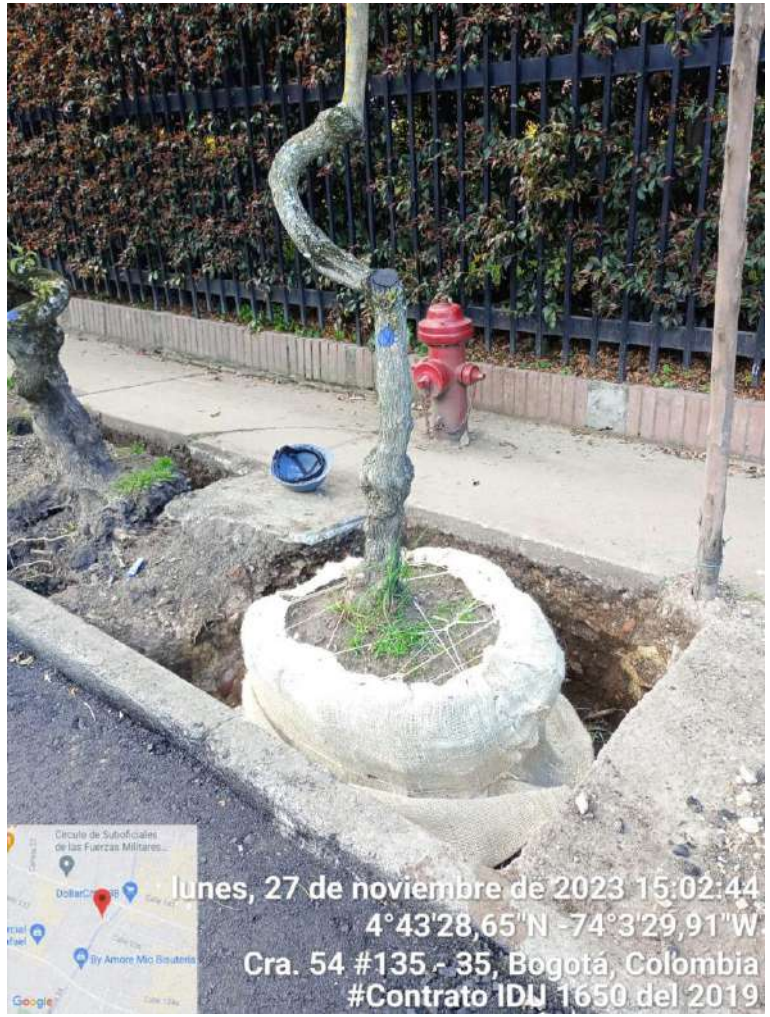

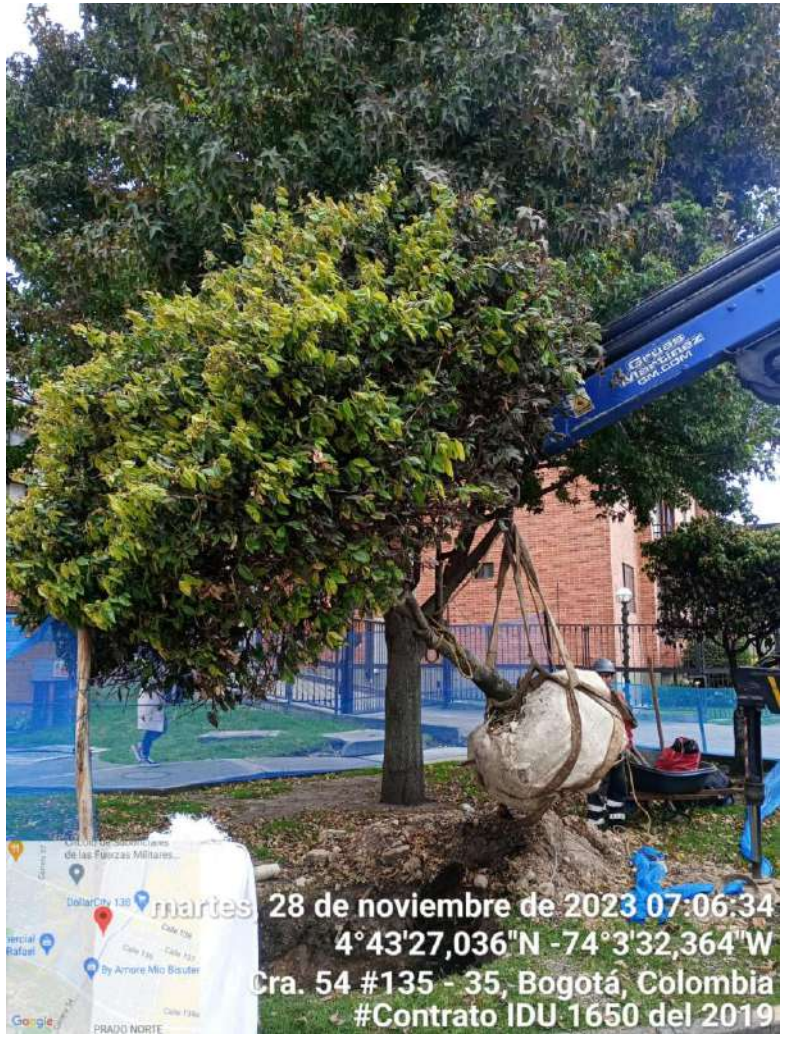

5 ACTIVIDADES SILVICULTURALES EJECUTADAS

ENDOTERAPIA ARBÓREA

5 RESULTADOS Y CONCLUSIONES

RELACIÓN DE TALAS EJECUTADOS

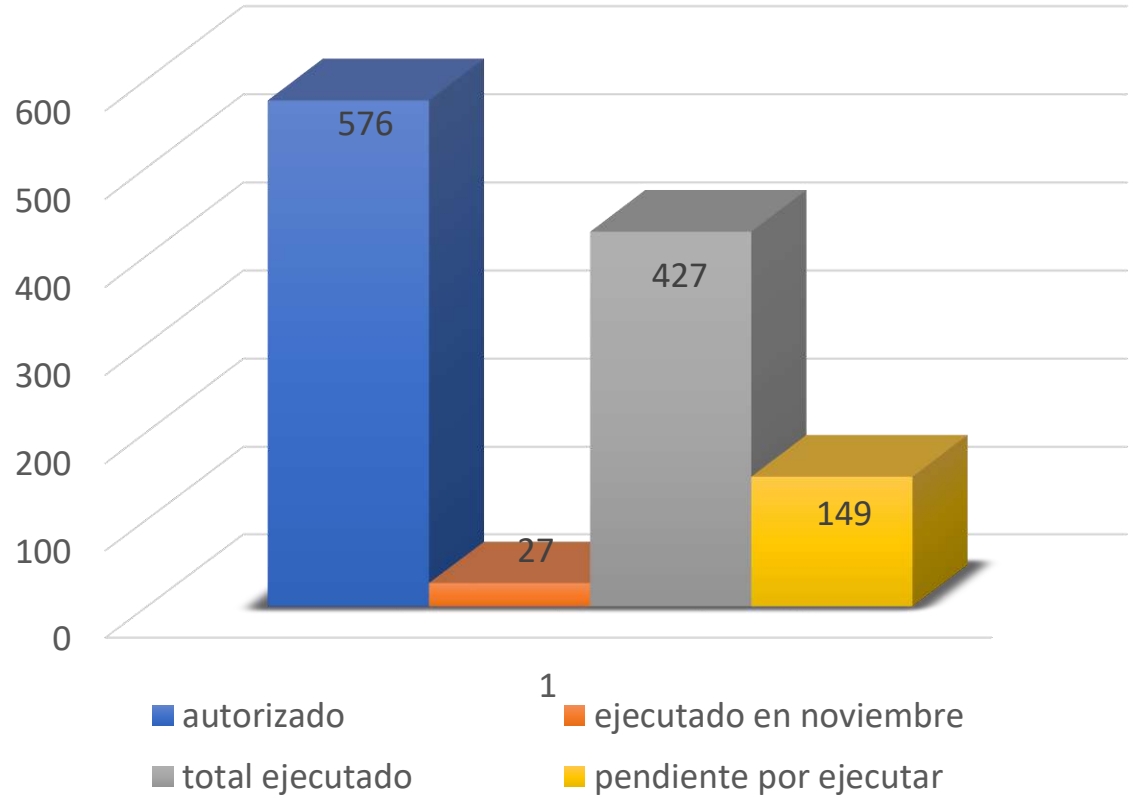

RELACIÓN DE TRASLADOS EJECUTADOS

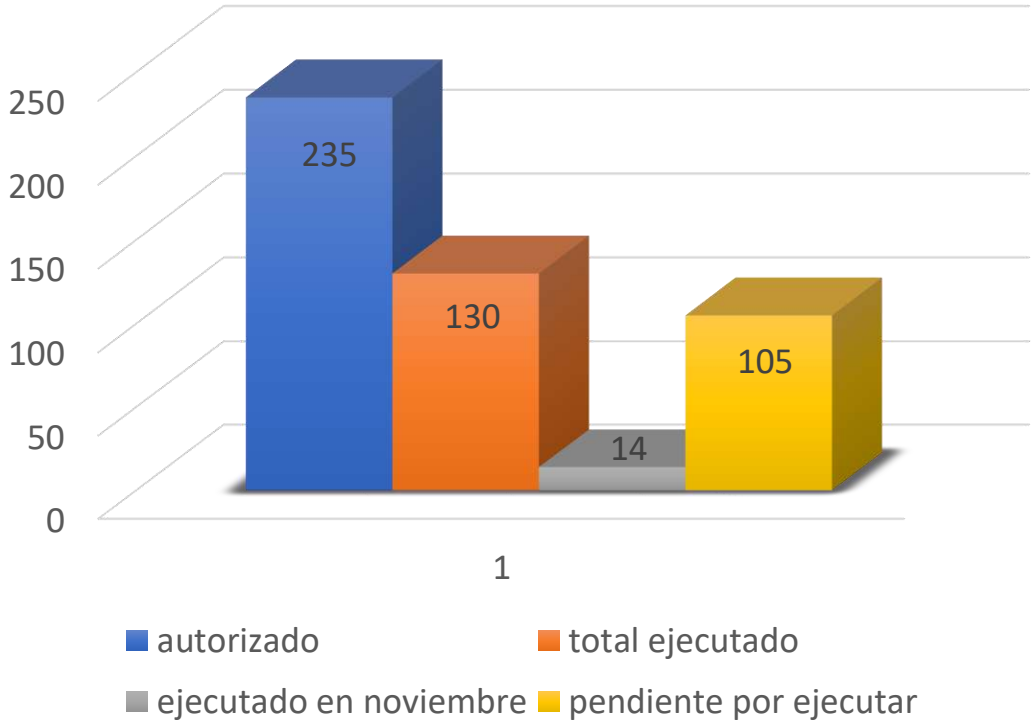

COMPENSACIÓN (110 especies entre las calles 129 y 134)

ACTIVIDADES SILVICULTURALES

INQUIETUDES Y PREGUNTAS DE LA COMUNIDAD

5

AVANCE
MANEJO DE FAUNA SILVESTRE

5 AVANCE COMPONENTE FAUNA

Mitigar y prevenir impactos sobre la fauna

MAO

Verificación	Ahuyentamiento	Rescate
Revisar la zona	Herramientas	Notificar y actuar
• Identificación de posibles madrigueras, nidos, Leks, huellas, heces fecales.	• Rastrillo de suelo • Emisión de sonidos • Mecánico	• Poner a salvo la fauna rescatada (señalizar). • Remitir a la unidad de rehabilitación

Capacitaciones al personal de obra

2

5 AVANCE COMPONENTE FAUNA

Jornada de capacitación al personal de obra

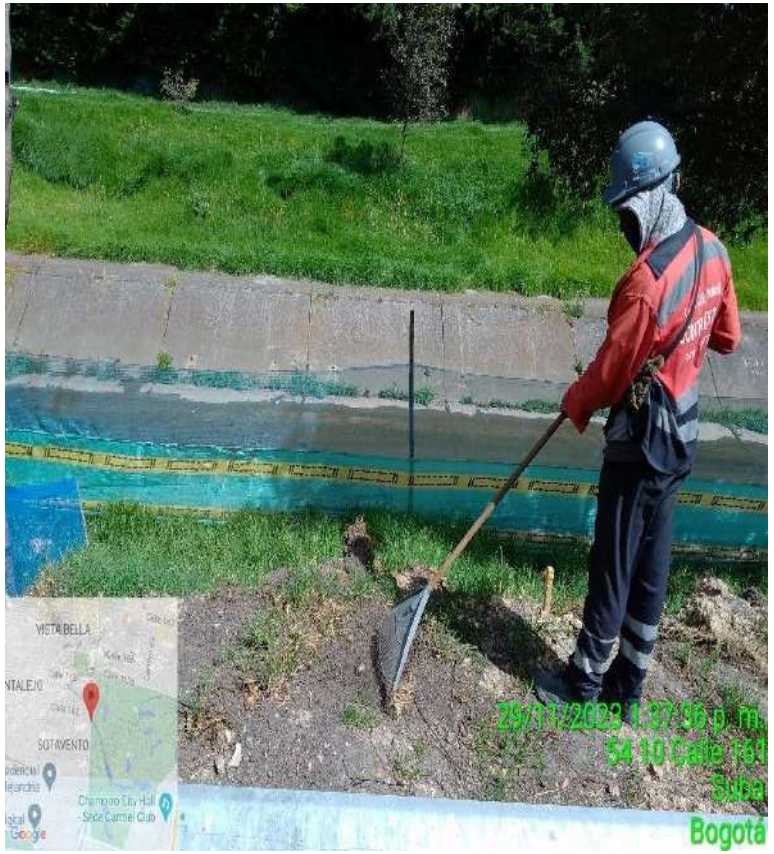

6 jornadas de verificación de zonas verdes

3 Jornadas de ahuyentamiento

5 AVANCE COMPONENTE FAUNA

3 jornadas de censo de nidos

Rescate y entrega de fauna

5 AVANCE COMPONENTE FAUNA

ACTIVIDAD (noviembre 2023)	CANTIDAD
• Liberación de árboles a intervenir	117
• Nidos activos rescatados	1 nido de *Zenaida auriculata* 1 nido de *Turdus fuscater*
• Rescate de individuos	*Atractus crassicaudatus : 1* *Turdus fuscater: 2* prejuveniles *Colibri coruscans: 1* neonato *Zenaida auriculata*: 1

5 AVANCE COMPONENTE FAUNA

Proyecto de cajas nido y perchas artificiales

Ítem	Unidades	Mantenimiento	uso
Cajas nido	30	2	11
Perchas artificiales	15	15	0

AVANCE MANEJO FAUNA SILVESTRE

INQUIETUDES Y PREGUNTAS DE LA COMUNIDAD

5

AVANCE DE OBRA COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST

5 AVANCE SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. Control de ingreso de personal propio y de subcontratistas (Documentación de ingreso, Evaluaciones Médicas Ocupacionales y Cobertura al SGSST).
2. Inducción y capacitación al personal.
3. Entrega y Reposición de Dotación y EPP.
4. Atención de emergencias.
5. Actividades SST: Pausas Activas, charlas e Inspecciones de Seguridad, Señalización de áreas de trabajo, incentivos, preoperacionales de vehículos y maquinarias, actividades con ARL (Reporte de accidentes e incidentes laborales)

5 AVANCE SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

6 Previo a realizar actividades criticas (alto riesgo) gestión de permisos de trabajo, análisis de trabajo seguro –ATS, inspección y/o preoperacional de equipos.

7 Pruebas de detección de alcohol. (82) pruebas efectivas): Todas las pruebas resultaron negativas.

8 Programación del personal a cursos de espacios confinados y alturas.

9 Realización de exámenes médicos ocupacionales al personal para verificar patologías que requieran ingresar a algún programa de vigilancia epidemiológica.

5 ACTIVIDADES SST

5 AVANCE SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para el mes de octubre se presentaron 4 accidentes laborales:

- Total, de días perdidos = 39
- Causa principal = Manejo inadecuado de cargas, uso de elementos no autorizados para el traslado del personal y no uso de elementos de protección personal.
- Se realizó divulgación de todos los accidentes a todo el personal y se implementaron planes de acción para cada uno (Capacitaciones, acompañamiento de la ARL).

TOTAL, PERSONAL	
INGRESOS	47
RETIRO	5
PERSONAL ANTIGUO	374
PERSONAL DIRECTO	136
PERSONAL SUBCONTRATISTA	238

5 ACTIVIDADES SST

ACTIVIDADES SST

INQUIETUDES Y PREGUNTAS DE LA COMUNIDAD

5

AVANCE DE OBRA
COMPONENTE SOCIAL

5 AVANCE COMPONENTE SOCIAL

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

Valla fija

Vallas móviles

ACTIVIDAD		No
Pieza informativa	Convocatoria compensación (plantación) calle 129	48
Volante informativo	Comunicado No. 54. Invitación 14° comité IDU	178
Puntos satélites de información (Actualización permanente)		16

Construcción de infraestructura peatonal y ciclorrutas en el canal Córdoba entre calles 129 y 170

Carrera 54 entre calles 129 y 170

14° Comité IDU – Presencial

Valorización

14 de diciembre de 2023

De 6:00 pm a 7:30 pm

Calle 138 # 52A - 45 / Salón comunal barrio San José del Prado (Spring)

Socializaremos el avance del Contrato IDU 1650 de 2019.

Espacio abierto para el comité IDU, la veeduría ciudadana canal Córdoba y la comunidad que requiera información del proyecto.

Este proyecto beneficiará a más de un millón de personas, logrando que disfruten y se apropien de los espacios ambientales que tiene la ciudad, a través de una movilidad sostenible.

Más información sobre el Contrato IDU 1650 de 2019

IDU en línea: www.idu.gov.co

Línea gratuita: 01800 910312- 341 2254- 338 7555

atencionciudadana@idu.gov.co

Redes sociales:

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

DESARROLLO URBANO

BOGOTÁ

5 AVANCE COMPONENTE SOCIAL

SERVICIO A LA CIUDADANÍA

idu Gestión de PQRSD – Sistemas IDU BACHUE Odoo	
Total, PQRSD recepcionadas	Cerradas
162	158
Recorridos urbanos: 81	
Vendedores informales	Vallas Móviles
Habitantes de calle	Atención a la ciudadanía (Recepción de PQRSD)

Correo electrónico
puntoidu1650@ccor.com.co

Líneas de Atención al Ciudadano
Celular No. 3222344214 - Teléfono No. 2853165
Actualización contestador automático - horario de atención en etapa de obra.

Atención a veedurías ciudadanas
Veeduría Ciudadana Canal Córdoba y las que se presenten (LEY 850 DE 2003)
Se continúan las gestiones referidas a los compromisos establecidos en los espacios de diálogo (Etapa de Estudios y Diseños e Inicio de Obra)

Cumplimiento a compromiso etapa de E&D - Compensación

Calle 129 – costado oriental del Canal Córdoba

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA IDU

PBX: 3387555
Línea 018000910312
Línea 195 – Guía de trámites y servicios

Chat IDU
Formulario Web
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones S.D.Q.S.
atnciudadano@idu.gov.co

Gestión social
Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía
Dirección Técnica de Predios

Sede principal IDU: Calle 22 # 6 - 27

Hola, soy
Fulvia
¿Cómo le puedo ayudar?

...

Chatbot IDU

CONFORMACIÓN DE VEEDURÍAS CIUDADANAS

La Veeduría Ciudadana es un mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública…, así como de las entidades públicas o privadas…,que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público. (Ley 850 de 2003)

Requisitos	Funciones
Acta de constitución (Fotocopia).	• Ejercer vigilancia sobre la gestión pública respecto de las obras concebidas, dentro del acuerdo de valorización 724 de 2018.
Nombre de los integrantes	
Documento de identidad	
Objeto de la veeduría	• Transmitir, comunicar, socializar y difundir con el resto de la comunidad interesada, para ello la Veeduría Distrital cuentan con las herramientas, técnicas y metodologías, que serán socializadas.
Nivel territorial	
Duración	
Lugar residencia	
Radicación documentos.	
Personería de Bogotá y/o Personerías Locales	• Verificar si se han dado respuestas a los compromisos concertados con las entidades, así como sus propios compromisos con la ciudadanía, en términos de efectividad e incidencia.
Cámara de comercio	
Acompañamiento de la Veeduría Distrital	

5 AVANCE COMPONENTE SOCIAL

DIÁLOGO CIUDADANO

REUNIONES PARTICIPATIVAS EN OBRA

N/A Dichas convocatorias fueron realizadas por los solicitantes de las reuniones.*

TIPO DE REUNIÓN	FECHA	LUGAR	CONVOCADOS	ASISTENTES	TEMA
Reunión extraordinaria No. 18	22/11/2023	Copropiedad Vintage PH	N/A	3	Resolver las inquietudes de la copropiedad frente a las actividades de obra.
13vo. Comité IDU	24/11/2023	Salón Social Conjunto Residencial Mazurén II sector – Agrupación 5	175	12	Socialización de avance de obra

13vo Comité IDU

Reunión extraordinaria No. 18

Inscritos al Comité IDU: 56

- Tramo 1: 31
- Tramo 2: 7
- Tramo 3: 18

5 AVANCE COMPONENTE SOCIAL

ACOMPAÑAMIENTO A ACTIVIDADES TÉCNICAS

Actividad	Descripción
Actas de vecindad	Total, actas a predios: **1.858 = 99.9%** Total, actas a parques y zonas verdes: **21 = 100%**
Suspensión de acceso a garajes	Suspensión de acceso a garajes sector 2 occidental (CR Hacienda de la Colina)
	Suspensión de acceso a garajes sector 3 occidental (CR Casas de Amsterdam)
Compromisos	A la fecha existen 14 compromisos los cuales se encuentran cerrados.
Otras actividades	Acompañamiento Izaje del Puente peatonal calle 146A

5 AVANCE COMPONENTE SOCIAL

GOBERNANZA PARA LA MOVILIDAD

GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL

Monitoreo actividades económicas informales

Habitabilidad en calle – Secretaría Distrital de Integración Social

*Desmonte de cambuche en la calle 130 costado oriental del canal Córdoba

GESTIÓN Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL - MONC

GENERACIÓN DE EMPLEO DEL CONTRATO	CANTIDAD	
Mano de Obra Calificada – MOC	53	
Total, Mano de Obra No Calificada – MONC	95	
Población Vulnerable	5	
% CUMPLIMIENTO		
Mano de Obra No Calificada **de las Localidades**	33	33 %
Población Vulnerable	5	5%

Recepción permanente de hojas de vida a través de los canales de atención del Punto IDU

5 AVANCE COMPONENTE SOCIAL

CULTURA CIUDADANA

Prevención de accidentalidad – Previniendo ando

Haga clic en la foto para ver el video

o
haga clic en el enlace:
https://drive.google.com/file/d/1UnDchssAHuff2I5Syg97n1s1polSi_Cv/view?usp=sharing

AVANCE COMPONENTE SOCIAL

INQUIETUDES Y PREGUNTAS DE LA COMUNIDAD

RECOMENDACIONES GENERALES

Participar activamente de las actividades sociales que se realizarán durante la etapa constructiva del contrato.

Por seguridad, suministre información únicamente a personas identificadas con el chaleco del IDU y que porten el carné de la firma Contratista o la Interventoría usted puede verificar esta información a través de las Líneas de Atención.

Por seguridad, evite caer en engaños de entidades o personas que requieran dinero en efectivo porque en la ejecución del contrato no se requiere ningún suministro de este tipo. Hay que recordar que ningún trabajador está autorizado para realizar cobros por ninguna actividad.

Recibir información que se lleve predio a predio y solicitar información sobre el contrato únicamente a través de los canales de atención al ciudadano (Punto IDU – IDU).

Propender por mantener una adecuada cultura ciudadana en la etapa de obra, prevención de accidentes viales, cumplimiento a la señalización instalada en el AID y un diálogo asertivo con el contratista.

No dar crédito al personal del contrato. La firma contratista, interventoría e IDU, no se hacen responsables por situaciones derivadas de ello.

Política Antisoborno

Adoptamos la Política Antisoborno la cual prohíbe toda práctica de ofrecer o recibir una ventaja financiera o no, como incentivo para que un colaborador del IDU haga o deje de cumplir con sus actividades, funciones u obligaciones.

Denuncia, a través del correo **denuncie.soborno@idu.gov.co** o en los buzones físicos antisobornos que se encuentran en las sedes de la entidad.

¡Avanzamos, para garantizar una gestión transparente y eficiente!

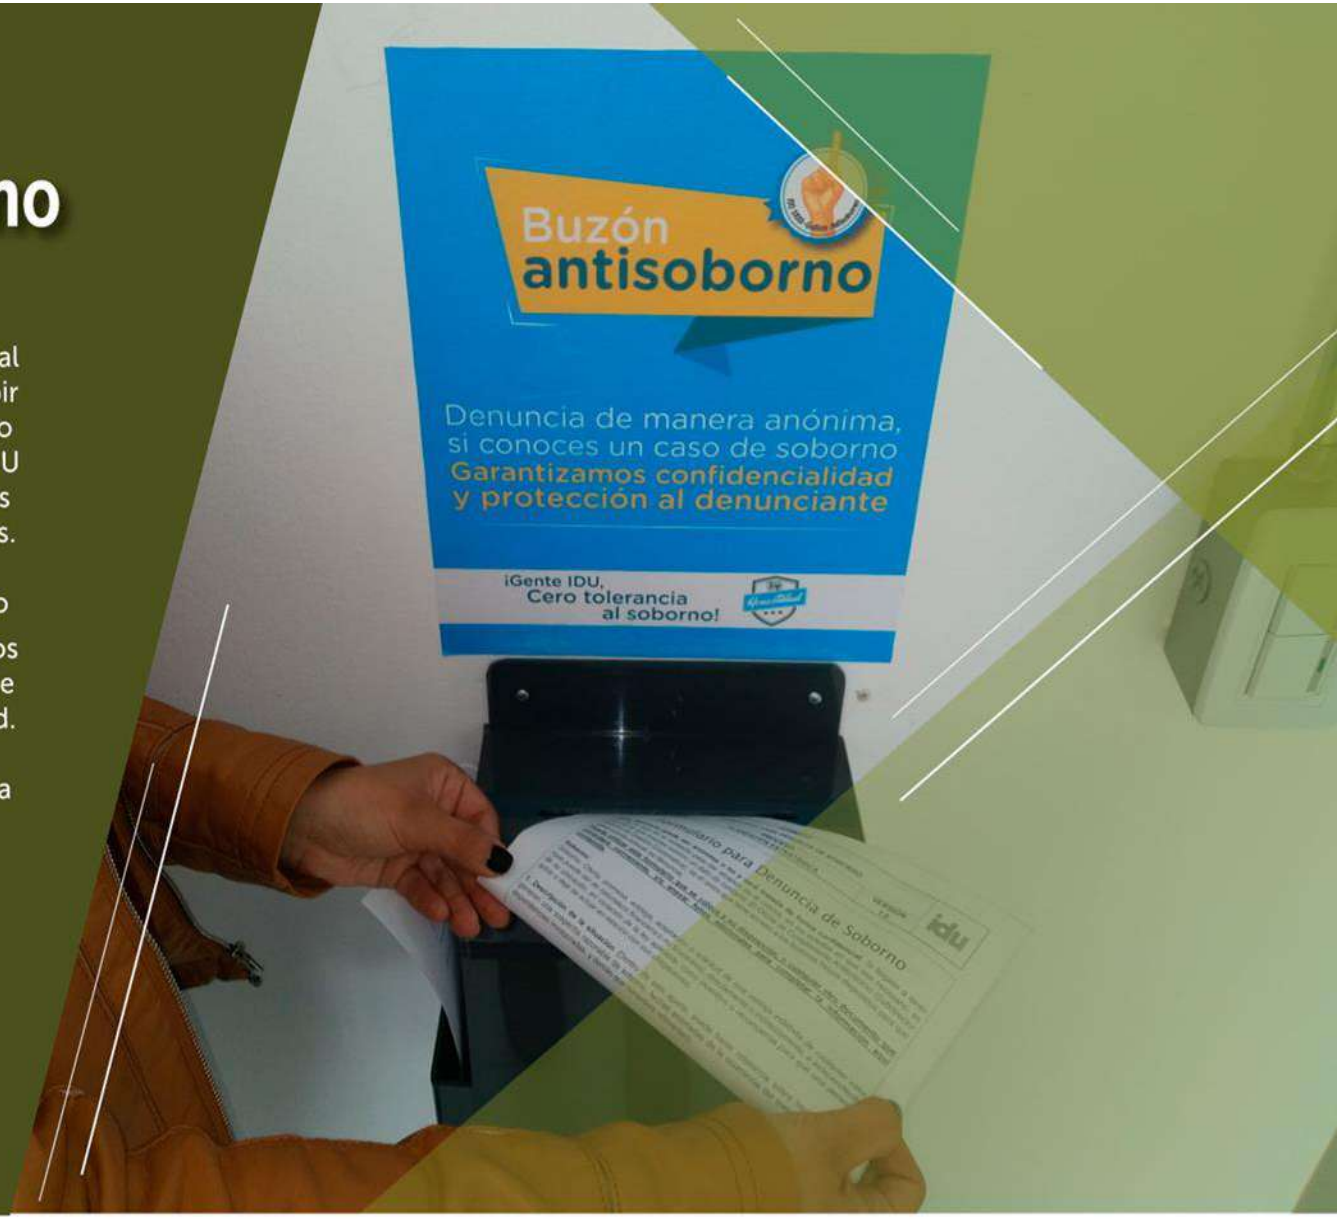

BOGOTÁ
Instituto de
Desarrollo Urbano

¡GRACIAS!

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO

BOGOTÁ

SI DESEA CONOCER MÁS DE ESTE Y OTROS PROYECTOS EJECUTADOS EN BOGOTÁ

Escanear para conocer más información sobre los proyectos IDU.
