



ATENEA

AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN
SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

PRIMER COMITÉ TÉCNICO
Convenio Interadministrativo
194-2025 IDT-ATENEA
(22 ago – 23 oct)

Talento Capital Formación
27 de octubre de 2025



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



ATENEA
AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN
SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA



Agenda del Comité





1. Verificación del Quorum
2. Avance en la gestión del proyecto
 - 2.1. Gestión del plan del proyecto (cronograma)
 - 2.2. Gestión técnica (Avances componente técnico)
 - 2.3. Gestión financiera (aporte recursos de las partes)
3. Propositiones y varios
 - Modificación Contractual



2. 1. Gestión Plan del Proyecto (cronograma)

CRONOGRAMA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 194 de 2025*														AVANCE ESPERADO	AVANCE REAL	
ACTIVIDAD		RESPONSABLE	sep-25				oct-25				nov-25					
SEMANA			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3			4
Hito 1: Desembolso de recursos	Transferencia de recursos a Atenea	IDT													100%	80%
	Traslado fondo cuenta														100%	0%
Hito 2: Etapa precontractual- Selección operador de formación	Elaboración de documento especificaciones técnica, estudio de mercado, estudios previos.	Atenea													100%	0%
	Aprobación comité de contratación	Atenea													100%	0%
	Solicitud Creación línea PAA	Atenea													100%	0%
	Solicitud CDP	Atenea													100%	0%
	Apertura de convocatoria Banco de Oferentes	Atenea													100%	0%
	Revisión y respuesta a observaciones	Atenea													50%	0%
	Evaluación de propuestas	Atenea													0%	0%
	Adjudicación de operadores y publicación	Atenea													0%	0%
Firma y legalización de contratos	Atenea													0%	0%	
Hito 3: Convocatoria, y selección de participantes	Publicación de Convocatoria	IDT													0%	0%
	Cierre y selección de beneficiarios elegibles	IDT													0%	0%
	Construcción y aprobación lineamiento operativo	Atenea													33%	0%

2. 2. Gestión Técnica (Inscripción y formalización)

ESTADO DEL PROCESO	NÚMERO DE PERSONAS	DESCRIPCIÓN
 Aprobados y matriculados	24	Superaron la prueba de suficiencia del British Council (nivel A2-B2) y actualmente cursan el programa.
 Reprobaron prueba de ingreso	12	Presentaron la prueba de suficiencia, pero no alcanzaron el nivel mínimo requerido (A2).
 Contactados que no presentaron prueba	50	Fueron contactados por el British Council, pero no presentaron la prueba.
 Total base del IDT	86	Base remitida por el IDT para ocupar los 50 cupos aportados por ATENEA.

2. 2. Gestión Técnica (avance formación)

Formación Inglés EwB – Semana 6

Estado	IDT
EN FORMACIÓN	19
EN RIESGO DE DESERCIÓN	2
MATRICULADO INACTIVO	3
Total general	24

Acciones de acompañamiento para las **2** personas en **riesgo de deserción**

Desde la mesa de ayuda:

- **Campañas personalizadas de llamadas 1 a 1:**

Llamadas individuales de acompañamiento para motivar a los estudiantes a retomar sus clases y nivelarse académicamente.

Envío de correos masivos

Mensajes con las instrucciones necesarias para recuperar las clases.

Acciones para las 3 personas **matriculados inactivos**


Desde el inicio de clases hasta el **4 de octubre** se implementó una estrategia de acompañamiento que incluyó llamadas personalizadas y el envío de cuatro campañas de correo masivo. Estas llamadas buscaron motivar a los estudiantes inactivos a retomar sus clases, mientras que los correos reforzaron la importancia de la asistencia y advirtieron sobre el riesgo de perder el beneficio por inactividad.

Estado diligenciamiento H.V. SICORE

Convenio	RESULTADO VALIDACION HV	Cuenta de NUMERO_DOCUMENTO
IDT	HV Diligenciada	15
	HV iniciada	6
	HV Pendiente	3
Total IDT		24

2.3. Gestión Financiera

Ejecución financiera IDT-ATENEA

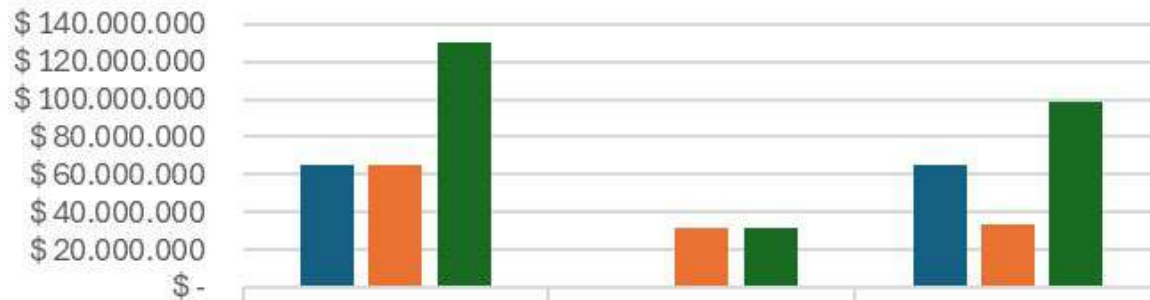

	Apropriación	Comprometido	Total por ejecutar
■ Aporte IDT (Recursos)	\$65.000.000	\$-	\$65.000.000
■ Aporte ATENEA (en especie - British Council)	\$65.217.400	\$31.304.352	\$33.913.048
■ TOTAL	\$130.217.400	\$31.304.352	\$98.913.048











■ Aporte IDT (Recursos) ■ Aporte ATENEA (en especie - British Council) ■ TOTAL

Nota 1. A corte del 27 de octubre no se ve reflejado aún el desembolso del IDT. Se encuentra en trámite.

Nota 2. Los compromisos relacionados de aportes ATENEA, corresponden a los cupos de inglés con el British Council. Total 24.

PROPOSICIONES Y VARIOS

3. Modificación Contractual - Convenio 194-2025

ESCENARIO	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	IMPLICACIONES
A	Mantener el convenio sin modificaciones formales	No se modifica el convenio. Se deja constancia de que se dispusieron los 50 cupos como contrapartida, pero solo 24 fueron ocupados. Se argumenta que la no ocupación obedeció a causas externas (base IDT y pruebas BC).	<p> No requiere modificación.</p> <p> Debe dejarse constancia en acta de Comité y de liquidación.</p> <p> Posibles reparos de entes control por cumplimiento parcial del valor (\$31.3 M ejecutado / \$65.2 M comprometido).</p>
B	Modificar para ajustar la meta y el valor de la contrapartida	Se formaliza el resultado real alcanzado: ajustar de 50 a 24 cupos ejecutados, con valor total de \$31.304.352 (24 x \$1.304.348). Se modifica el convenio mediante otrosí.	<p> Requiere modificación aprobado por Comité Técnico.</p> <p> Deja trazabilidad clara de la ejecución real.</p> <p> Reduce el valor de la contrapartida pactada en el convenio.</p>
C	Modificar para redefinir el aporte en especie (licencias Academia ATENEA)	Se mantienen los 24 cupos BC ejecutados (valor \$31.304.352) y se incorporan licencias de Academia ATENEA para las 12 personas que no cumplieron con el nivel de A2 y 14 beneficiarios que indique el IDT para completar los 50 cupos.	<p> Requiere modificación aprobado por Comité Técnico.</p> <p> Implica ajustar el tipo de formación en segunda lengua, cronograma y valor de contrapartida de ATENEA.</p>
D	Brindar los cupos para cumplir en 2026	No se modifica el convenio. Se deja constancia de que se dispusieron los 50 cupos y que se complementan con oferta 2026.	<p> No requiere modificación.</p> <p> Se define en comité técnico y se soporta en acta.</p>

Aporte inicial en especie

Aporte de ATENEA: La suma de SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$65.217.400) en especie, representados en aproximadamente 50 cupos que se ejecutarán a través del convenio suscrito con el British Council

Modificación en especie

Aporte de ATENEA: La suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS (\$34.424.638.) en especie, representados en 24 cupos que se ejecutarán a través del convenio suscrito con el British Council Y 26 licencias de inglés a través de la plataforma de Academia ATENEA

Aportes IDT: \$ 65.000.000

Aportes ATENEA: \$65.217.400 - Especie

Aporte Total inicial: \$130,217,400

Valor cupo ingles \$1.304.348

Aportes IDT: \$ 65.000.000

Aportes ATENEA: \$34.424.638 – Especie

Aporte Total: \$99.424.638

Valor cupo ingles $\$1.304.348 \times 24 = 31.304,352$

Valor licencia AA $\$120.011 \times 26 = 3.120.286$

Modificación de cláusulas contractuales

CLASULA TERCERA: CONDICIONES TÉCNICAS – Formación en segunda lengua inglés y cronograma

CLASULA QUINTA: VALOR DEL CONVENIO

CLASULA SEXTA: APORTES DEL CONVENIO – Aporte de ATENEA

GRACIAS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



ATENEA
AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN
SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

